



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII



PLAN INVESTIȚIONAL

pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport pentru perioada 2020 - 2030



Foto MTI: Autostrada A3, Sectorul Gilău - Nădășelu

Document confidențial nedestinat distribuirii

Acest document este o comunicare strict confidențială către destinatar și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul prealabil scris al Ministerului Transportului și Infrastructurii. Dacă nu sunteți destinatarul acestui document, nu puteți divulga sau utiliza informațiile din această documentație în niciun fel.

CONFIDENTIAL

Varianta DRAFT

- Octombrie 2021-

Cuprins

Glosar de termeni	7
PREAMBUL	11
CAPITOLUL 1 – DESCRIEREA SITUAȚIEI DOCUMENTELOR STRATEGICE RELEVANTE DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA ȘI NOILE PROVOCĂRI ÎN PERIOADA 2020-2030	14
CAPITOL 2 – ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A MASTER PLANULUI GENERAL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI	24
2.1. MODURI DE TRANSPORT: RUTIER	25
Obiectivele de conectivitate și mobilitate a populației și a mărfurilor	25
Obiectivele strategice	27
Obiectivele generale de conectivitate rutieră	28
Coridoarele naționale de conectivitate rutieră	30
Coridoarele de conectivitate rutieră	31
Inter-coridoarele de conectivitate rutieră	36
Coridoarele transfrontaliere	40
Definirea rețelei rutiere din România	44
Sectorul rutier – rețeaua primară	45
Sectorul rutier – rețeaua secundară	50
Lista proiectelor rutiere	52
Variantele de ocolire	58
Ierarhizarea și prioritizarea proiectelor rutiere	62
Metodologia de prioritizare a proiectelor de pe rețeaua primară	62
Metodologia de prioritizare a proiectelor de pe rețeaua secundară	69
Propuneri cu caracter aplicativ	74
Măsuri privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH	85
Standarde	85
2.2. MODURI DE TRANSPORT: FERVIAR	88
Obiectivele strategice de conectivitate feroviară	88
Coridoarele naționale de conectivitate feroviară	90
Coridoarele de conectivitate feroviară	91
Inter-coridoarele de conectivitate feroviară	95

Coridoarele transfrontaliere	96
Definirea rețelei feroviare din România	99
Sectorul feroviar – rețeaua primară	100
Sectorul feroviar – rețeaua secundară	102
Stabilirea listei de proiecte	103
Lista proiectelor feroviare	117
Prioritizarea proiectelor aflate pe rețeaua feroviară primară	119
Proiecte solicitate pentru finanțare din PNRR	125
Propuneri cu caracter aplicativ	128
Trenul metropolitan	131
Căi ferate cu potențial turistic	166
Achiziția de material rulant	166
Măsurile privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH	168
2.3. MODURI DE TRANSPORT: METROUL	169
Rețeaua de metrou din București	170
Rețeaua de metrou din Cluj-Napoca	176
Proiecte solicitate pentru finanțare din PNRR	177
Măsurile privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH	178
2.4. MODURI DE TRANSPORT: NAVAL	179
Situția curentă	179
Dezvoltarea transportului pe apă	185
Considerații de guvernare sectorială	195
Măsurile privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH	195
2.5. MODURI DE TRANSPORT: AERIAN	197
Descrierea situației curente	197
Dezvoltarea transportului aerian	200
Măsurile privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH	205
2.6. MOD DE TRANSPORT: INTERMODAL	206
CAPITOL 3 – STRATEGIA FINANȚĂRII	208

Ținând cont de impactul pozitiv al mecanismului de supracontractare în perioada precedentă de programare se impune ca această abordare să fie continuată și în perioada acoperită de prezentul Plan investițional.	210
Necesarul de finanțare și alocările orientative	210
Finanțarea prin PNRR	212
Finanțarea prin POT	215
Axa 1. Îmbunătățirea conectivității primare rutiere	215
Axa 2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere	218
Axa 3. Creșterea siguranței rutiere	221
Axa 4. Creșterea eficienței căilor ferate din România	224
Axa 5. Creșterea atractivității transportului feroviar de călători	227
Axa 6. Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane	229
Axa 7. Dezvoltarea transportului naval și multimodal	229
Axa 8. Dezvoltarea transportului aerian	230
Finanțarea prin CEF	230
CAPITOL 4 – MĂSURI DE CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ	232

Glosar de termeni

A	Autostradă
ACB	Analiza Cost - Beneficiu
ACE	Analiza Cost - Eficacitate
AFDJ	Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați
AIHCB	Aeroport Internațional Henri Coandă
AFM	Administrația Fondului pentru Mediu
AIP	Aeronautical Information Publication / Publicația de Informare Aeronautică
AMC	Analiza Multicriterială
ARF	Autoritatea pentru Reformă Feroviară
BEI	Banca Europeană de Investiții
BERD	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
BIMP	Biroul Implementare Master Plan
CC	Coridorul de conectivitate
CCF	Coridor de Conectivitate Feroviar
CCT	Coridor de Conectivitate Transfrontalier
CDMN	Canalul Dunăre - Marea Neagră
CE/COM	Comisia Europeană
CEE-ONU	Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa
CEF	Mecanismul pentru Interconectarea Europei
CESTRIN	Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică
CF	Cale ferată
CFM / MFF	Cadrul Financiar Multianual
CFR	Căile Ferate Române
CN APDM Galați	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați
CN APM SA	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime
CNAIR	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
CNCFR	Compania Națională CFR
CNG	Gaz Natural Comprimat
CO2	Dioxid de carbon
CPAMN	Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari
CPR	Regulamentul privind Dispozițiile Comune
CTF	Coridor Feroviar Transfrontalier
DMU	Diesel multiple unit
DX	Drum expres

EIA	Environmental impact assessment / Evaluarea impactului asupra mediului
EIAH	Centrul European de Consultanță pentru Investiții
EMU	Electric Multiple Unit
ENR	Etiajul Navigabil și de Regularizare
ERTMS	Sistemul European de Management al Traficului Feroviar
ET	Drum eurotrans
EUR	Euro
FC	Fondul de Coeziune
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FSC	Fond Social pentru Climă
FSE	Fondul Social European
FSUE	Fondul de solidaritate al Uniunii Europene
GPL	Gaz petrolier lichefiat
HSR	High Speed Rail / Tren de Mare Viteză
H-EMU	Hydrogen Electric Multiple Unit
HMI	Human - Machine Interface
I3M	Inițiativa Celor 3 Mări
IAPPD Ruse	Executive Agency Exploration and Maintenance of the Danube River / Agenția Executivă Exploatarea și întreținerea fluviului Dunărea
ICE	InterCityExpress
IFI	Instituții Financiare Internaționale
INS	Institutul Național de Statistică
iRAP	International Road Assessment Programme
ISPA	Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
ITS	Sistem Inteligent de Transport
JBIC/ JICA	Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională / Agenția Japoneză de Cooperare Internațională
JTF	Fondul pentru o Tranziție Justă
JTM	Mecanismului pentru o Tranziție Justă
KPI	Indicator de Performanță
MaPN	Ministerul Apărării Naționale
MDLPA	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
METROREX	Societatea Comercială de Transport cu Metroul București
MF	Ministerul Finanțelor
MFE	Ministerul Fondurilor Europene
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
MIL	Milioane

MLD	Miliarde
MMAP	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
MNT	Modelul Național de Transport
MPGT	Master Planul General de Transport al României
MTI	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
MZA	Media zilnică anuală
NGEU	Next Generation EU
OCF	Obiectiv de Conectivitate Feroviară
P&R	Park & Ride
PaE	Parteneriatul Estic
PG	Plan de Guvernare
PHARE	Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy
PI	Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030
PIB	Produsul Intern Brut
PNRR / RRF	Planul Național de Redresare și Reziliență / Recovery and Resilience Facility
POT	Program Operațional Transport 2021 - 2027
POIM	Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
PPP	Parteneriat Public Privat
PSI	Prevenirea și stingerea incendiilor
PTF	Punct transfrontalier
RBC	Raportul Beneficiu Cost
RE-IR	Ramă electrică - Inter Regio
RE-R	Ramă electrică - Regio
RER	Réseau Express Régional
RIRE	Rata Internă de Rentabilitate Economică
RO - LA	Transport combinat Rollenden - Landstrassen
RO - RO	Transport combinat roll-on/roll-off
S-Bahn	S-Train - Stadtschnellbahn - City Rapid Railway
SRE	Energie din surse regenerabile
SUERD	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
TCI	Traffic Congestion Information
TEN-T	Rețea Trans-Europeană de Transport
TEN-T Comprehensive	Rețea Trans-Europeană de Transport Globală / Comprehensive
TEN-T Core	Rețea Trans-Europeană de Transport Centrală / Core
TEU	Unitate echivalentă de douăzeci de picioare

TGV	Train à Grande Vitesse / Tren de Mare Viteză
TR	Drum transregio
TRACECA	Coridorul de Transport Caucaz - Asia
UAT	Unitate administrativ teritorială
UE	Uniunea Europeană
UIC	International Union of Railways
UITP	International Association of Public Transport
VAN	Valoarea Actualizată Netă
VNB	Venitul Național Brut
VO	Variantă ocolitoare

CONFIDENTIAL

PREAMBUL

În contextul politicii europene în domeniul transporturilor, care prevede realizarea unei rețele europene integrate, orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare 2030 (TEN-T Core) și a unei rețele globale ce va susține rețeaua centrală, cu termen de finalizare 2050 (TEN-T Comprehensive), România trebuie să crească eficiența investițiilor în infrastructura de transport atât de interes european, cât și de interes național orientate spre dezvoltarea conectivității naționale și internaționale, precum și creșterea accesibilității tuturor regiunilor României la oportunitățile Pieței Unice.

Lipsa unei coerențe în planificare la nivel național reprezintă un obstacol care împiedică realizarea investițiilor în infrastructura de transport din România, prin urmare dezvoltarea unui cadru strategic stabil în sectorul transporturilor reprezintă o necesitate la care acest Plan își propune să răspundă în mod adecvat și eficient printr-o foaie de parcurs cu obiective clare.

Având în vedere perioada de tranziție între cele două exerciții financiare multianuale 2014-2020 respectiv 2021-2027, având în vedere faptul că Master Planul General de Transport și Strategia aferentă de Implementare au fost adoptate în 2016, precum și analizând necesitatea corelării politicilor publice relevante în vederea realizării obiectivelor de infrastructură necesare la nivel național, prezentul document are un rol triplu de:

- *prioritizare a investițiilor constituind o condiție favorizantă în vederea noului cadru financiar multianual,*
- *actualizare a strategiei de implementare a Master Planului General de Transport al României,*
- *document cadru de referință pentru politicile publice relevante și pentru toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor de infrastructură de transport națională.*

Din punct de vedere al abordării politicilor europene și naționale prezentul Plan Investițional reprezintă corelarea a trei arii majore de interes pentru perioada 2020 - 2030, referitoare la recuperarea deficitului de infrastructură de bază la nivel național pe toate domeniile de transport, dar mai ales în sectorul de transport rutier, aplicând politicile și standardele UE referitoare la rețelele transeuropene de transport, îndeosebi în cadrul sectorului feroviar, cu respectarea ȋntelilor de înverzire a sectorului de transport stabilite în cadrul Pactului Ecologic European și a pachetului Fit for 55, mai ales în ceea ce privește sectorul rutier.

În acest sens, măsurile, investițiile individuale, precum și metodologia de prioritzare a proiectelor din prezentul plan sunt ghidate și condiționate de cele trei domenii majore de interes menționate mai sus.

În esență, prezentul Plan Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale și financiare ale României pe un set clar de priorități, în linie cu interesele naționale și europene, care să conducă la finele decadei 2020-2030 la crearea unei rețele naționale de transport care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a economiei naționale.

Odată cadrul politic european și național setat, prezentul Plan descrie pentru fiecare sector de transport situația existentă, principalele nevoi de dezvoltare, identificarea proiectelor de investiții, metodologia de prioritzare, bugete și calendar de implementare, precum și aspectele

legate de guvernarea sectorului, operarea și întreținerea infrastructurii nou create, siguranță și tehnologii de management al traficului, precum și, nu în ultimul rând, aspecte privind protecția mediului și adaptarea climatică.

La baza dezvoltării componentelor din capitolele strategice sectoriale a stat utilizarea modelelor de trafic naționale gestionate la nivelul MT și al Cestrin, precum și cooperarea cu experții Băncii Europene de Investiții în cadrul asistențelor tehnice JASPERS și PASSA.

Abordările strategice sectoriale reflectă gândirea europeană de stabilire a diferite paliere de importanță în cadrul rețelelor de transport, astfel încât pentru fiecare sector Planul prezintă o ierarhizare a importanței strategice la nivel de rețele primare, secundare și terțiare după caz. De asemenea, planul investițional atinge aspectele integrării tiparelor de călătorie de lung parcurs cu cele de scurt parcurs în special în nodurile urbane importante ale României.

Planul acoperă nevoile integrale de dezvoltare a infrastructurii de transport din România și prevede necesitatea realizării a 6624.1 km de rețea rutieră (autostrăzi, drumuri expres, transregio, variante ocolitoare) din care 2900,5 km aferenți rețelei primare și 3723,6 km aferenți rețelei secundare. În ceea ce privește rețeaua feroviară, planul vizează realizarea a 3274,8 km de cale ferată aferenți rețelei primare și 1228 km aferenți rețelei secundare.

Pe baza prioritizării realizate în cadrul capitolelor strategice, Planul Investițional dezvoltă o strategie a asigurării finanțării necesare pe cei 10 ani de implementare plecând de la corelarea principalelor surse de finanțare disponibile României: PNRR, POT, CEF 2.0 și bugetul național. Per total nevoia de finanțare pentru toate sectoarele de transport din România pe următoarea decadă este de 72,77 miliarde EUR. Din această sumă, 34,19 mld euro sunt dedicate infrastructurii rutiere, 20,63 miliarde Euro infrastructurii feroviare, 10,7 miliarde Euro dedicate infrastructurii de metrou, 4,46 miliarde Euro dedicate infrastructurii navale și 2,79 miliarde Euro dedicate infrastructurii aeroportuare.

Alocările estimative maxime pentru finanțare europeană sunt de 40,78 mld Euro (din care 13,43 fonduri externe nerambursabile și 27,35 contribuția maximă a bugetului de stat, incluzând mecanismul supracontractării), rezultând un deficit de 31.99 mld.EUR care poate fi acoperit de la bugetul de stat, respectiv prin împrumuturi externe și fonduri private. În concluzie, România va trebui să asigure în următorii 10 ani contribuția financiară aferentă proiectelor cu finanțare europeană la care se adaugă necesarul pentru finalizarea întregii infrastructuri prezentate în acest plan, rezultând un efort financiar reprezentând aproximativ 2% din PIB/an în funcție de progresul fizic și financiar al proiectelor.

Din perspectiva sumelor prevăzute în cadrul financiar dezvoltat de prezentul Plan, este importantă asigurarea capacității de cheltuire a acestor fonduri și de aceea Planul cuprinde prevederi cu privire la creșterea capacității administrative și a cooperării interinstituționale pentru asigurarea unui parcurs eficient al proiectelor prioritizate.

În concluzie, Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România pe perioada 2020-2030 reprezintă o actualizare a Master Planului de Transport a României aprobat în Septembrie 2016, nemodificând aspectele importante ale acestuia, dar folosindu-se de experiența obținută la nivelul Ministerului Transporturilor și a beneficiarilor acestuia, vizează un

parcurs eficient al proiectelor astfel încât la finele decadei să se recupereze o mare parte din decalajul de dezvoltare față de celelalte State membre, precum și o participare activă la modernizarea conectivității europene și introducerea noilor tehnologii sustenabile.

CONFIDENTIAL

CAPITOLUL 1 – DESCRIEREA SITUAȚIEI DOCUMENTELOR STRATEGICE RELEVANTE DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA ȘI NOILE PROVOCĂRI ÎN PERIOADA 2020-2030

Pentru realizarea investițiilor în infrastructura de transport, este general acceptat faptul că acestea trebuie ghidate după o strategie de dezvoltare a sectorului. Există mai mulți factori care influențează calitatea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii de transport. *Astfel, o strategie de dezvoltare a infrastructurii de transport trebuie să fie stabilă în timp, adecvată nevoilor, sustenabilă financiar, acceptată din perspectiva impactului asupra mediului și echilibrată din perspectiva accesibilității teritoriale.*

Dintre acești factori, cel mai important este factorul de stabilitate în timp. În România, în perioada ultimilor 30 de ani s-a remarcat o crescută volatilitate a strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de transport, influențată de dese schimbări de priorități, cauzate, în cele mai multe cazuri, de schimbările deciziilor politice pentru a reduce deficitul mare dintre nevoile de dezvoltare percepute la nivel social și sursele de finanțare existente.

De altfel, existența surselor de finanțare a fost principalul factor care a ghidat strategiile de dezvoltare a infrastructurii de transport în perioadele precedente. Astfel, pentru sursele de finanțare provenite din împrumuturi externe au existat pachete de proiecte sau proiecte individuale incluse în acordurile de împrumut cu BEI, BERD, JBIC/JICA și alte bănci, iar pentru fondurile europene de pre-aderare au existat măsuri introduse în programul PHARE sau ISPA, ce corespundeau priorităților stabilite în documentele de poziție. Pe lângă asigurarea cofinanțării, bugetul de stat, niciodată suficient, a fost utilizat pentru acoperirea priorităților stabilite în programele de guvernare sau în strategiile sectoriale, ducând astfel la cuprinderea în legile bugetare anuale a unor lungi liste de proiecte începute și neterminate. Fondurile europene post-aderare au fost orientate spre implementarea politicii TEN-T, conform acordurilor cu Comisia Europeană (CE).

Pe plan diplomatic, în urma acordurilor diplomatice au existat mai multe granturi agreate cu guvernele altor state, dar acestea au fost utilizate punctual și în acord cu interesele guvernului finanțator.

Abordarea orientării strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport românești în funcție de sursele de finanțare disponibile și în acord cu particularitățile acestora, s-a dovedit a nu fi eficientă. Alte țări și-au orientat politica dezvoltării infrastructurii de transport către stabilirea unui set de priorități naționale foarte bine justificate tehnic, iar toate resursele disponibile au fost orientate exclusiv către implementarea acestor priorități.

Acest mod de lucru a fost considerat eficient și la nivelul Comisiei Europene care, de altfel, a solicitat îndeplinirea unei condiționalități ex-ante pentru statele membre aflate sub incidența politicii de coeziune, astfel încât fondurile europene alocate în perioada 2014-2020 să fie utilizate doar pentru proiectele de infrastructură de transport cuprinse într-o strategie națională comprehensivă bazată pe o proiecție multimodală care să includă o ierarhizare a proiectelor în

funcție de beneficiile economice, în funcție de contribuția la dezvoltarea rețelei TEN-T sau luând în calcul alți factori.

În România au existat mai multe tentative de a elabora o strategie națională comprehensivă însă realizarea acesteia a venit abia în anul 2016 când Guvernul României a adoptat *Master Planul General de Transport al României* (MPGT).

MPGT a fost cu adevărat un pas important înainte făcut pentru infrastructura de transport din România. Pentru prima dată în perioada postcomunistă a fost elaborată o strategie de transport comprehensibilă, multimodală, bazată pe modele de trafic, analize cost-beneficiu și alte analize multicriteriale, orientată spre integrarea politicilor europene și a reglementărilor privind protecția mediului. Strategia de implementare a MPGT a devenit un reper în evaluarea și selecția pentru finanțare a proiectelor de transport. MPGT a reprezentat răspunsul României la condiționalitatea ex-ante a Comisiei Europene și a beneficiat de susținerea CE, precum și a comisiilor de transport ale Parlamentului României.

Cu toate aspectele pozitive aduse prin adoptarea MPGT, în implementare s-au remarcat câteva deficiențe precum:

- *proiectele nu s-au maturizat în ordinea prioritizării lor,*
- *convențiile internaționale din domeniul transporturilor sunt negociate și agreeate fără a se corela cu listele de priorități ale MPGT,*
- *elemente noi de politică europeană cum ar fi mobilitatea militară nu sunt acoperite de MPGT.*

Dintre deficiențele menționate mai sus, lipsa de corelare cu MPGT în cadrul convențiilor și acordurilor internaționale prezintă efecte negative semnificative. De exemplu, în contextul discuțiilor bilaterale cu Bulgaria s-a decis construirea unor poduri noi peste Dunăre. În lipsa unei coordonări cu MPGT este posibil ca rezultatul final al acestor discuții bilaterale să nu fie viabil din punct de vedere economic sau să aibă o valoare adăugată inferioară altor proiecte, cu consecința redirectionării resurselor disponibile de la proiecte cu adevărat importante la nivel național.

Astfel, se impune stabilirea unui document unic pentru programarea investițiilor în infrastructura de transport pe termen mediu/lung, respectiv un Plan Investițional coerent și integrator al politicilor naționale, europene și internaționale, ca document de referință pentru dezvoltarea sectoarelor economice complementare în România, precum și ca reper de negociere în numele țării în relațiile internaționale. Prin urmare, factorii interni decizionali vor avea obligația să urmeze strategia prezentată în Plan pentru perioada 2020-2030. În ceea ce privește aspectele care țin de sectorul de transport și orice elemente de negociere cu state terțe vor avea la bază prioritizarea proiectelor prevăzută în prezentul Plan.

Având în vedere faptul că politicile publice, în particular în context european, se pot modifica, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de gestionar al Planului Investițional va emite în completarea Planului Investițional, documente de referință pentru aplicarea la nivel național a noilor politici.

Trecem în revistă, mai jos, principalele strategii/acte normative/documente programatice care, pe lângă MPGT, influențează perspectivele de dezvoltare a infrastructurii de transport din

România, cu mențiunea că aceste documente sunt integrate în Planul Investițional, cerințele/condiționările acestora fiind luate în considerare la întocmirea listei ierarhizate a proiectelor prioritare:

A. Reglementări, strategii și politici europene în domeniul transporturilor

- a. Regulamentul TEN-T (UE) nr. 1315/2013** trasează politica UE în sectorul de transport, abordând implementarea și dezvoltarea, la nivel european, a unei rețele de linii de cale ferată, drumuri, căi navigabile interioare, rute maritime, porturi, aeroporturi și terminale feroviare. Obiectivul final este de a elimina lacunele, blocajele și barierele tehnice, precum și de a consolida coeziunea socială, economică și teritorială în UE.

În luna septembrie 2018, CE a lansat consultări publice pentru a examina progresele realizate în implementarea obiectivelor urmărite prin Regulamentul TEN-T. Rezultatele acestei evaluări au condus la o serie de concluzii care vizează, pe lângă menținerea obiectivului de definitivare a rețelei centrale până în 2030 și a celei globale până în 2050, mutarea accentului pe aspectele „soft” precum digitalizarea, mobilitatea curată, conectată și autonomă sau utilizarea combustibililor alternativi, respectiv o integrare mai bună a obiectivelor urmărite prin Pactul Ecologic European.

- b. Mecanismul pentru Interconectarea Europei** (Connecting Europe Facility - CEF) este implementat în baza **Regulamentului (UE) nr. 1153/2021** și sprijină implementarea proiectelor de interes european, vizând accelerarea investițiilor în domeniul rețelor transeuropene, în special în finalizarea coridoarelor de transport la nivel european și urmărește să mobilizeze finanțarea care provine atât din sectorul public cât și din cel privat.

Un element de noutate introdus pentru perioada programatică 2021 – 2027 (CEF 2) se referă la inițiativa privind **mobilitatea militară**. În cadrul acestei inițiative, statele membre vor identifica și vor promova acele proiecte de infrastructură de transport cu dublă utilizare: civilă și militară (de exemplu tronsoanele rutiere/feroviare din cadrul rețelei TEN-T care nu corespund parametrilor militari, legăturile transfrontaliere lipsă, podurile care nu suportă regimul de greutate necesar pentru utilizarea militară, porturile și aeroporturile a căror capacitate poate fi îmbunătățită în funcție de cerințele militare etc.).

- c. Inițiativa celor Trei Mări (I3M)** reprezintă o platformă politică lansată în anul 2015, din care fac parte 12 state (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria), al cărei obiectiv principal este acela de a oferi susținere politică pentru o mai bună cooperare și interconectare a economiilor statelor din spațiul geografic cuprins între cele trei mări - Adriatică, Baltică și Neagră - în domenii precum energia, transporturile, telecomunicațiile sau protecția mediului.

Această inițiativă își propune să implementeze proiecte inclusiv în infrastructura de transport (de exemplu, căi ferate, navigație internă, porturi, autostrăzi etc.), energie și infrastructură digitală. De asemenea, inițiativa susține și suplimentează programele finanțate cu fonduri europene, contribuind astfel la creșterea competitivității la nivelul întregii Uniuni.

- d. **Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)** este un instrument comunitar de cooperare macro-regională destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunărene prin punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE. Aceasta reunește 14 țări situate de-a lungul Dunării: 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Germania, Ungaria, Republica Slovacă, Slovenia și România) și 5 state din afara UE (Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina).

Strategia își propune o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conectivității în regiune, prin dezvoltarea mobilității și a legăturilor de transport, inclusiv prin eliminarea blocajelor în ceea ce privește navigabilitatea pe fluviul Dunăre și îmbunătățirea siguranței navigației, prin proiecte precum FAIRWAY și DARIF – Forumul Dunării.

- e. **Parteneriatul Estic (PaE)** este o dimensiune specifică a politicii europene de vecinătate. Acesta se bazează pe cooperarea între Uniunea Europeană și 6 parteneri estici ai UE: Ucraina, Republica Moldova, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus și Republica Georgia.

Principalul obiectiv al Parteneriatului îl reprezintă accelerarea cooperării de natură politică între părți, precum și crearea cadrului și condițiilor pentru integrarea economică, inclusiv prin îmbunătățirea interconectării în domeniul energetic și al transporturilor.

- f. **TRACECA (Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia)** este un program internațional de transport în cadrul căruia sunt partenere Uniunea Europeană și alte 12 state din Europa de Est, Caucaz și regiunea Asiei Centrale. Scopul programului constă în consolidarea relațiilor economice, a comerțului și a transporturilor în regiunile bazinului Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia Centrală – în special în privirea armonizării cadrului instituțional și de reglementare în sectorul transporturilor.

De menționat, în mod specific, sunt **coridoarele de transport internaționale** la care România este sau dorește să facă parte prin prisma valorificării potențialului de a deveni hub principal de transport între Europa și Asia (Marea Neagră - Marea Caspică, TRACECA, Trans Caspian) dar și pe axa Nord-Sud (Inițiativa celor Trei Mări).

- g. **Tratatul de Instituire a Comunității Transporturilor (Balcanii de Vest)** are ca scop dezvoltarea rețelei de transport dintre Uniunea Europeană și următoarele state din sud-estul Europei: Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru și Republica Serbia. Comunitatea transporturilor își propune integrarea treptată a piețelor de transport ale acestor state în piața

transporturilor din Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul standardelor tehnice, al interoperabilității, al siguranței, al securității, al managementului traficului, al politicii sociale, al achizițiilor publice și al mediului, pentru toate modurile de transport (feroviar, rutier, maritim și căi navigabile interioare), cu excepția celui aerian.

- h. Platforme de Conectivitate între UE și China** - Comisia Europeană și Guvernul R.P.Chineze au semnat, în anul 2016, un Memorandum de înțelegere privind crearea acestei platforme pentru a spori sinergiile dintre inițiativa Chinei One Belt, One Road și inițiativele de conectivitate ale UE, precum politica trans-europeană a rețelei de transport.

Platforma are rolul de a promova cooperarea în domenii precum infrastructura, echipamentele, tehnologiile etc., de a crea oportunități de afaceri, de a crea un cadru pentru ocuparea forței de muncă etc.

B. Politici privind protecția mediului și schimbările climatice

- a. Pactul Ecologic European** reprezintă documentul strategic cu cel mai mare impact asupra politicilor UE ce marchează o schimbare de paradigmă la nivelul Uniunii, cu scopul de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050.

Astfel, până în anul 2050, Europa ar trebui să reducă cu 90% emisiile rezultate în urma activității de transport. Pentru atingerea acestui target se recomandă impunerea unor standarde mai stricte în ceea ce privește poluarea rezultată în urma transportului rutier, digitalizarea transporturilor prin creșterea mobilității automatizate, stimularea transportului multimodal, creșterea ponderii transportului feroviar, îmbunătățirea transportului public (inclusiv prin implementarea conceptului de tip park&ride, tren metropolitan), implementarea unui sistem de management al traficului automatizat, descongestionarea traficului urban, scăderea poluării din porturi, implementarea unor aplicații inteligente și a mobilității ca serviciu.

Comisia Europeană va avea în vedere măsuri legislative de stimulare a producției de combustibili alternativi pentru toate modurile de transport și de sprijin financiar pentru crearea rețelei de puncte de încărcare.

- b.** La data de 14 iulie 2021, Comisia Europeană a prezentat **pachetul „Fit for 55”**. Această inițiativă abordează orizontal decarbonizarea transportului pe mai multe dimensiuni.

Transportul rutier este influențat de măsuri privind:

- introducerea Regulamentului privind infrastructura de combustibili alternativi (AFIR), ce urmărește extinderea rețelei de combustibili alternativi (promovarea propulsiei electrice, cu hidrogen etc.). Regulamentul stabilește ținte privind numărul de stații de combustibili alternativi raportate la distanță

- și la capacitatea punctelor de reîncărcare, acestea din urmă fiind proporționale cu numărul de vehicule electrice din flotele naționale;
- taxarea suplimentară a combustibililor fosili, taxarea preferențială a GPL în perioada de tranziție și eliminarea GNC și GNL;
- înăsprirea standardelor de emisii CO₂, ajungându-se doar la construcția vehiculelor electrice după 2035;
- extinderea sistemului de tranzacționare a certificatelor verzi și la transportul rutier ce se va reflecta în regimul de accize pentru combustibilii utilizați în transportul rutier;
- montarea stațiilor de încărcare private pentru vehiculele electrice în ansamblurile de locuințe.

Transportul aerian este influențat de măsuri privind:

- deservirea cu combustibili alternativi a aeronavelor staționare;
- eliminarea scutirilor la taxarea combustibilului pentru pasageri și promovarea investițiilor cu potențial crescut de decarbonizare;
- eliminarea alocărilor gratuite pentru zborurile intra-UE.

Transportul naval este influențat de:

- Fuel EU - reducerea intensității emisiilor, eliminarea combustibililor foarte poluanți și introducerea unui sistem de penalități și stimulente.
- deservirea cu combustibili alternativi a navelor;
- exceptări de taxare pentru energia electrică din surse regenerabile utilizată la mal sau pentru combustibilii durabili.

Propunerile incluse în pachetul „Fit for 55” sunt însoțite de măsuri financiare de sprijin prin crearea unui Fond Social pentru Climă (FSC).

- c. **Strategia UE pentru mobilitate durabilă și inteligentă**, publicată în decembrie 2020, identifică o serie de inițiative concrete în 10 domenii-cheie, cum ar fi creșterea numărului vehiculelor cu emisii zero; punerea la dispoziția publicului și a întreprinderilor a unor soluții alternative durabile; sprijinirea digitalizării și automatizării; îmbunătățirea conectivității și accesului, cu scopul de a atinge obiectivul de neutralitate climatică pentru sectorul de transport până în anul 2050.

C. Reglementările aplicabile la nivel național în domeniul transporturilor

- a. **Hotărârea de Guvern nr. 666/2016 pentru aprobarea Master Planul General de Transport al României** include principalele proiecte de infrastructură de transport

(autostrăzi, drumuri expres, investiții în căi ferate, terminale multimodale, porturi și căi navigabile) pe care Români are nevoie a să le implementeze.

MPGT furnizează elementele necesare prioritizării investițiilor pentru toate modurile de transport, constituind un plan de dezvoltare multimodal cuprinzător și bine fundamentat, pe baza unei analize multicriteriale și utilizând un model matematic de prognoză a cererii. Ierarhizarea proiectelor a fost realizată cu ajutorul Modelului Național de Transport, cumulând informațiile privind valoarea ratei interne de rentabilitate economică, apartenența la rețeaua TEN-T Core sau Comprehensive și impactul asupra mediului.

- b. Semestrul European pentru coordonarea politicilor economice** oferă un cadru pentru identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora. Statele membre își dezvoltă propriile strategii naționale multianuale în materie de investiții, în sprijinul acestor reforme. Strategiile menționate ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național sau din partea Uniunii, sau prin ambele. Strategiile respective ar trebui, de asemenea, să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din fonduri, prin **Mecanismul de Redresare și Reziliență** instituit prin **Regulamentul (UE) 241 /2021** și prin **Programul InvestEU instituit prin Regulamentul (UE) 523/ 2021**.

În cursul perioadei de programare 2021-2027, statele membre trebuie să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări. În cursul evaluării intermediare, statele membre trebuie să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de noile provocări identificate în cadrul recomandărilor relevante specifice fiecărei țări.

- c. Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025** include ansamblul acțiunilor de întreținere, reparații și reînnoiri necesare pentru reabilitarea infrastructurii existente și menținerea acesteia la parametrii de performanță necesari pentru susținerea unui transport feroviar competitiv la nivel național.

În același timp, Strategia include obiective de modernizare și dezvoltare necesare pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare de mobilitate a populației și a mărfurilor, precum și cerințelor identificate privind creșterea competitivității transportului feroviar.

Totodată, sunt prevăzute acțiuni de modernizare a exploatării (operării) infrastructurii feroviare, pe de o parte în scopul creșterii performanțelor circulației

trenurilor, iar, pe de altă parte, pentru eficientizarea exploatării în scopul limitării costurilor transportului feroviar.

- d. **Strategia privind Cadrul Național de politică pentru dezvoltarea pieței de combustibili alternativi** este cuprinsă în **Anexa Hotărârii Guvernului nr. 87/2018** și este elaborată în conformitate cu prevederile Capitolului II din Legea nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, prin care se transpune **Directiva 2014/94/EU** privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Scopul Strategiei este de a susține dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi în România, astfel încât toate modurile de transport, metodele și tehnologiile relevante să poată fi utilizate nediscriminatoriu, în conformitate cu eficiența, aplicabilitatea și rentabilitatea lor, pentru a asigura un sistem de transport cu un grad ridicat de continuitate și un impact minim asupra mediului înconjurător și asupra sănătății populației, atât în aglomerările urbane, cât și de-a lungul infrastructurii interurbane și rețelelor europene de transport rutier, naval și aerian.

- e. **Legea nr. 291/2018** prevede aprobarea obiectivului de investiții **Autostrada Iași-Târgu Mureș (Autostrada Unirii)** care propune ca viitoare surse de finanțare bugetul de stat, credite externe/fonduri europene nerambursabile sau parteneriatul public-privat.

Autostrada A8 (Târgu Mureș - Iași - Ungheni) este prevăzută în cadrul MPGT la categoria proiecte noi (TEN-T Core). Proiectul asigură o legătură directă între zona de nord-est a României, regiunea Cluj-Napoca și zona de vest - granița cu Ungaria/restul Europei via Sebeș/Timișoara sau Oradea via OR 12 (Gilău - Borș).

- f. **Parteneriatul Public Privat** la nivel național este reglementat prin intermediul **Ordonanței de Urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat**. Aceasta reglementează realizarea sau reabilitarea/extinderea unor bunuri prin cooperarea dintre partenerul public și cel privat, astfel încât bunurile respective vor aparține ulterior patrimoniului partenerului public. Finanțarea obiectivelor se realizează în principal din fonduri private și prevede o perioadă relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale cu scopul de a permite investitorului recuperarea investiției și realizarea de profit.

Formele sub care poate fi aplicat PPP la nivel național presupun atât o formă contractuală care prevede trei parteneri: unul public, unul privat și o societate cu capital social integral al partenerului privat, cât și una instituțională care presupune înființarea unei noi societăți coordonate de către cele două părți implicate.

Concluzii

Dezvoltarea infrastructurii de transport asigură o dezvoltare economică durabilă prin investițiile realizate în acest sector, acționând ca motor al dezvoltării și pentru alte sectoare ale economiei naționale. Investițiile în acțiuni de tip „smart” nu vor avea valoare adăugată fără existența infrastructurii de transport de bază. Deficitul de infrastructură la nivel național se reflectă în special printr-o mobilitate redusă, printr-o conectivitate insuficientă la nivelul anumitor regiuni, trafic de tranzit ridicat la nivelul a numeroase localități, timpi mari de așteptare la trecerea frontierei, etc.

În ciuda eforturilor și a progreselor înregistrate în ultima perioadă, infrastructura de transport din România rămâne deficitară în raport cu nevoile de dezvoltare iar noile obiective ale UE nu sunt neapărat calibrate pe nevoile de dezvoltare ale tuturor statelor membre UE, ținând cont de discrepanțele de conectivitate între vest-est.

Având în vedere importanța infrastructurii pentru dezvoltarea României, este necesară coagularea unui efort național pe perioada 2020-2030 pentru asigurarea resurselor financiare pentru demararea obiectivelor de investiții necesare pentru implementarea atât a proiectelor de importanță europeană la nivelul rețelei TEN-T care tranzitează teritoriul național, cât și a priorităților naționale referitoare la rutele de interconectare regională.

Pentru a asigura coerență și eficiență în procesul de prioritizare și implementare a proiectelor de infrastructură de transport la nivel național este necesară o corelare a tuturor documentelor programatice prezentate mai sus. Această corelare se poate realiza prin întărirea procesului de programare a infrastructurii de transport în România, pornit de MPGT, prin elaborarea unui plan operativ bazat o actualizare a Strategiei de Implementare a Master Planului General de Transport al României, demers care are la bază elaborarea acestui Plan Investițional pentru perioada 2020-2030. Documentul are un caracter programatic, având ca principal reper eficiența socio-economică. Planul recalibrează obiectivele de investiții printr-o analiză multicriterială, ținând cont de proiectele realizate și de cele în curs de realizare, de nevoile identificate, de sursele de finanțare precum și de politicile publice, strategiile și reglementările aplicabile la nivel european și național.

Din momentul aprobării prezentului document, orice instituție din România care acționează în numele țării în relații internaționale va trebui să urmeze strategia prezentată în actualul plan pentru perioada 2020-2030. Elementele de negociere în convențiile internaționale vor ține cont de interesul național astfel încât proiectele prevăzute în prezentul plan să fie realizate cu prioritate.

În concluzie, prezentul Plan Investițional reprezintă corelarea a trei arii majore de interes pentru perioada 2020 - 2030, referitoare la recuperarea deficitului de infrastructură de bază la nivel național pe toate domeniile de transport, dar mai ales în sectorul de transport rutier, aplicând politicile și standardele UE referitoare la rețelele transeuropene de transport, îndeosebi în cadrul sectorului feroviar, cu respectarea Țintelor de înverzire a sectorului de

transport stabilite în cadrul Pactului Ecologic European și a pachetului Fit for 55, mai ales în ceea ce privește sectorul rutier.

În acest sens, măsurile, investițiile individuale, precum și metodologia de prioritizare a proiectelor din prezentul plan sunt ghidate și condiționate de cele trei domenii majore de interes menționate mai sus.

În esență, Planul Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale și financiare ale României pe un set clar de priorități, în linie cu interesele naționale și europene, care să conducă la finele decadei 2020-2030 la crearea unei rețele naționale de transport care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a economiei naționale.

CONFIDENTIAL

CAPITOL 2 – ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A MASTER PLANULUI GENERAL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI

Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport reprezintă componenta operativă a acestui document programatic, care are ca principal rol definirea proiectelor și a ordinii în care aceste proiecte trebuie implementate pentru a obține, în mod eficient, impactul așteptat asupra mobilității la nivel național.

Așa cum am precizat în cadrul Capitolului 1 al prezentului Plan, în derularea strategiei de implementare a MPGT, adoptată odată cu aprobarea acestuia prin HG nr. 666/2016, s-au remarcat câteva deficiențe și anume:

- proiectele nu s-au maturizat în ordinea prioritizării;
- convențiile internaționale au fost negociate și agreeate fără a se corela cu listele de priorități ale MPGT;
- elementele noi de politică europeană cum ar fi mobilitatea militară, nu au fost luate în considerare.

Prin urmare, cu toate că per total MPGT își păstrează valabilitatea, este necesar ca Strategia de Implementare a proiectelor prevăzute de către MPGT să fie actualizată, luând în considerare următoarele elemente:

- proiectele aflate în diferite stadii de implementare (construcție/licitație lucrări/angajamente de finanțare);
- noile politici europene (Pactul Ecologic European, Mobilitate Militară, Fit for 55, etc.) și condițiile favorizante pentru noua perioadă de programare;
- maturitatea proiectelor aflate în pregătire.

Actualizarea Strategiei de Implementare trebuie să fie un proces la fel de riguros precum cel utilizat la elaborarea MPGT. Astfel, actualizarea strategiei de implementare se va realiza în două etape:

- 1) Etapa 1: Finalizarea proiectelor deja angajate / aflate în implementare**
- 2) Etapa 2: Prioritizarea celorlalte investiții**

Etapa 1. Finalizarea proiectelor deja angajate / aflate în implementare

În această categorie vor fi incluse proiectele care au deja angajamente de finanțare din POIM 2014-2020, respectiv:

- a) Proiectele care au contracte de finanțare care se află deja în execuție;
- b) Proiectele care au contracte de finanțare care se afla în procedura de achiziție a lucrărilor;
- c) Proiectele care au angajamente bugetare (prin formularul F1) care se află în procedura de achiziție a lucrărilor.

Etapa 2: Prioritizarea celorlalte investiții

Prioritizarea pornește de la obiectivele strategice pentru dezvoltarea infrastructurii de transport definite în MPGT, completate cu criteriile legate de noile politici europene și cele privind maturitatea pregătirii proiectelor, reflectate într-o analiză multicriterială care se finalizează cu o listă de proiecte prioritare pentru a fi implementate în perioada 2020-2030, respectiv post 2030.

2.1. MODURI DE TRANSPORT: RUTIER

Obiectivele de conectivitate și mobilitate a populației și a mărfurilor

Cel mai important demers în procesul de stabilirea a Planului Investițional 2020 - 2030 este reprezentat de către definirea ipotezelor privind alocările financiare disponibile pentru investiții,

pentru toate modurile de transport. Stabilirea cu acuratețe a surselor financiare disponibile va permite obținerea unui plan de investiții realist, care răspunde eficient la nevoile de conectivitate națională și europeană. Pe de altă parte, chiar dacă gradul de maturitate al proiectelor nu a fost considerat criteriu distinct în cadrul analizei multicriteriale și deci nu constituie element în procesul de prioritizare, acesta reprezintă o componentă deosebit de importantă în strategia de implementare a proiectelor, în contextul în care valoarea portofoliului de proiecte depășește cu mult alocarea bugetară disponibilă.

Conform Master Planului General de Transport al României, **obiectivele strategice** pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a României sunt:

- **Eficiența economică:** sistemul de transport trebuie să fie eficient în ceea ce privește operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să depășească costurile. Acest obiectiv măsoară beneficiul oferit utilizatorilor și furnizorilor de servicii din sistemul de transport, iar măsurile cantitative ale acestuia sunt: Raportul Beneficiu Cost (RBC), Valoarea Actualizată Netă (VAN) și Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE).
- **Sustenabilitate:** acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de mediu. Modurile de transport sustenabile (feroviar, transportul public, transportul naval, etc.) care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii trebuie dezvoltate în mod prioritar. În cadrul evaluării economice a costurilor operaționale și emisiilor, acestora li se atribuie valori monetare, iar înscrierea sustenabilității ca obiectiv separat respectă atât intențiile Guvernului României și ale Uniunii Europene, cât și preocupările generațiilor viitoare.
- **Siguranță:** investițiile în transporturi ar trebui să conducă la asigurarea unui sistem de transport mai sigur. Astfel, costul economic al accidentelor este transformat în valori monetare în cadrul evaluării economice. În același timp, unul dintre obiectivele principale ale Guvernului și ale UE este reprezentat de către reducerea accidentelor din sectorul transporturilor, astfel încât siguranța va rămâne un obiectiv distinct în cadrul strategiei de transport.
- **Impactul asupra mediului:** sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra mediului. Introducerea și dezvoltarea rețelei de alimentare cu combustibili alternativi reprezintă, de asemenea, un obiectiv strategic al componentei de transport.
- **Dezvoltarea economică:** sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită dezvoltarea economică atât la nivel național cât și la nivel regional. Investițiile în transporturi trebuie, de asemenea, să favorizeze dezvoltarea echitabilă față de toate regiunile și față de toți locuitorii României.
- **Dubla utilizare a infrastructurii de transport:** construcția sau dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie să faciliteze în mod continuu, indiferent de condițiile meteorologice, asigurarea serviciilor de transport atât pentru pasageri și mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară și transportul echipamentelor aferente acesteia.

- **Finanțarea:** există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. La nivelul proiectelor, disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul instrumentelor structurale (Fondul de Coeziune - FC, Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR, Connecting Europe Facility/Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF, PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) / RRF (Facilitatea pentru Redresare și Reziliență), împrumuturi prin implicarea IFI-urilor și mecanisme de tip PPP) vor afecta oportunitatea implementării acestora, dar și prioritizarea lor. Programul general de investiții va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a fondurilor naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată.

Cele șase etape esențiale la nivel strategic pentru prioritizarea proiectelor sunt:

1. Identificarea deficiențelor de conectivitate la nivelul regiunilor României;
2. Identificarea soluțiilor pentru creșterea conectivității și a siguranței mobilității ținând cont de criteriile de sustenabilitate economică, socială și de mediu, la scara regională, națională și europeană;
3. Stabilirea unei liste de proiecte și intervenții necesare îmbunătățirii conectivității și mobilității;
4. Ierarhizarea proiectelor în funcție de mai multe criterii;
5. Identificarea tuturor surselor de finanțare disponibile;
6. Elaborarea strategiei de implementare prin corelarea listei de proiecte prioritizate cu sursele de finanțare disponibile și stabilirea, în manieră realistă, a perioadei de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, proiectelor tehnice și execuției lucrărilor. Totodată, se va estima gradul de absorbție al fondurilor europene pentru fiecare an dar și presiunea financiară pentru bugetul statului în ceea ce privește cofinanțarea în vederea realizării proiectelor de infrastructură de transport.



Figura 2.1.1. Etapele strategice pentru implementarea unui proiect de infrastructură de transport

Obiectivele strategice

Reprezintă acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial care sunt considerate, în general, drept scopuri sau obiective generice ale Guvernului și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Acestea au fost definite folosind analizele, obiectivele și strategiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dar și politicile și strategiile Uniunii Europene.

Obiectivele strategice identificate pentru sectorul de transport rutier sunt următoarele:

- Îmbunătățirea mobilității populației și a traficului aferent transportului de mărfuri în cadrul rețelei TEN-T de bază și a rețelei extinse, prin dezvoltarea unei rețele de autostrăzi și drumuri expres;
- Asigurarea accesului pentru populație și pentru mediul de afaceri la rețeaua TEN-T de bază și la rețeaua extinsă, prin dezvoltarea coridoarelor de legătură națională;
- Asigurarea unei rețele de transport rutier sigure și operaționale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum și la reducerea timpilor de călătorie;
- Asigurarea accesului internațional prin intermediul legăturilor cu țările vecine;
- Asigurarea unei rețele de transport prietenoasă cu mediului înconjurător, prin implementarea proiectelor de variantă de ocolire.




Figura 2.1.2. Etapele parcurse pentru stabilirea listei de proiecte rutiere

Obiectivele generale de conectivitate rutieră

Obiectivele generale de conectivitate rutieră vizează rezolvarea a patru mari probleme ale transportului rutier, cum ar fi:

- Timpuri mari de întârziere în trafic;
- Media zilnică anuală ridicată a traficului rutier (MZA);
- Accesibilitatea redusă, națională și internațională;
- Rata mare de accidente rutiere.

Obiectivele generale de conectivitate rutieră răspund nevoilor de mobilitate rutieră pentru populație și pentru mediul de afaceri, asigurând tranzitul pasagerilor și al mărfurilor în și între regiunile României, asigurând conexiune cu statele vecine în condiții sigure și operaționale și în armonie cu mediul înconjurător și cu politicile europene împotriva schimbărilor climatice.

Astfel, au fost identificate patru obiective generale de conectivitate rutieră care asigură conexiunea atât a provinciile istorice, cât și a regiunile de dezvoltare ale României și se extind natural spre rețelele rutiere din statele vecine (figura 2.1.3):

- **Obiectivul general de conectivitate 1 (OC1)** – asigură mobilitatea populației și a mărfurilor pe direcția vest – est, între Europa Centrală și Marea Neagră, din sud-estul în vestul țării, prin

centrul României. Reprezintă o veritabilă axă națională transcarpatică și transregională, de importanță europeană regională.

- **Obiectivul general de conectivitate 2 (OC2)** – asigură conexiunea între nord-estul și sudul României, reprezentând totodată și o axă între nordul și sudul continentului, în actualul context geopolitic.
- **Obiectivul general de conectivitate 3 (OC3)** – reprezintă o legătură importantă între Moldova și Transilvania, dar și o axă de tranzit între țările aflate la est de România și Europa Centrală.
- **Obiectivul general de conectivitate 4 (OC4)** – realizează legătura între sudul și vestul țării, traversând Muntenia, Oltenia și Banatul. La nivel european reprezintă o legătură facilă între sudul continentului și partea centrală și vestică a acestuia.

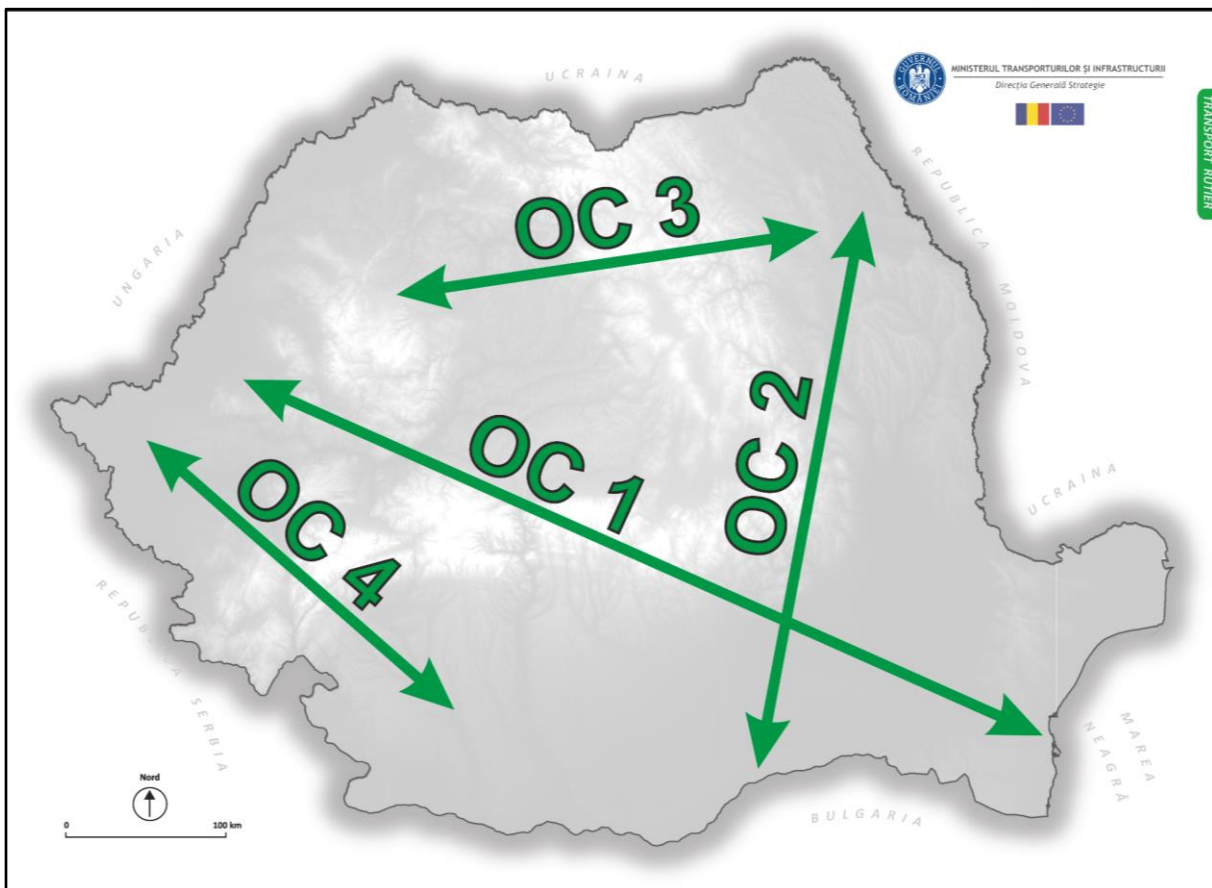


Figura 2.1.3. Harta obiectivelor generale de conectivitate rutieră

Coridoarele de conectivitate au fost definite în baza obiectivelor generale de conectivitate, a dispunerii rețelei TEN-T din România, ținând cont de următoarele criterii:

- Reducerea timpilor de întârziere în trafic pe rețeaua de transport TEN-T din România;
- Dezvoltarea economică a României și creșterea mobilității populației și a mediului de afaceri;
- Reducerea riscului de accidente în traficul rutier și creșterea siguranței traficului;

- Dezvoltarea echilibrată a rețelei de transport rutier între toate regiunile României;
- Asigurarea accesibilității zonelor urbane și a polilor de creștere economică cu potențial de dezvoltare;
- Implementarea sistemelor inteligente de transport (ITS);
- Promovarea dezvoltării infrastructurii de transport cu impact redus asupra mediului înconjurător, care să susțină protejarea biodiversității și atenuarea schimbărilor climatice, în armonie cu noul concept promovat de către Comisia Europeană prin Pactul Ecologic European.

Coridoarele naționale de conectivitate rutieră

Identificarea și analiza coridoarelor de conectivitate la nivelul României constituie un demers deosebit de important pentru stabilirea și fundamentarea intervențiilor și a proiectelor pentru sectorul rutier. Pentru dezvoltarea unei rețele rutiere sustenabile din punct de vedere economic dar și performantă atât la nivel național, cât și la nivel internațional, analiza de-a lungul coridoarelor de conectivitate se dovedește a fi absolut necesară.

Coridoarele de conectivitate au fost stabilite atât pentru a asigura legătura între principalele regiuni de dezvoltare ale României, dar și de-a lungul unor aliniamente care conectează polii de creștere economică și centrele industriale ale României (cele existente sau potențiale). O atenție deosebită în identificarea și analiza coridoarelor de conectivitate s-a acordat conexiunii acestora cu coridoarele de transport din statele vecine dar și cu coridoarele dezvoltate la nivel continental.

Din această perspectivă, au fost stabilite 5 coridoare cheie de conectivitate rutieră la nivel național și mai multe inter-coridoare și coridoare transfrontaliere care să asigure nevoia de conectivitate a populației și a mediului de afaceri. Aceste coridoare stau la baza identificării ulterioare a proiectelor din sectorul rutier (figura 2.1.4).

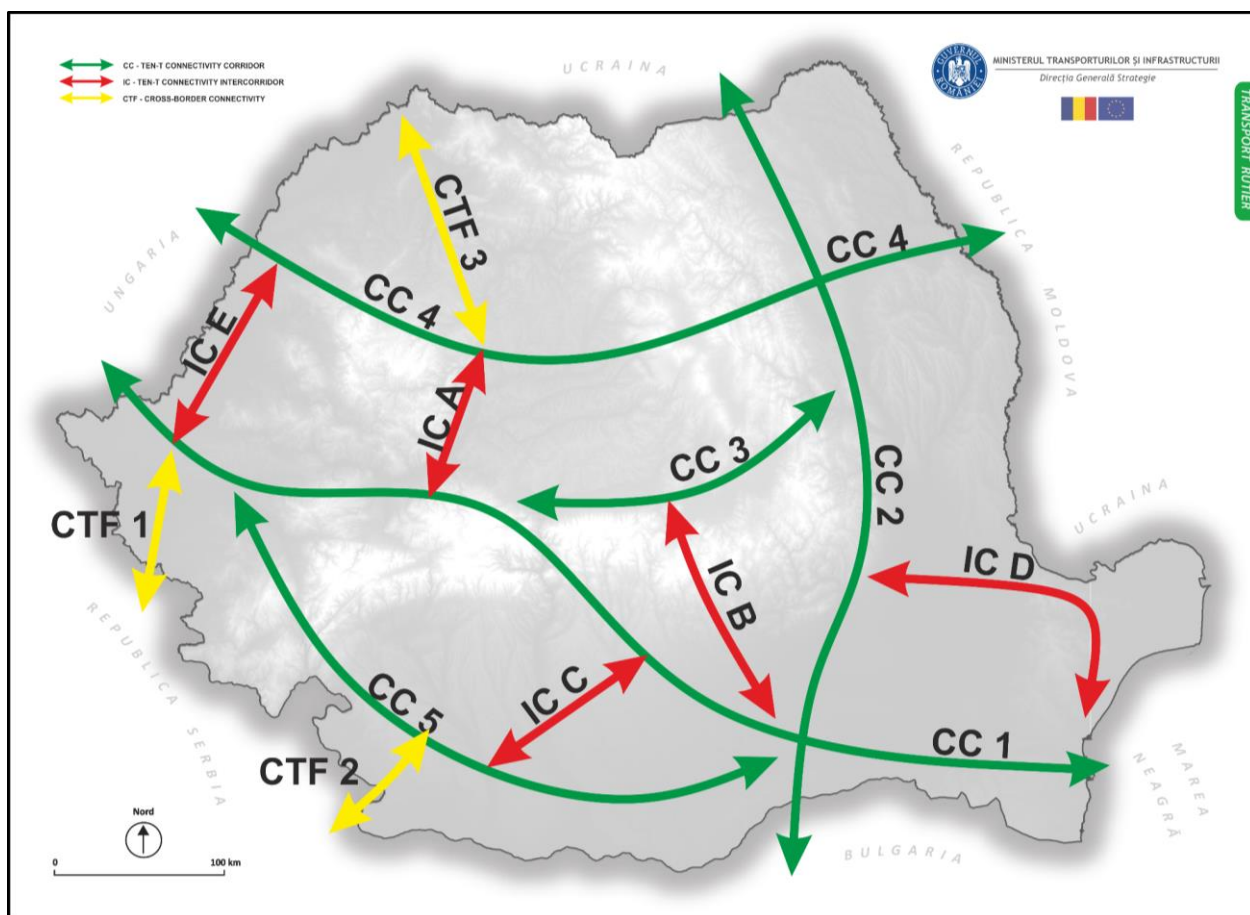


Figura 2.1.4. Harta coridoarelor de conectivitate rutieră din România

Coridoarele de conectivitate rutieră

Cele 5 coridoare de conectivitate rutieră, prezentate în detaliu mai jos, surprind statusul proiectelor la nivelul trimestrului IV al anului 2021 (figura 2.1.5). Costurile estimate pentru proiecte sunt stabilite la nivelul trimestrului II al anului 2020, însă în lista de proiecte și în strategia de finanțare, costurile estimate au fost ajustate cu indicele de cost în construcții calculat de către Institutul Național de Statistică (INS).

- **Coridorul de conectivitate 1 (Transcarpați)** – este compus din 13 proiecte de autostradă și asigură legătura între Marea Neagră și granița de vest a țării, pe o lungime de aproximativ 978 km, din care 650 km sunt în operare (tabelul 2.1.1). Întregul coridor se suprapune atât rețelei TEN-T Core cât și ramurii nordice a coridorului european Rin-Dunăre. Proiectele de autostradă necesar a fi implementate pentru a se realiza continuitatea acestui coridor sunt: Autostrada Inel București + drumurile radiale (ramura nordică), Autostrada Inel București (ramura sudică), Autostrada Pitești – Sibiu, sectorul de autostradă Holdea – Margina.

**Tabelul 2.1.1. Proiectele de infrastructură rutieră care compun
coridorul de conectivitate 1 – ‘Coridorul Transcarpați’**

Nr. Crt.	Coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE 1 CC 1 - 'TRANSCARPAȚI' Constanța - București - Pitești - Sibiu - Sebeș - Deva - Lugoj - Timișoara - Arad - Nădlac II	TEN-T Core	Constanța - București	O	203.5	-	-	-	Constanța, Medgidia, Fetești, București
2			Inel București (Nord) + drumuri radiale	P	145.7	1112.3	1323.6	7.6	București, Otopeni, Buftea, Bragadiru Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni, Voluntari
3			Inel București (Sud)	C	51.2	507.3	603.7	9.9	București, Jilava
4			București - Pitești	O	109.7	-	-	-	București, Găești, Pitești
5			Pitești - Sibiu	P/C	122.2	2773.5	3300.4	22.7	Pitești, Curtea de Argeș, Veștem, Cisnădie, Sibiu
6			Centura Sibiu	O	17.6	-	-	-	Sibiu
7			Sibiu Vest - Sebeș	O	58.0	-	-	-	Sibiu, Sebeș
8			Sebeș - Deva	O	56.9	-	-	-	Sebes, Orăștie, Simeria, Deva
9			Deva - Holdea	O	43.3	-	-	-	Deva, Ilia
10			Holdea - Margina	P	9	297.0	353.4	33	Faget
11			Margina- Timișoara	O	77.7	-	-	-	Lugoj, Recaș, Timișoara
12			Timișoara - Arad	O	44.5	-	-	-	Timișoara, Arad
13			Arad - Nădlac II	O	38.9	-	-	-	Arad
	Total coridor				978.16	4690.11	5581.2		
O	în operare				650.0				
C	în construcție				51.2				
P	în proiect				276.94				

- **Coridorul de conectivitate 2 (Drumul Siretului)** – este compus din 9 proiecte de autostradă/drum expres care asigură legătura pe axa nord – sud între Moldova și Muntenia dar și între Ucraina/Moldova și Bulgaria, la nivel de tranzit continental. Lungimea coridorului este de aproximativ 570 km din care 96.2 km sunt în operare (tabelul 2.1.2). Întregul coridor se suprapune rețelei TEN-T Core. Proiectele de autostradă/drum expres necesar a fi implementate pentru a se realiza continuitatea acestui coridor sunt: drumul de mare viteză Giurgiu Frontieră – București, drumul de mare viteză Ploiești – Buzău, drumul de mare viteză

Buzău – Focșani, drumul de mare viteză Focșani – Bacău Sud, drumul de mare viteză Bacău Nord – Pașcani, drumul de mare viteză Pașcani – Suceava și drumul de mare viteză Suceava – Siret Frontieră.

Tabelul 2.1.2. Proiectele de infrastructură rutieră care compun coridorul de conectivitate 2 – ‘Coridorul Drumul Siretului’

Nr. Crt.	Coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE 2 CC 2 - 'DRUMUL SIRETULUI' Giurgiu II - București - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava - Siret II	TEN-T Core	Giurgiu II - București	P	55.2	289.8	344.9	5.3	Giurgiu, București
2			București - Ploiești	O	65.2	-	-	-	București, Ploiești
3			Ploiești - Buzău	P	63.3	635.2	755.9	10.0	Ploiești, Mizil, Buzău
4			Buzău - Focșani	P	82.4	797.3	948.8	9.7	Buzău, Rm.Sărat, Gugești, Focșani
5			Focșani - Bacău	P	95.9	998.3	1188.0	10.4	Focșani, Mărășești, Adjud, Bacău
6			VO Bacău	O	31.0	-	-	-	Bacău
7			Bacău - Pașcani	P	77.4	654.7	779.1	8.5	Bacău, Roman, Pașcani
8			Pașcani - Suceava	P	60.5	423.8	504.3	7.0	Pașcani, Dolhasca, Suceava
9			Suceava - Siret II	P	41.0	215.0	255.9	5.2	Suceava, Rădăuți, Siret
	Total coridor				571.9	4014.1	4776.8		
O	în operare				96.2				
C	în construcție				0				
P	în proiect				475.7				

- **Coridorul de conectivitate 3 (Coridorul Moldova)** – este compus din două proiecte de autostradă și un proiect de conectivitate între acestea (tabelul 2.1.3). Coridorul, în lungime de aproximativ 300 km, asigură legătura între sudul Transilvaniei și Moldova și reprezintă o cale rapidă de acces la coridorul de conectivitate 1. Întreg coridorul se suprapune rețelei europene de transport TEN-T Comprehensive. Coridorul de conectivitate este compus din proiectele de autostradă Sibiu – Brașov și Brașov – Bacău care sunt legate de proiectul de autostrada ByPass Brașov – Nord.

Tabelul 2.1.3. Proiectele de infrastructură rutieră care compun coridorul de conectivitate 3 – ‘Coridorul Moldova’

Nr. Crt.	Coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE 3 CC 3 - 'MOLDOVA' Sibiu - Făgăraș - Brașov - Onești - Bacău	TEN-T Comprehensive	Sibiu - Brașov	P	129.6	1479.9	1761.1	11.4	Sibiu, Talmaciu, Avrig, Făgăraș, Codlea, Ghimbav, Brașov
2			ByPass Brașov Nord	P	19.7	118.2	140.7	6.0	Codlea, Brașov
3			Brașov - Bacău	P	159.9	2364.0	2813.2	14.8	Brașov, Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc, Covasna, Tg. Ocna, Slănic Moldova, Onești, Bacău
Total coridor					309.2	3962.1	4714.9		
O	în operare				0.0				
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				309.2				

- **Coridorul de conectivitate 4 (Coridorul Montana)** – este compus din 9 proiecte de autostradă care conectează Moldova de Transilvania prin partea central-nordică a României (tabelul 2.1.4). Coridorul are o lungime de aproximativ 577 km și se află în operare și în faze avansate de construire între Tg. Mureș și Nădășelu (aproximativ 110 km). Sectorul de coridor estic (Ungheni – Iași – Tg. Mureș – Turda) se suprapune rețelei europene TEN-T Core, iar sectorul vestic (Turda – Gilău – Suplacu de Barcău – Borș) face parte din rețeaua europeană TEN-T Comprehensive. Intervențiile necesare pentru realizarea coridorului sunt reprezentate de 4 importante proiecte de autostradă în lungime totală de aproximativ 470 km: autostrada Ungheni (inclusiv pod peste Prut) – Iași – Tg. Neamț, autostrada Tg. Neamț – Tg. Mureș, respectiv autostrada Nădășelu – Suplacu de Barcău și Suplacu de Barcău – Borș Frontieră.

Tabelul 2.1.4. Proiectele de infrastructură rutieră care compun coridorul de conectivitate 4 – 'Coridorul Montana'

Nr. Crt.	Coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE 4 CC 4 - 'TRANSILVANIA - MONTANA' Ungheni - Iași - Tg. Neamț - Tg. Mureș - Turda - Gilău - Nădășelu - Zalău - Suplacu de Barcău - Borș II	TEN-T CORE	Ungheni - Iași - Tg. Neamț	P	134.9	1179.5	1403.6	8.7	Iași, Tg. Frumos, Pașcani, Tg. Neamț
2			Tg. Neamț - Tg. Mureș	P	176.9	5403.9	6430.7	30.5	Tg. Neamț, Bicăz, Borsec, Toplița, Gheorgheni, Sovata, Tg. Mureș
3			Tg. Mureș (Ungheni) - Iernut	O	14.0	-	-	-	Tg. Mureș
4			Iernut - Chețani	O	17.9	-	-	-	Tg. Mureș, Luduș, Câmpia Turzii

5			<i>Chețani - Câmpia Turzii</i>	C	15.7	58.3	69.4	3.7	Câmpia Turzii
6		TEN-T Comprehensive	<i>Câmpia Turzii - Nădășelu</i>	O	61.0	-	-	-	Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca
7			<i>Nădășelu - Poarta Sălajului</i>	P/C	42.0	409.0	486.7	9.7	Cluj-Napoca, Zalău
8			<i>Poarta Sălajului - Biharia</i>	P	110.0	1057.0	1257.8	9.6	Suplacu de Barcău, Oradea
9			<i>Biharia - Borș II</i>	O	5.4				Oradea, Borș
Total coridor					577.8	8107.7	9648.2		
O	în operare				98.3				
C	în construcție				15.7				
P	în proiect				463.8				

- **Coridorul de conectivitate 5 (Coridorul Danubius)** – este compus din 5 proiecte de drum expres care conectează Muntenia, Oltenia de Banat și mai departe de Europa Centrală (tabelul 2.1.5). Coridorul de conectivitate are o lungime de aproximativ 450 km, din care doar 11 km corespunzători legăturii autostrada A1 – varianta de ocolire Lugoj se află în operare. Coridorul de conectivitate rutieră se suprapune atât rețelei europene TEN-T Core cât și celei TEN-T Comprehensive, după cum urmează: sectoarele București – Alexandria – Craiova și Dr. Tr. Severin – Lugoj aparțin TEN-T Core, respectiv sectorul Craiova – Filiași – Dr. Tr. Severin care aparține rețelei TEN-T Comprehensive. De asemenea, la nivel european această axă se suprapune coridorului european Orient East-Med, ce unește Europa Centrală cu porturi de la Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană. Intervențiile necesare pentru realizarea coridorului de conectivitate Danubius sunt: drum expres București – Alexandria – Craiova, drum expres Craiova – Dr. Tr. Severin, drum expres Dr. Tr. Severin – Caransebeș – Lugoj.

Tabelul 2.1.5. Proiectele de infrastructură rutieră care compun coridorul de conectivitate 5 – 'Coridorul Danubius'

Nr. Crt.	Coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil. EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE 5 CC 5 - 'DANUBIUS EXPRES' București - Alexandria - Craiova - Dr. Tr. Severin - Caransebeș - Lugoj - A1	TEN-T Comprehensive	<i>București - Alexandria</i>	P	70.0	367.5	437.3	5.3	București, Alexandria
2			<i>Alexandria - Craiova</i>	P	125.0	656.3	780.9	5.3	Roșiori, Caracal, Craiova
3			<i>Craiova - Filiași - Dr. Tr. Severin</i>	P	104.0	700.5	833.6	6.7	Craiova, Filiași, Strehaia, Dr. Tr. Severin

4		TEN-T Core	Dr. Tr. Severin - Orșova - Caransebeș - Lugoj	P	142.0	1533.0	1824.3	10.8	Dr. Tr. Severin, Orșova, Băile Herculane, Caransebes, Lugoj
5			Lugoj - A1	O	11.0	-	-	-	Lugoj
Total coridor					452.0	3257.3	3876.1		
O	în operare				11.0				
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				441.0				

Inter-coridoarele de conectivitate rutieră

Mobilitatea și schimbul de fluxuri de transport între cele 5 coridoare de conectivitate rutieră prezentate mai sus sunt asigurate de către patru inter-coridoare de conectivitate rutieră, după cum urmează:

- **Inter-Coridorul de conectivitate A (Inter-coridorul Ardeal)** – se suprapune rețelei europene TEN-T Core și este compus din 4 proiecte de autostradă (70 km în total) care conectează coridoarele de conectivitate 1 – *Transcarpați* de coridorul de conectivitate 4 – *Montana* între Sebeș și Turda (tabelul 2.1.6). Loturile 1 și 2 corespunzătoare sectoarelor de autostradă dintre Turda și Aiud sunt în operare din anul 2018, iar loturile 3 și 4 dintre Aiud, Teiuș, Alba Iulia și Sebeș sunt în operare din 2020 - 2021.

Tabelul 2.1.6. Proiectele de infrastructură rutieră care compun inter-coridorul de conectivitate A – 'Inter-coridorul Ardeal'

Nr. Crt.	Inter-coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE A IC A - 'ARDEAL' Sebes - Alba Iulia - Aiud - Turda	TEN-T Core	Sebeș - Aiud	O	41.3	-	-	-	Sebeș, Alba Iulia, Aiud, Turda
2			Aiud - Turda	O	28.7	-	-	-	
	Total coridor				70.0				
O	în operare				70.0				
C	în construcție				0.0				
P	în proiectare				0.0				

- **Inter-Coridorul de conectivitate B (Inter-coridorul Autostrada zăpezii)** – este compus din două proiecte de autostradă și are o lungime de aproximativ 105 km, suprapunându-se rețelei TEN-T Comprehensive între Ploiești și Brașov (tabelul 2.1.7). Inter-coridorul asigură

mobilitatea între mai multe coridoare de conectivitate: CC2 *Drumul Siretului*, la sud, respectiv CC4 *Moldova*, la nord. Coridorul este compus din autostrăzile Ploiești – Comarnic și Comarnic – Râșnov - Cristian - Ghimbav (Brașov). În operare se află aproximativ 6.3 km de autostradă corespunzător secțiunii dintre Cristian și Râșnov.

Tabelul 2.1.7. Proiectele de infrastructură rutieră care compun inter-coridorul de conectivitate B – ‘Inter-coridorul Autostrada Zăpezii’

Nr. Crt.	Inter-coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE B IC B - 'AUTOSTRADA ZĂPEZII' București - Ploiești - Comarnic - Sinaia - Predeal - Râșnov - Brașov	TEN-T Comprehensive	Ploiești - Comarnic	P	48.6	306.8	365.1	6.3	Ploiești, Băicoi, Câmpina, Comarnic
2			Comarnic - Râșnov	P	45.4	1235.3	1470.0	27.2	Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal, Râșnov, Bran, Brașov
3			Râșnov - Cristian	O	6.3	-	-	-	Râșnov, Bran, Cristian, Brașov
4			Cristian - Ghimbav	P	4.7	29.6	35.2	6.3	Brașov, Ghimbav, Codlea
	Total coridor				105.0	1571.7	1870.3		
O	în operare				6.3				
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				98.7				

- **Inter-Coridorul de conectivitate C (Inter-coridorul Oltenia)** – acest inter-coridor este constituit de proiectul drumului expres Pitești – Craiova și este compus din 5 proiecte aflate în diverse faze de execuție, pe o lungime de 121 km (tabelul 2.1.8). Inter-coridorul se suprapune rețelei europene TEN-T Comprehensive și va crește mobilitatea între coridoarele de conectivitate CC 1 *Transcarpați* și CC 5 *Danubius* (tabelul 2.1.8). Pe de altă parte, acesta va constitui o axă de descongestionare a traficului de-a lungul DN65, în special la nivelul orașelor Slatina și Balș.

Tabelul 2.1.8. Proiectele de infrastructură rutieră care compun inter-coridorul de conectivitate C – ‘Inter-coridorul Oltenia’

Nr. Crt.	Inter-coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE C IC C - 'OLTENIA'	TEN-T Comprehensive	<i>tronson 1 (km 0 - km 18)</i>	C	17.7	74.6	88.8	4.21	Pitești, Slatina, Balș, Craiova
2			<i>tronson 2 lot 1 (km 18)</i>		18.5	137.8	164.0	7.45	

	Pitești - Slatina - Balș - Craiova		- km 36)						
3			tronson 2 lot 2 (km 36 - km 58)		21.4	165.0	196.4	7.71	
4			tronson 3 (km 58 - km 89)		31.7	208.2	247.8	6.57	
5			tronson 4 (km 89 - km 121)		31.8	189.5	225.5	5.96	
	Total coridor				121.1	775.1	922.4		
O	în operare				0.0				
C	în construcție				121.1				
P	în proiect				0.0				

- **Inter-Coridorul de conectivitate D (Inter-coridorul Dobrogea)** – acest inter-coridor asigură legătura între Moldova și Marea Neagră, respectiv între coridorul de conectivitate CC 2 *Drumul Siretului* în nord-vest și coridorul de conectivitate CC 1 *Transcarpați* în sud-est (tabelul 2.1.9). Lungimea inter-coridorului este de aproximativ 324 km și este compus din mai multe proiecte: drumul expres dintre Autostrada A7 (ramurile Focșani și Buzău) și Brăila (102 km), drumul expres Brăila - Galați (11 km), podul suspendat peste Dunăre (2 km – aflat în execuție), drumul expres Măcin – Tulcea – Constanța (Ovidiu) (187 km), autostrada ByPass Constanța – legătura spre Portul Constanța (21.8 km – aflat în operare din 2011/2013). Toate proiectele aparțin rețelei europene TEN-T Comprehensive.

Tabelul 2.1.9. Proiectele de infrastructură rutieră care compun inter-coridorul de conectivitate D – 'Inter-coridorul Dobrogea'

Nr. Crt.	Inter-coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE D IC D - 'DOBROGEA'	TEN-T Comprehensive	Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila	P	102.1	464.0	552.2	4.5	Buzău, Rm. Sărat, Focșani, Brăila
2	Buzău / Focșani - Brăila		Brăila - Galați	C	11.1	75.5	89.8	4.5	Brăila, Galați
3	Galați - Tulcea - Constanța - Port Constanța		Pod peste Dunăre	C	2.0	415.8	494.8	207.9	Brăila, Macin
4			Macin - Tulcea -	P	187.7	904.0	1075.7	4.8	Măcin, Isaccea,

			<i>Constanta (Ovidiu)</i>						Tulcea, Babadag, Ovidiu, Constanța
5			<i>Ovidiu - Port Constanta</i>	O	21.8	-	-	-	Ovidiu, Constanța, Port Constanța
	Total coridor				324.7	1859.3	2212.6		
O	în operare				21.8				
C	în construcție				13.1				
P	în proiect				289.8				

- **Inter-Coridorul de conectivitate E (Inter-coridorul Țara Crișurilor)** – acest inter-coridor asigură legătura și mobilitatea între coridorul de conectivitate CC 4 *Montana* și coridorul de conectivitate CC 1 *Transcarpați*, între Oradea și Arad (tabelul 2.1.10). Lungimea inter-coridorului este de 134 km și se suprapune rețelei europene TEN-T Comprehensive. De asemenea, acest inter-coridor este parte integrantă a traseului *Via Carpatia* ce are ca obiectiv major conectarea rutieră a Mării Baltice cu Marea Mediterană.

**Tabelul 2.1.10. Proiectele de infrastructură rutieră care compun
inter-coridorul de conectivitate E – 'Inter-coridorul Țara Crișurilor'**

Nr. Crt	Inter-coridorul de Conectivitate	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE FIC F - 'Țara Crișurilor' Oradea - Arad	TEN-T Comprehensive	<i>Oradea - Arad</i>	P	134.0	522.6	621.9	3.9	Oradea, Salonta, Chișineu Criș, Arad
	Total coridor				134.0	522.6	621.9		
O	în operare				0.0				
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				134.0				

Stadiul proiectelor care aparțin coridoarelor de conectivitate rutieră descrise anterior sunt reprezentate în figura de mai jos (figura 2.1.5). Proiectele aparțin rețelei TEN-T Core și Comprehensive și se suprapun peste rețeaua rutieră primară din România.

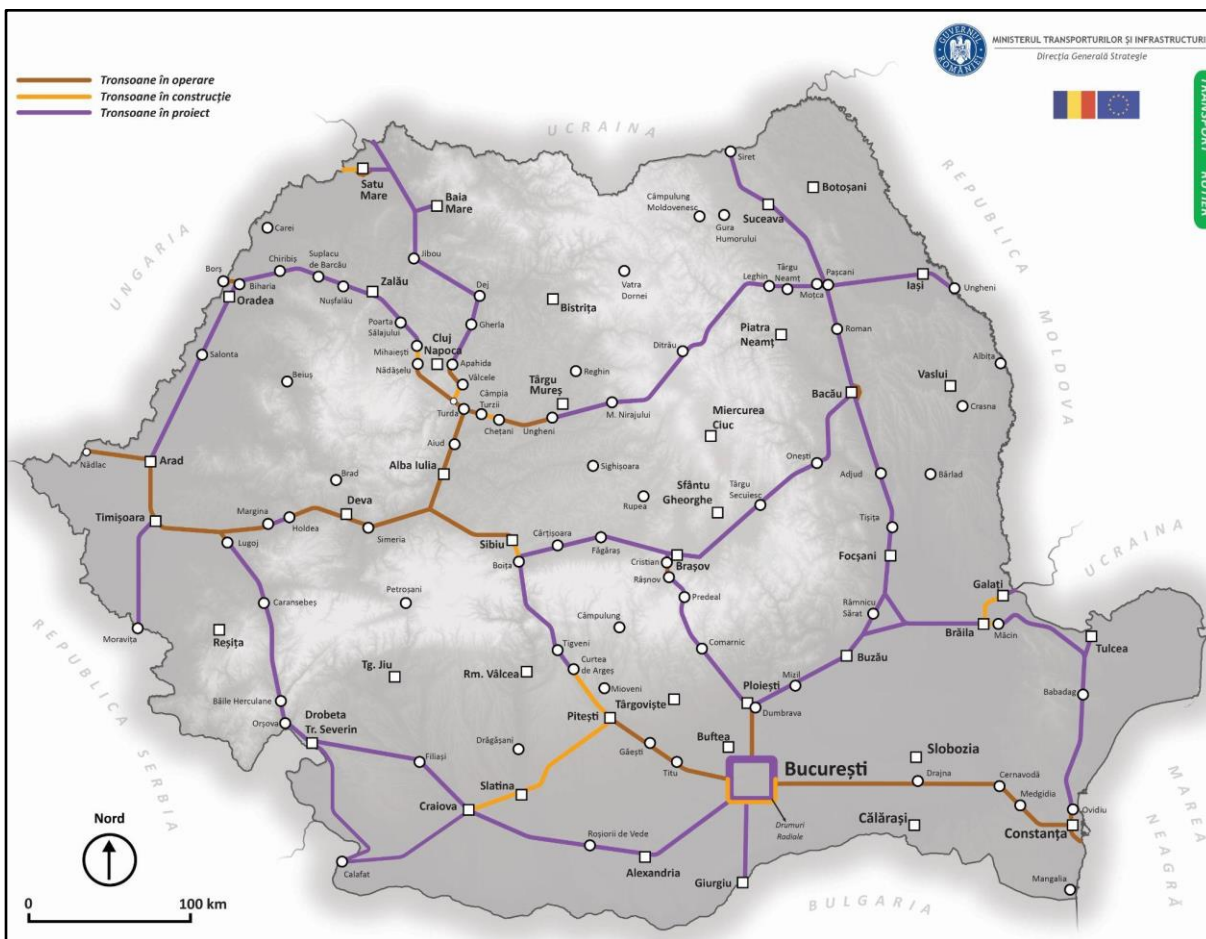


Figura 2.1.5. Stadiul coridoarelor de conectivitate rutieră din România

Coridoarele transfrontaliere

Legătura coridoarelor de conectivitate cu rețelele rutiere din statele vecine se realizează de-a lungul coridoarelor TEN-T, în mod direct sau indirect (figura 2.1.4).

Legătura directă a coridoarelor de conectivitate cu rețelele rutiere ale statelor vecine se realizează după cum urmează:

- **Coridorul de conectivitate CC 1 Transcarpați:** asigură conectivitatea cu Ungaria prin punctul transfrontalier (PTF) Nădlac II în vest, respectiv cu alte state prin portul Constanța, la est; mobilitatea rutieră națională și transfrontalieră se realizează de-a lungul coridorului TEN-T Core și a coridorului Rin – Dunăre (ramura nordică);
- **Coridorul de conectivitate CC 2 Drumul Siretului:** asigură conectivitatea cu Bulgaria prin PTF Giurgiu în sud, respectiv cu Ucraina prin PTF Siret, în nord. Mobilitatea rutieră națională și transfrontalieră se realizează de-a lungul coridorului TEN-T Core;
- **Coridorul de conectivitate CC 4 Montana:** asigură conectivitatea cu Ungaria prin PTF Borș II în vest, respectiv cu Republica Moldova prin PTF Ungheni II, în est. Mobilitatea rutieră națională și transfrontalieră se realizează de-a lungul coridorului TEN-T Core;

De asemenea, coridoarele de conectivitate se racordează cu rețelele rutiere ale statelor vecine și indirect, prin intermediul **coridoarelor de conectivitate transfrontaliere**, astfel:

- **Coridorul transfrontalier CTF 1 (Coridorul Banat)** – conectează coridorul de conectivitate CC 1 *Transcarpați* în nord (zona Timișoara), cu Serbia prin PTF Moravița, în sud (tabelul 2.1.11). Lungimea coridorului este de aproximativ 88 km. Mobilitatea rutieră națională și transfrontalieră se realizează de-a lungul coridorului TEN-T Core.

Tabelul 2.1.11. Proiectul de infrastructură rutieră care formează coridorul trans-frontalier CTF 1 – ‘Banat’

Nr. Crt.	Conectivitate Transfrontaliera	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL TRANSFRONTALIER 1 CTF 1 - 'BANAT' Timișoara - Moravița (SRB)	TEN-T Core	Timișoara - Moravița	P	88.1	343.6	408.9	3.9	Timișoara, Moravița
	Total coridor				88.1	343.6	408.9		
O	în operare				0				
C	în construcție				0				
P	în proiect				88.1				

Pe de altă parte, importanța acestui coridor rezidă și din faptul că la scară regională poate reprezenta o legătură importantă între două coridoare europene cu dezvoltare est-vest (figura 2.1.6): fostul coridor Pan-European IV în nord (Republica Cehă – Austria – Ungaria – România) respectiv fostul coridor Pan-European X în sud (Italia – Slovenia – Croația – Serbia – Macedonia/Bulgaria - Grecia).

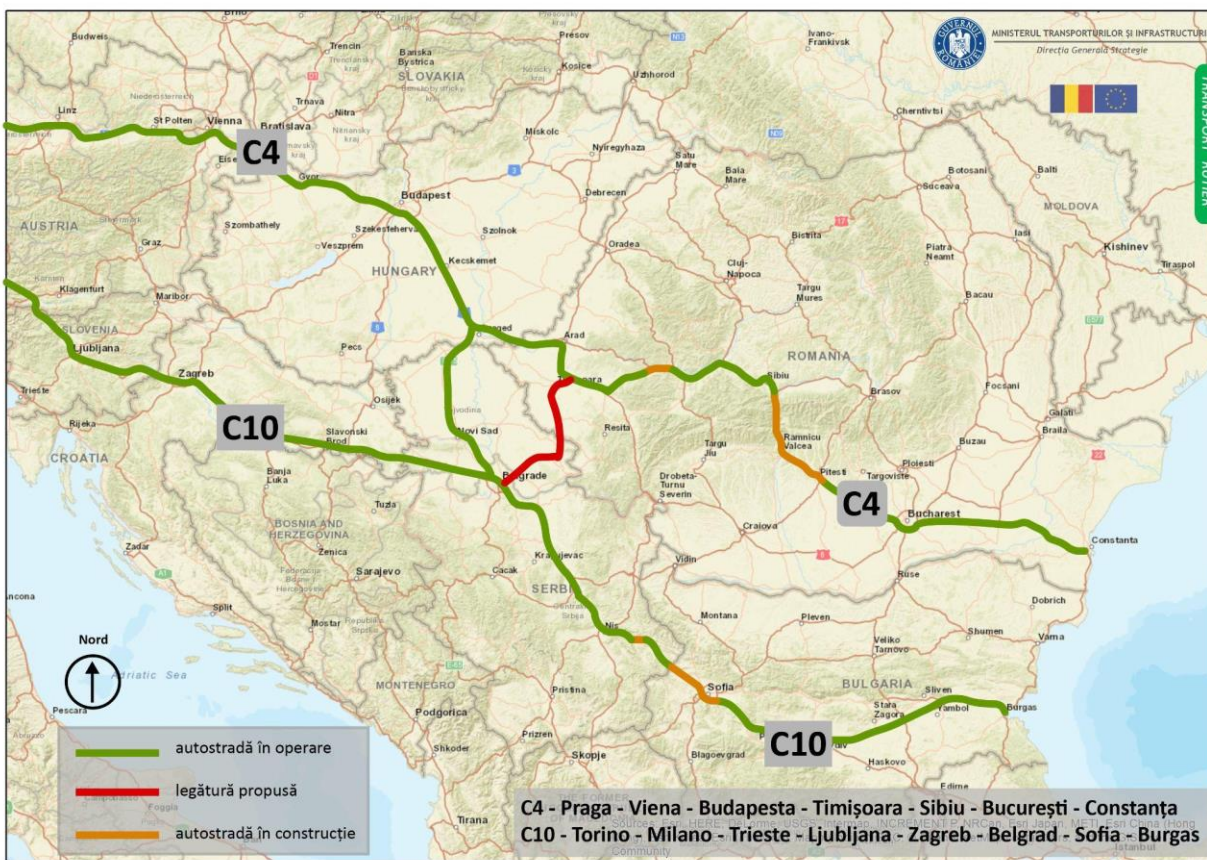


Figura 2.1.6. Importanța coridorului transfrontalier Banat în context regional

- **Coridorul transfrontalier CTF 2 (Coridorul Tracia)** – conectează coridorul de conectivitate CC 5 *Danubius* în nord (Dr. Tr. Severin/Craiova) cu Bulgaria prin PTF Calafat, în sud (tabelul 2.1.12). Lungimea coridorului este de aproximativ 150 km. Mobilitatea rutieră națională și transfrontalieră se realizează de-a lungul coridorului TEN-T Core, prin intermediul a două proiecte rutiere: Drobeta Turnu Severin – Calafat (72 km), respectiv Craiova – Calafat (78 km).

Tabelul 2.1.12. Proiectul de infrastructură rutieră care formează coridorul trans-frontalier CTF 2 – ‘Tracia’

Nr. Crt.	Coridor Transfrontalier	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL TRANSFRONTALIER 2 CTF 2 - 'TRACIA'	TEN-T Core	Dr. Tr. Severin - Calafat	P	72.8	283.9	337.8	3.9	Dr. Tr .Severin, Calafat
2	Drobeta Tr. Severin / Craiova - Calafat (BG)		Craiova - Calafat	P	78.7	306.9	365.2	3.9	Craiova, Calafat
	Total coridor				151.5	590.8	703.1		
O	în operare				0				
C	în construcție				0				

P	în proiect				151.5				
---	------------	--	--	--	-------	--	--	--	--

- **Coridorul transfrontalier CTF 3 (Coridorul Someș)** – leagă coridorul de conectivitate CC 3 Montana în partea de sud (Turda, Cluj-Napoca), atât cu Ungaria, prin PTF Oar, cât și cu Ucraina, prin PTF Halmeu II. Lungimea coridorului este de aproximativ 264 km (tabelul 2.1.13). Mobilitatea rutieră națională și transfrontalieră se realizează parțial de-a lungul coridorului TEN-T Comprehensive. Coridorul asigură conectivitatea la rețeaua rutieră rapidă, în mod direct, a municipiilor Satu Mare și Baia Mare, respectiv indirect a municipiului Bistrița.

Tabelul 2.1.13. Proiectul de infrastructură rutieră care formează coridorul trans-frontalier CTF 3 – ‘Someș’

Nr. Crt.	Conectivitate Transfrontaliera	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL TRANSFRONTALIER 3 CTF 3 - 'Someș' Turda - Apahida - Dej - Jibou- Baia Mare - Halmeu (UCA) /Satu Mare - Oar (HU)	partial TEN-T Comprehensive	A3 - Tureni	C	9.0	65.5	77.9	7.3	Turda, Cluj-Napoca (Apahida)
2			Cluj-Napoca (Apahida) - Dej - Baia Mare - Halmeu	P	170.2	1058.9	1260.1	6.2	Cluj-Napoca (Apahida), Dej, Jibou, Baia Mare, Halmeu
3			Baia Mare - Satu Mare	P	55.0	259.0	308.2	4.7	Baia Mare, Satu Mare
4			VO Satu Mare	O	19.5	-	-	-	Satu Mare
5			Satu Mare - Oar	C	10.9	63.4	75.4	5.8	Satu Mare
	Total coridor				264.6	1446.8	1721.7		
O	în operare				19.5				
C	în construcție				19.9				
P	în proiect				225.2				

În sinteză, coridoarele prezentate mai sus, rezultate din obiectivele de conectivitate ale României, însumează aproximativ 4140 km, din care 973 km se află în operare (trimestrul 4 al anului 2021), 221 km se află în diverse faze de implementare, iar peste 2950 km sunt în faza de concept. Din același total de 4147.8 km, coridoarele de conectivitate rutieră reprezintă 2889 km, inter-coridoarele de conectivitate rutieră reprezintă 754.8 km și 504.2 km sunt reprezentați de coridoarele transfrontaliere (tabelul 2.1.14).

Tabelul 2.1.14. Sinteza lungimilor coridoarelor (dimensiunile sunt exprimate în km)

Nr. Crt.	Lungime coridoare	Total	Operare	Construcție	Proiect
		km	km	km	km
1	Coridoare Conectivitate	2889.0	855.4	66.9	1966.6
2	Inter-coridoare Conectivitate	754.8	98.1	134.2	522.5
3	Coridoare Transfrontaliere	504.2	19.5	19.9	464.8
Total		4147.9	973.1	221.0	2953.9

Valoare totală a proiectelor de-a lungul coridoarelor este de 31.14 mld.EUR (37.06 mld.EUR inclusiv TVA), din care 24.03 mld.EUR (28.59 mld.EUR inclusiv TVA) reprezintă proiectele din lungul coridoarelor de conectivitate, 4.72 mld.EUR (5.62 mld.EUR cu TVA) reprezintă costul pentru construcția inter-coridoarelor de conectivitate, iar 2.38 mld.EUR (2.83 mld.EUR inclusiv TVA) reprezintă necesarul financiar pentru implementarea proiectelor de-a lungul coridoarelor transfrontaliere.

**Tabelul 2.1.15. Sinteza costurilor totale necesare
pentru implementarea proiectelor de-a lungul coridoarelor**

Nr. Crt.	Costuri coridoare	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	Total Coridoare Conectivitate	24031.2	28597.2
2	Total Inter-coridoare Conectivitate	4728.7	5627.1
3	Total Coridoare Transfrontaliere	2381.2	2833.6
	Total	31141.1	37057.9

Definirea rețelei rutiere din România

Pentru dezvoltarea sustenabilă a sistemului de transport rutier, în strânsă corelare cu nevoile de conectivitate și cu sursele de finanțare disponibile, au fost definite trei niveluri de rețele rutiere cu caracter de complementaritate, cu rol de a crea un sistem ramificat care să asigure și să deservească eficient populația și economia României. În stabilirea nivelurilor de rețele a fost luată în considerare inclusiv îmbunătățirea conectivității în regiunea Europei de Sud-Est, precum și corelarea cu politicile europene de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

În acest context, au fost definite două tipuri de rețele rutiere, cu un grad ridicat de complementaritate, care vor acoperi întreaga țară și care vor răspunde cerințelor de mobilitate pentru o dezvoltare economică rapidă și sustenabilă. Cele două rețele rutiere identificate, fundamentate prin analiza detaliată din *Master Planul General de Transport al României*, sunt reprezentate de:

- **Rețeaua rutieră primară** – constituie structura rutieră de bază a României în context național (coridoarele de conectivitate rutieră) și european (coridoarele TEN-T din România). *Întreaga rețea TEN-T Core și cea mai mare parte din rețeaua TEN-T Comprehensive se suprapune rețelei rutiere primare.*
- **Rețeaua rutieră secundară** – se constituie atât într-o rețea de complementaritate a rețelei primare, cu rol de alimentare a acesteia dar și într-o rețea de legătură între aceasta și rețeaua de drumuri naționale și județene.

Sectorul rutier – rețeaua primară

În contextul finanțărilor limitate care vor caracteriza următorul cadru financiar și în contextul efectelor post pandemie Covid-19, se resimte nevoia concentrării politicilor și investițiilor naționale către acele secțiuni de rețea rutieră care, din punct de vedere al rolului și al utilității, alcătuiesc sectorul principal al rețelei naționale. În acest context, rețeaua rutieră primară îndeplinește importante funcții precum:

- conectivitate între centrele economice populate importante și centrele urbane cu un număr mai mare de 125 000 locuitori ;
- conectivitate cu punctele de deschidere către statele vecine, precum treceri de frontieră, aeroporturi și porturi importante;
- importanță majoră din punct de vedere economic, caracterizate printr-o capacitate mare, care permite transportul intensiv de persoane și mărfuri;
- importanță europeană – regională pentru asigurarea tranzitului de pasageri și a schimbului de mărfuri între statele vecine;
- coridoare de conectivitate, inter-coridoare de conectivitate și coridoare transfrontaliere.

Având la bază criteriile prezentate mai sus, rețeaua rutieră primară conectează toate regiunile de dezvoltare și cei mai importanți poli de creștere economică din România. Pe de altă parte, din rețeaua rutieră primară fac parte și primele 18 orașe din România în raport cu nivelul populației (peste 125 000 locuitori). Astfel, rețeaua rutieră primară inter-conectează în mod direct municipiile București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Baia Mare, Buzău, Dr. Tr. Severin, importante centre socio-economice și demografice.

Rețeaua rutieră primară care acoperă echilibrat teritoriul României, reprezintă un veritabil motor de dezvoltare economică națională și regională, care poate dinamiza investițiile, generând efecte benefice directe asupra îmbunătățirii calității vieții locuitorilor României (figura 2.1.7).

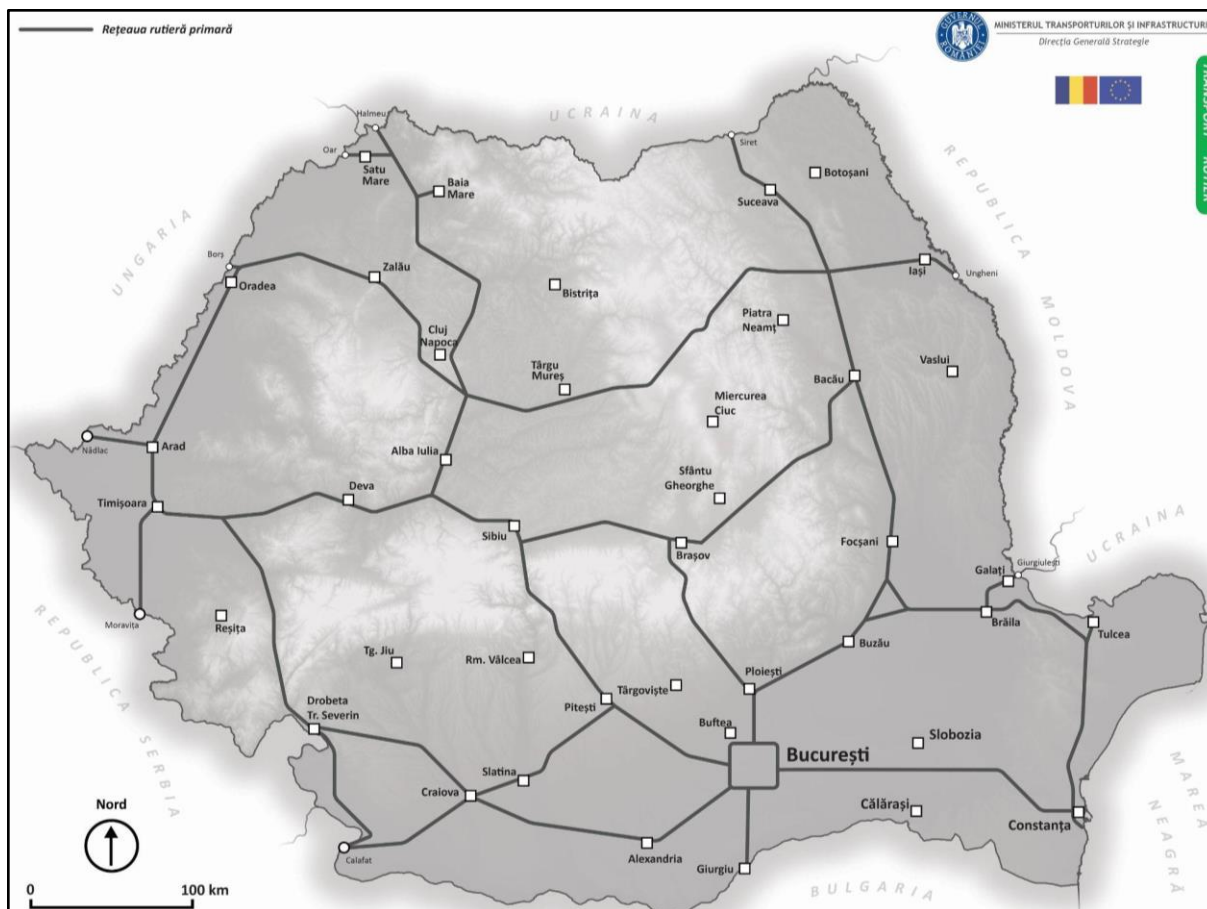


Figura 2.1.7. Harta rețelei rutiere primare

Pe de altă parte, rețeaua rutieră primară se suprapune peste întreaga rețea europeană TEN-T Core și pe cea mai mare parte a rețelei TEN-T Comprehensive din România, contribuind astfel la dezvoltarea mobilității rutiere generale, atât la nivel național, cât și la nivel european (figura 2.1.8).

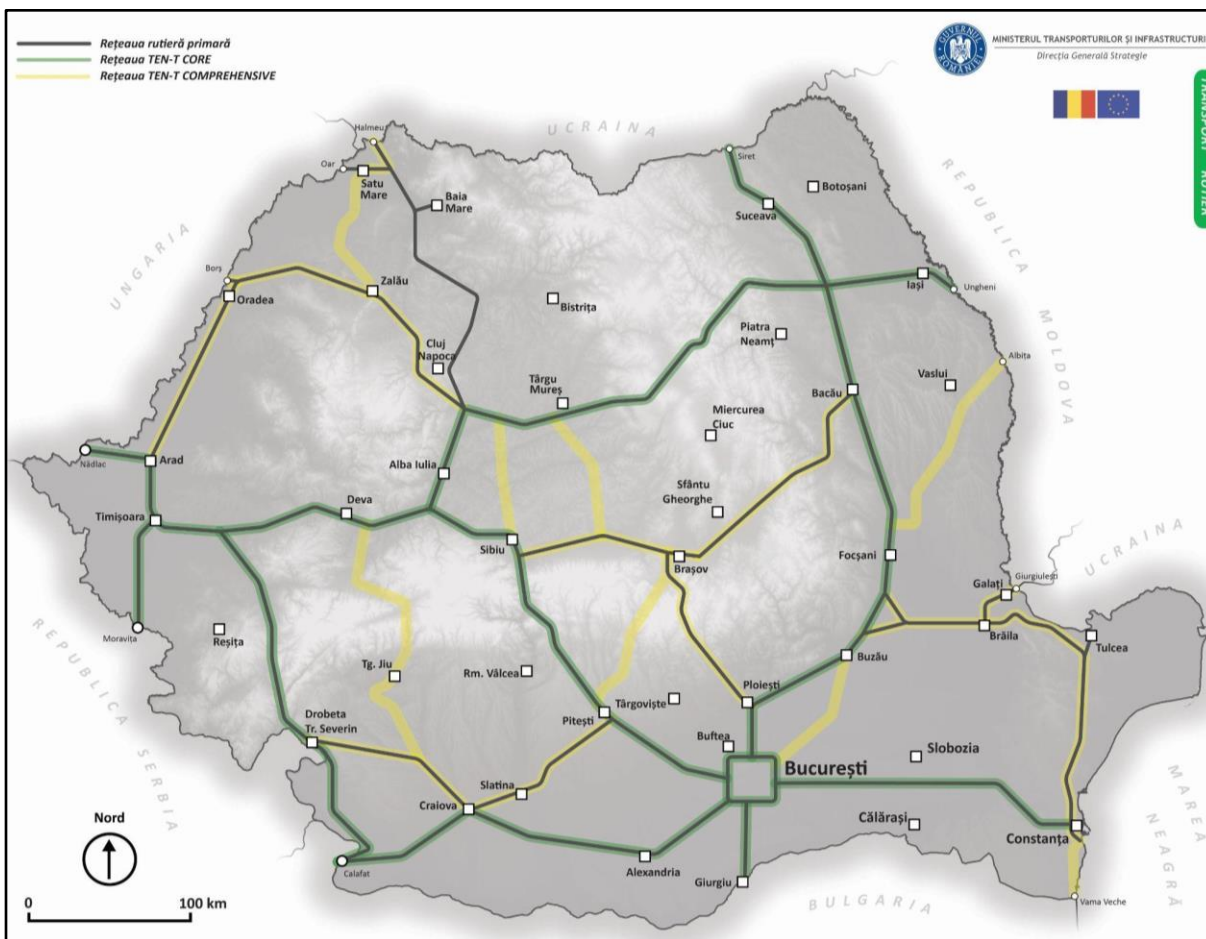


Figura 2.1.8. Harta rețelei rutiere primare în relație cu rețeaua TEN-T din România

În cadrul rețelei primare sunt incluse **drumurile radiale** ca parte a proiectului de Autostrada A0 - Orbital București (proiectul din rețeaua primară vizat: Inel București (Nord) + drumuri radiale), cu următoarele obiective de conectivitate:

- Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă implementarea unor măsuri și a unor proiecte care au ca țintă creșterea atractivității investiției autostrăzii A0 - Inel București pentru Regiunea de Dezvoltare București - Ilfov, prin atragerea transportului de mărfuri și pasageri, prin generarea unui trafic eficient și rentabil.
- Un al doilea obiectiv îl reprezintă conexiunea cât mai facilă a autostrăzii A0 - Inel București cu municipiul București și cu aria metropolitană, prin drumuri de legătură la aceasta (noi drumuri radiale). Astfel, se asigură accesibilitatea prin opțiuni de transport care permit noi destinații și acces către servicii esențiale.
- Al III-lea obiectiv al proiectului este reprezentat de creșterea conectivității la A0 prin drumurile de legătură (drumuri radiale) care determină dezvoltarea economică și creșterea randamentului zonelor logistice, industriale și rezidențiale din Regiunea București - Ilfov.
- Al IV-lea obiectiv al proiectului este legat de realizarea unei conectivități directe, integrate între marile bulevarde radiale ale municipiului București și a DNCB - cu Autostrada A0 -

Inel București prin drumuri radiale, având ca principală consecință optimizarea și descongestionarea traficului rutier pe străzile și bulevardele din zonele de interferență dintre zona urbană și cea metropolitană.

Drumurile radiale, care ajută la creșterea atractivității investiției autostrăzii A0 - Inel București prin conectarea acestora la municipiul București și la aria metropolitană, sunt în număr de 10 și însumează o lungime totală estimată de 96.03 km. Drumurile radiale înglobate într-un singur proiect denumit *Orbital București* au fost trasate respectând obiectivele proiectului, astfel încât, acestea leagă marile bulevarde radiale ale municipiului București și a DN CB cu A0, dar creează și conexiuni între localități din aria metropolitană la A0, intersectând un număr total de 30 UAT-uri. Astfel, s-au propus noduri și descărcări rutiere în număr de 29 pentru conectarea acestor drumuri radiale (figura 2.1.9). Structura drumurilor radiale va fi la profil 2+2. De asemenea, proiectul presupune 10 drumuri radiale și două noduri rutiere asociate proiectului A0 pentru realizarea conexiunii la rețeaua rutieră existentă.

Pe de altă parte, configurația drumurilor radiale propuse cuprinde și benzi dedicate transportului public de pasageri sau spațiu dedicat implementării unor soluții de transport pasageri de mare capacitate și prietenoase cu mediul (de tipul tramvaielor articulate).

Studiile de fezabilitate vor cuprinde și informații legate de amplasarea și operaționalizarea stațiilor de reîncărcare cu combustibili alternativi, în conformitate cu politica actuală a Comisiei Europene.

Costul estimat al proiectelor este de 586.10 mil.EUR fără TVA și 697.47 mil.EUR cu TVA, iar, costul pe km este de aproximativ 7.26 mil.EUR cu TVA (tabel 2.1.16). De asemenea, sursa de finanțare a proiectului Orbital București va fi din POIM, POT și Buget de Stat.

Costul total al proiectelor include costurile de expropriere rezultate pe baza grilelor notariale, însă acestea pot varia și vor fi definitive în cadrul studiilor de fezabilitate.

Descrierea proiectelor propuse (tabel 2.1.16):

- **DR1 - Vest Express** are o lungime de 8.98 km și realizează legătura între Autostrada A0 - DN CB - Bulevardul Timișoara, având un cost estimat de 63.10 mil. EUR fără TVA.
- **DR2 - Autostrada A1** are o lungime de 12.02 km. Scopul proiectului este de extindere la trei benzi pe sens între km 10 și km 23 a Autostrăzii A1. Costul estimat este de 36.05 mil. EUR fără TVA.
- **DR3 - Giulești Express** are o lungime de 10.37 km, conectează Săbăreni la Autostrada A0, se prelungește până la DN CB apoi realizează legătura cu Calea Giulești. Costul estimat este de 61.03 mil. EUR fără TVA.
- **DR4 - Nord Express** are o lungime de 12.59 km realizează conexiunea localității Corbeanca la Autostrada A0 apoi se prelungește spre DN CB și Bulevardul Poligrafiei. Costul total estimat este de 86.04 mil.EUR fără TVA.
- **DR5 - Pipera Express** are o lungime de 8.30 km și realizează legătura între Autostrada A0 și localitățile Otopeni - Tunari - DN CB. Costul total estimat este de 61.06 mil. EUR fără TVA.

- **DR6 - Afumați Expres** realizează conexiunea Autostrăzii A0 cu DN2, devenind o variantă de ocolire a localității Afumați. Are o lungime de 4.39 km și un cost total de 28.69 mil.EUR fără TVA.
- **DR7 - Est Expres** are o lungime totală de 6.10 km și conectează localitatea Moara Domnească la Autostrada A0. De asemenea creează legătura municipiului București la autostrada A0 prin Dobroești - Pantelimon - DNCB - A0. Costul estimat al proiectului este de 49.03 mil.EUR fără TVA.
- **DR8 - Splai Expres** cu o lungime de 5.49 km, conectează Autostrada A0 cu municipiul București prin legătura la DNCB și Splaiul Unirii, dar realizează și conexiunea cu zona metropolitană prin nodul Cernica. Costul total estimat este de 30.68 mil. EUR fără TVA.
- **DR9 - Sud Expres** are o lungime de 13.86 km și realizează conexiunea Vidra - Autostrada A0 - DNCB - Bulevardul Metalurgiei / Gara Progresu. Costul estimat este de 81.05 mil. EUR fără TVA.
- **DR10 - Măgurele Expres** realizează legătura Autostrăzii A0 la DNCB - Parc Industrial Măgurele - Prelungirea Ferentari. Are o lungime de 9.62 km și un cost total estimat de 64.41 mil.EUR fără TVA.

De asemenea, în proiectul Orbital București, sunt propuse două noduri rutiere principale, care au rolul de a conecta rețeaua rutieră existentă la Autostrada A0:

- **Nodul rutier 1** realizează conectarea drumul județean DJ 200 la Autostrada A0 pe teritoriul localității Ștefăneștii de Jos; are un cost total estimat de 6 mil.EUR fără TVA.
- **Nodul rutier 2** propus pentru realizarea legăturii între drumul național DN3 cu Autostrada A0 (Pantelimon), reprezentând un nod și extinderea drumului existent (4.32 km); cost total estimat 18.96 mil.EUR fără TVA.

Tabelul 2.1.16. Sinteza costurilor totale necesare pentru implementarea drumurilor radiale

Nr. Crt.	Drum radial/Nod	Conexiuni	Total lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil. EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)
1	DR1 - Vest Expres	Autostrada A0 - DNCB - Bd. Timișoara	8.98	63.10	75.10	7.03
2	DR2 - Autostrada A1	Autostrada A1 (extindere la 3 benzi pe sens între km 10 și km 23)	12.02	36.05	42.90	3.0
3	DR3 - Giulești Expres	Sabareni - Autostrada A0 - DNCB - Calea Giulești	10.37	61.03	72.62	5.89
4	DR4 - Nord Expres	Corbeanca - Autostrada A0 - DNCB - Bdul. Poligrafiei	12.59	86.04	102.39	6.83
5	DR5 - Pipera Expres	Autostrada A0 - Otopeni - Tunari - DNCB	8.30	61.06	72,6	7.36
6	DR6 - Afumați Expres	Autostrada A0 - Varianta de ocolire Afumati - DN2	4.39	28.69	34.14	6.54
7	DR7 - Est Expres	Moara Domnească - Autostrada A0 - DNCB - Pantelimon - Dobroești	6.10	49.03	58.34	8.04
8	DR8 - Splai Expres	DNCB - Splai - A0 - Nod Cernica	5.49	30.68	36.51	5,59
9	DR9 - Sud Expres	Vidra - Autostrada A0 - DNCB - Bd. Metalurgiei / Gara Progresu	13.86	81.05	96.44	5.85
10	DR10 - Măgurele Expres	Autostrada A0 - DNCB - Parc Industrial Măgurele - Prelungirea Ferentari	9.62	64.41	76.65	6.70
11	Nodul rutier 1	Autostrada A0 - DJ 200 (Ștefăneștii de Jos)	0.00	6.00	7.14	6.00

12	Nodul rutier 2	Autostrada A0 - DN3 (Pantelimon)	4.32	18.96	22.56	4.39
TOTAL			96.03	586.10	697.47	7.26

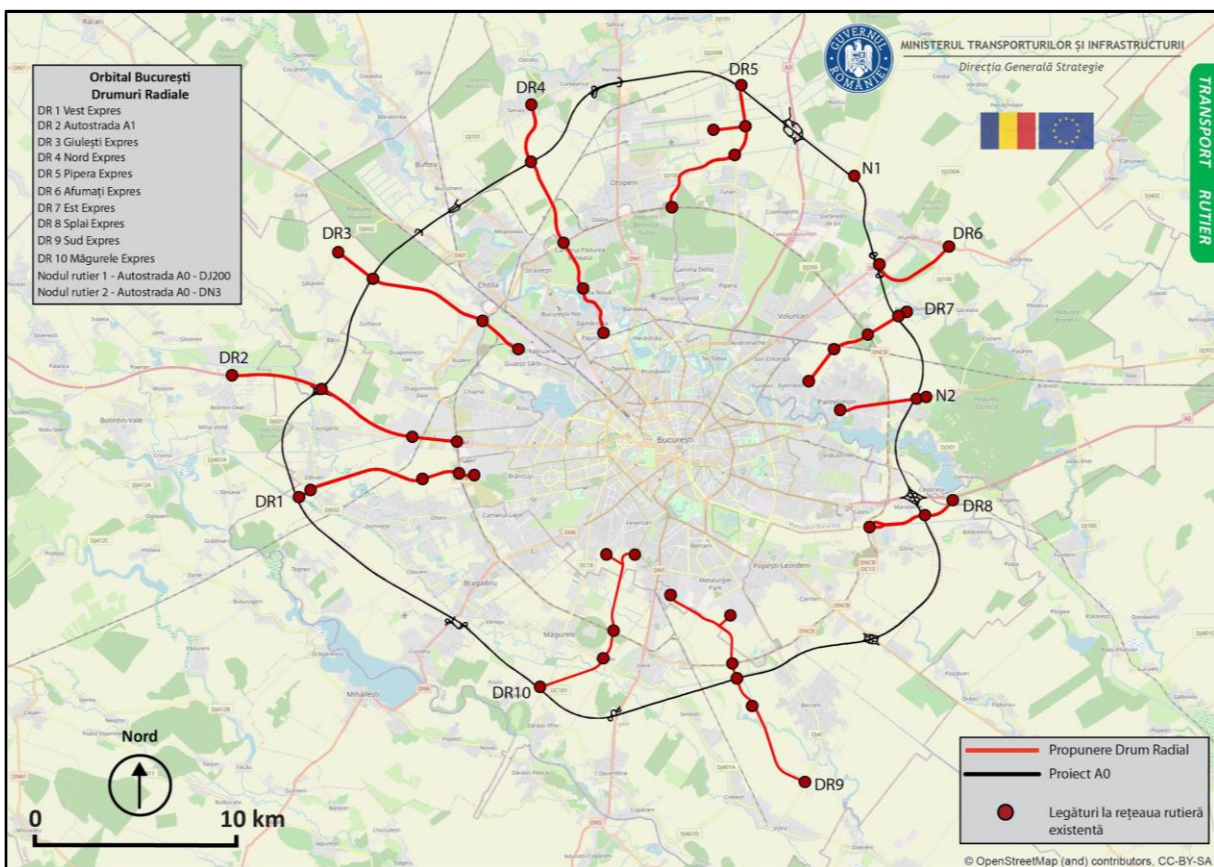


Figura 2.1.9. Harta drumurilor radiale și a nodurilor, parte componentă a proiectului Orbital București

Sectorul rutier – rețeaua secundară

Rețeaua rutieră secundară este complementară rețelei rutiere primare, asigurând legăturile funcționale între aceasta și rețeaua de drumuri naționale și județene (figura 2.1.10). O altă funcție importantă a rețelei rutiere secundare este de alimentare și distribuție, spre și dinspre rețeaua primară, a fluxurilor de trafic, într-o manieră modernă, rapidă și în armonie cu mediul înconjurător și cu politicile europene de conectivitate.

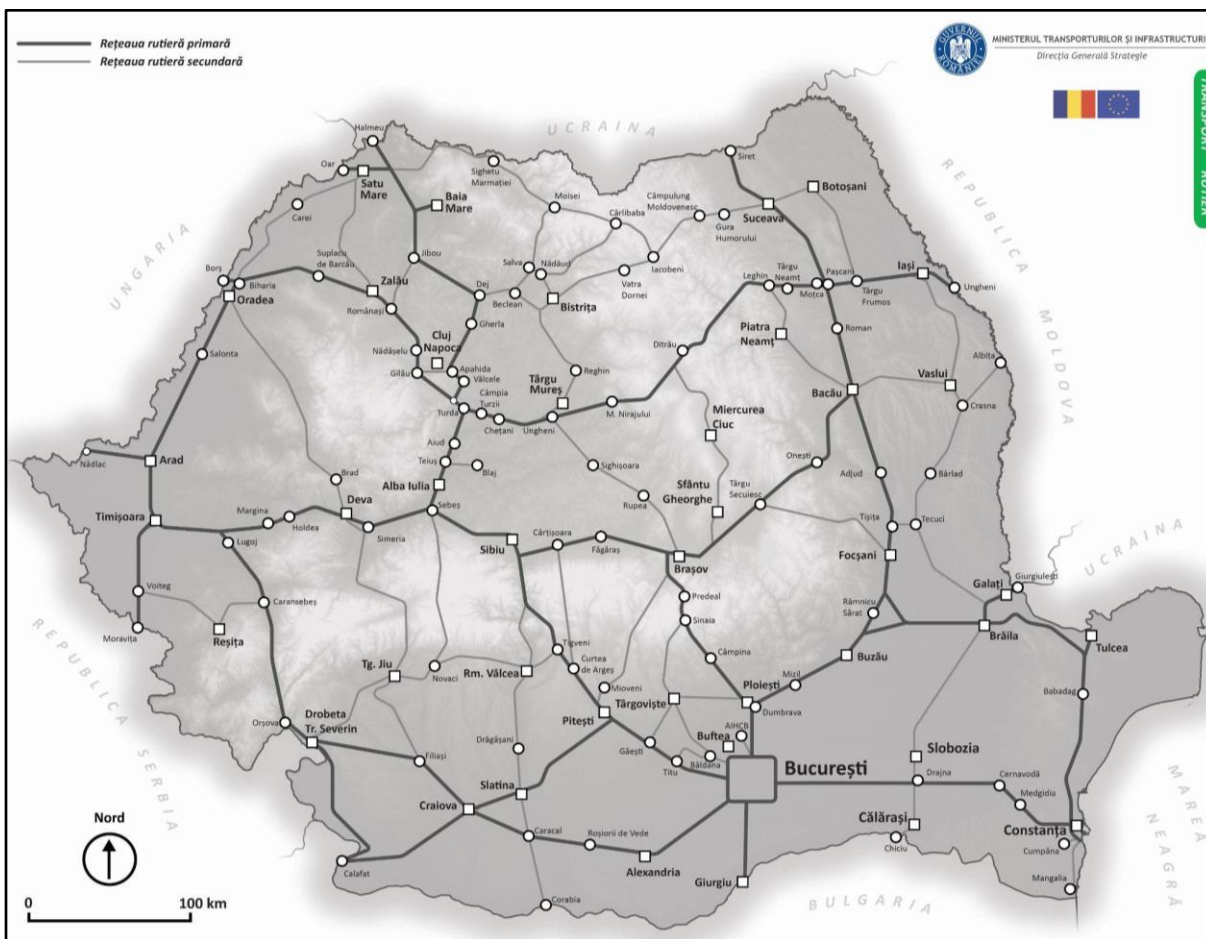


Figura 2.1.10. Harta relației dintre rețeaua rutieră primară și cea secundară

Rețeaua rutieră secundară deservește municipiile reședință de județ (altele decât cele localizate de-a lungul rețelei primare) și asigură conexiunea acestora la rețeaua rutieră primară (figura 2.1.10). Așadar, din totalul de 42 de reședințe de județ din România, 30 se află pe rețeaua rutieră primară, iar restul de 12 se conectează indirect la aceasta, prin intermediul rețelei secundare (tabelul 2.1.17). Putem afirma astfel, că toate municipiile reședință de județ din România sunt conectate direct sau indirect la rețeaua rutieră primară.

De asemenea, rețeaua rutieră secundară poate asigura, la nivel de drum național de tip 1x1 sau 2x2, conexiunea cu rețelele rutiere din statele vecine (ex. Albița – MD și Vama Veche - BG).

Tabelul 2.1.17. Localizarea reședințelor de județ pe rețelele rutiere din România

Nr. Crt.	Reședință de județ	Tip rețea	Nr. Crt.	Reședință de județ	Tip rețea
1	Alba Iulia	Primară	22	Iași	Primară
2	Alexandria	Primară	23	Miercurea Ciuc	Secundară
3	Arad	Primară	24	Oradea	Primară

4	Bacău	Primară	25	Piatra Neamț	Secundară
5	Baia Mare	Primară	26	Pitești	Primară
6	Bistrița	Secundară	27	Ploiești	Primară
7	Botoșani	Secundară	28	Râmnicu Vâlcea	Secundară
8	Brăila	Primară	29	Reșița	Secundară
9	Brașov	Primară	30	Satu Mare	Primară
10	București	Primară	31	Sfântu Gheorghe	Secundară
11	Buftenă	Primară	32	Sibiu	Primară
12	Buzău	Primară	33	Slatina	Primară
13	Călărași	Secundară	34	Slobozia	Secundară
14	Cluj-Napoca	Primară	35	Suceava	Primară
15	Constanța	Primară	36	Târgoviște	Secundară
16	Craiova	Primară	37	Târgu Jiu	Secundară
17	Deva	Primară	38	Târgu Mureș	Primară
18	Dr. Tr. Severin	Primară	39	Timișoara	Primară
19	Focșani	Primară	40	Tulcea	Primară
20	Galați	Primară	41	Vaslui	Secundară
21	Giurgiu	Primară	42	Zalău	Primară
TOTAL					
P	Reședințe de județ localizate pe rețeaua primară			30	
S	Reședințe de județ localizate pe rețeaua secundară			12	

Lista proiectelor rutiere

Lista proiectelor rutiere a fost definită în concordanță cu necesitățile de conectivitatea la nivel național și european, cu coridoarele de conectivitate și cu cele TEN-T, dar și în funcție de rețeaua rutieră primară și secundară.

Așa cum au fost definite mai sus, coridoarele rutiere sunt formate din mai multe sectoare de autostrăzi sau drumuri expres care se află în diverse faze de dezvoltare (în operare, în construcție sau în proiect). În acest plan investițional, realizat în baza analizei detaliate dezvoltate la nivelul MPGT, se face referire doar la proiectele aflate în fazele de construire și cele în fazele de pregătire/proiectare sau în proiect, cele aflate deja în operare fiind excluse din analiză, având rol doar de definire a rețelei în integralitatea ei.

Astfel, a fost stabilită o primă listă de proiecte care aparțin rețelei primare, formată din proiectele aflate în faza de execuție și cele aflate în faza de proiectare. Lista cuprinde 38 de proiecte rutiere de autostrăzi și drumuri expres a căror lungime însumează peste 3170 km (tabelul 2.1.18).

Tabelul 2.1.18. Lista proiectelor localizate pe rețeaua primară

Nr. Crt.	Proiect rețea primară	Rețea TEN-T	Tip proiect conform MPGT	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil. EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)
1	Inel București (Nord) + drumuri radiale	Core	A	145.7	1112.3	1323.6	7.6
2	Inel București (Sud)	Core	A	51.2	507.3	603.7	9.9
3	Pitești - Sibiu	Core	A	122.2	2773.5	3300.4	22.7
4	Holdea - Margina	Core	A	9.0	297.0	353.4	33.0
5	Giurgiu - București	Core	DX	55.2	289.8	344.9	5.3
6	Ploiești - Buzău	Core	A	63.3	635.2	755.9	10.0
7	Buzău - Focșani	Core	A	82.4	797.3	948.8	9.7
8	Focșani - Bacău	Core	A	95.9	998.3	1188.0	10.4
9	Bacău - Pașcani	Core	A	77.4	654.7	779.1	8.5
10	Pașcani - Suceava	Core	A	60.5	423.8	504.3	7.0
11	Suceava - Siret	Core	DX	41.0	215.0	255.9	5.2
12	Sibiu - Brașov	Comprehensive	A	129.6	1479.9	1761.1	11.4
13	ByPass Brasov Nord	Comprehensive	A	19.7	118.2	140.7	6.0
14	Brașov - Bacău	Comprehensive	A	159.9	2364.0	2813.2	14.8
15	Ungheni - Iași - Tg. Neamț	Core	A	134.9	1179.5	1403.6	8.7
16	Tg. Neamț - Tg. Mureș	Core	A	176.9	5403.9	6430.7	30.5
17	Chețani - Câmpia Turzii	Core	A	15.7	58.3	69.4	3.7
18	Nădășelu - Poarta Sălajului	Comprehensive	A	42.0	409.0	486.7	9.7
19	Poarta Sălajului- Biharia	Comprehensive	A	110.0	1057.0	1257.8	9.6
20	București - Alexandria	Core	DX	70.0	367.5	437.3	5.3
21	Alexandria - Craiova	Core	DX	125.0	656.3	780.9	5.3
22	Craiova - Filiași - Dr. Tr. Severin	Comprehensive	DX	104.0	700.5	833.6	6.7
23	Dr. Tr. Severin - Caransebeș - Lugoj	Core	DX	142.0	1533.0	1824.3	10.8
24	Ploiești - Comarnic	Comprehensive	A	48.6	306.8	365.1	6.3
25	Comarnic - Brașov	Comprehensive	A	50.1	1264.9	1505.2	25.2
26	Pitești - Craiova	Comprehensive	DX	121.0	775.1	922.4	6.4
27	Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila	Comprehensive	DX	102.1	464.0	552.2	4.5
28	Brăila - Galați	Comprehensive	DX	11.1	75.5	89.8	4.5
29	Pod peste Dunăre	Comprehensive	DX	2.0	415.8	494.8	207.9
30	Macin - Tulcea (+drum de accesibilitate Delta Dunării) - Constanța	Comprehensive	DX	187.7	904.0	1075.7	4.8
31	Arad - Oradea	Comprehensive	DX	134.0	522.6	621.9	3.9
32	Timișoara - Moravița	Core	DX	88.1	343.6	408.9	3.9
33	Dr. Tr .Severin - Calafat	Core	DX	72.8	283.9	337.8	3.9
34	Craiova - Calafat	Core	DX	78.7	306.9	365.2	3.9

35	A3 - Tureni	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	9.0	65.5	77.9	7.3
36	Cluj-Napoca (Apahida) - Dej	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	75.0	450.0	535.5	7.3
37	Dej - Baia Mare - Halmeu	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	95.2	608.9	724.6	6.2
38	Baia Mare - Satu Mare	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	55.0	259.0	308.2	4.7
39	Satu Mare - Oar	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	10.9	63.4	75.4	5.8
Total				3174.8	31141.1	37057.9	

Dintre cele 34 de proiecte, 16 au fost introduse în categoria proiectelor rutiere din **scenariul de referință**, deoarece se află fie în diverse faze de construcție sau au contractele de lucrări semnate. Aceste proiecte nu vor fi analizate multicriterial și nici nu vor fi prioritizate, implementarea lor fiind deja stabilită. Cele 13 proiecte (11 proiecte de autostradă și două de drum expres) care fac parte din scenariul de referință însumează o lungime de aproximativ 670 km (tabelul 2.1.19).

În cadrul proiectelor cuprinse în scenariul de referință sunt incluse și proiectele de infrastructură rutieră aferente rețelei primare, ce vor fi finanțate prin **Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)**, respectiv:

- Ploiești - Buzău
- Buzău - Focșani
- Focșani - Bacău
- Bacău - Pașcani
- Tg. Mureș - Miercurea Nirajului
- Leghin - Tg. Neamț (Moțca)
- Margina - Holdea
- Nădășelu – Poarta Sălajului

Prioritizarea acestor proiecte pentru a fi finanțate din PNRR a ținut cont inclusiv de gradul de maturitate al acestora.

Tabelul 2.1.19. Lista proiectelor aflate în scenariul de referință, localizate pe rețeaua primară

Nr. Crt.	Proiect rețea primară (scenariu de referință)	Rețea TEN-T	Tip proiect conform MPGT	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu (mil.EUR/ km)
1	Inel București (Sud)	<i>Core</i>	<i>A</i>	51.2	507.3	603.7	9.9
2	Pitești - Sibiu (L1, L4, L5)	<i>Core</i>	<i>A</i>	53.4	926.4	1102.4	17.3
3	Holdea - Margina	<i>Core</i>	<i>A</i>	9.0	297.0	353.4	33.0
4	Ploiești - Buzău	<i>Core</i>	<i>A</i>	63.3	635.2	755.9	10.0
5	Buzău - Focșani	<i>Core</i>	<i>A</i>	82.4	797.3	948.8	9.7
6	Focșani - Bacău	<i>Core</i>	<i>A</i>	95.9	998.3	1188.0	10.4
7	Bacău - Pașcani	<i>Core</i>	<i>A</i>	77.4	654.7	779.1	8.5
8	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Leghin - Moțca)	<i>Core</i>	<i>A</i>	34.0	304.0	361.8	8.9
9	Tg. Mureș - Tg. Neamț (Tg. Mureș)	<i>Core</i>	<i>A</i>	25.0	223.5	266.0	8.9

	- Miercurea Nirajului)						
10	Chețani - Cp. Turzii	Core	A	15.7	58.3	69.4	3.7
11	Nădășelu - Poarta Sălajului	Comprehensive	A	42.0	409.0	486.7	9.7
12	Pitești - Craiova	Comprehensive	DX	121.0	775.1	922.4	6.4
13	Brăila - Galați	Comprehensive	DX	11.1	75.5	89.8	4.5
14	Pod peste Dunăre	Comprehensive	DX	2.0	415.8	494.8	210.6
15	A3 - Tureni	Partial Comprehensive	DX	9.0	65.5	77.9	7.3
16	Satu Mare - Oar	Partial Comprehensive	DX	10.9	63.4	75.4	5.8
	Total			703.3	7206.3	8575.5	

Prin excluderea proiectelor din scenariul de referință din lista proiectelor din rețeaua primară, a rezultat lista proiectelor de pe rețeaua primară analizate multicriterial, care vor fi prioritizate și a căror nevoie de finanțare va fi corelată cu sursele de finanțare disponibile, în cadrul strategiei de implementare. Lista proiectelor rutiere de pe rețeaua primară este compusă din 24 de proiecte care însumează o lungime de peste 2510 km, care aparțin preponderent rețelei TEN-T Core (tabelul 2.1.20).

Tabelul 2.1.20. Lista proiectelor localizate pe rețeaua primară care vor fi prioritizate

Nr. Crt.	Proiect rețea primară (proiecte prioritizate)	Rețea TEN-T	Tip proiect conform MPGT	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil. EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR/km)
1	Inel București (Nord) + drumuri radiale	Core	A	145.7	1112.3	1323.6	7.6
2	Pitești - Sibiu (L2, L3)	Core	A	68.8	1847.0	2198.0	26.8
3	Giurgiu - București	Core	DX	55.2	289.8	344.9	5.3
4	Pașcani - Suceava	Core	A	60.5	423.8	504.3	7.0
5	Suceava - Siret	Core	DX	41.0	215.0	255.9	5.2
6	Sibiu - Brașov	Comprehensive	A	129.6	1479.9	1761.1	11.4
7	ByPass Brașov Nord	Comprehensive	A	19.7	118.2	140.7	6.0
8	Brașov - Bacău	Comprehensive	A	159.9	2364.0	2813.2	14.8
9	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Moțca - Ungheni)	Core	A	100.9	875.5	1041.8	8.7
10	Tg.Mureș - Tg. Neamț (Miercurea Nirajului - Leghin)	Core	A	151.9	5180.4	6164.7	34.1
11	Poarta Sălajului- Biharia	Comprehensive	A	110.0	1057.0	1257.8	9.6
12	București - Alexandria	Core	DX	70.0	367.5	437.3	5.3
13	Alexandria - Craiova	Core	DX	125.0	656.3	780.9	5.3
14	Craiova - Filiași - Dr. Tr .Severin	Comprehensive	DX	104.0	700.5	833.6	6.7
15	Dr. Tr. Severin - Caransebeș - Lugoj	Core	DX	142.0	1533.0	1824.3	10.8
16	Ploiești - Comarnic	Comprehensive	A	48.6	306.8	365.1	6.3
17	Comarnic - Brașov	Comprehensive	A	50.1	1264.9	1505.2	25.2
18	Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila	Comprehensive	DX	102.1	464.0	552.2	4.5
19	Măcin - Tulcea - Constanța	Comprehensive	DX	187.7	904.0	1075.7	4.8

20	Arad - Oradea	<i>Comprehensive</i>	<i>DX</i>	134.0	522.6	621.9	3.9
21	Timișoara - Moravița	<i>Core</i>	<i>DX</i>	88.1	343.6	408.9	3.9
22	Dr.Tr.Severin - Calafat	<i>Core</i>	<i>DX</i>	72.8	283.9	337.8	3.9
23	Craiova - Calafat	<i>Core</i>	<i>DX</i>	78.7	306.9	365.2	3.9
24	Cluj-Napoca (Aphida) - Dej	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	75.0	450.0	535.5	7.3
25	Dej - Baia Mare - Halmeu	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	95.2	608.9	724.6	6.2
26	Baia Mare - Satu Mare	<i>Partial Comprehensive</i>	<i>DX</i>	55.0	259.0	308.2	4.7
	Total			2471.5	23934.8	28482.4	

Astfel, proiectele din rețeaua primară însumează cca 3174.8 km, având o valoare estimată de 31141.1 mil.EUR fără TVA, dintre care 703.3 km reprezintă proiecte din scenariul de referință și 2471.5 km reprezintă proiecte prioritizate (tabelul 2.1.21).

Tabelul 2.1.21. Total proiecte rețeaua primară

Nr. Crt.	Rețea primară	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	Proiect rețea primară (scenariu de referință)	703.3	7206.3	8575.5
2	Proiect rețea primară (proiecte prioritizate)	2471.5	23934.8	28482.4
	Total proiecte rețea primară	3174.8	31141.1	37057.9

Lista proiectelor rutiere de pe rețeaua secundară este compusă din 50 de proiecte de *drumuri expres*, *drumuri transregio* și *drumuri de conectivitate* în lungime de aproximativ 3723 km. Drumurile expres de pe rețeaua secundară nu au caracter major de conectivitate, fie sunt dublate de legături rutiere din rețeaua primară, fie au caracter de „ciot” (tabelul 2.1.22).

Tabelul 2.1.22. Lista proiectelor localizate pe rețeaua secundară - drumuri expres -

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (Drumuri Expres)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR/km)
1	A3 - Aeroport Henri Coandă - DN1	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	9.0	43.1	51.3	4.8
2	DX4 - Dej - Bistrița	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	55.6	266.4	317.0	4.8
3	A7 - Suceava - Botoșani	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	26.0	124.5	148.2	4.8
4	A7 - Bacău - Piatra Neamț	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	61.0	239.1	284.5	3.9
5	A1 - Pitești - Mioveni	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	9.2	42.0	50.0	4.6
	Mioveni - Câmpulung - Brașov - A3	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	114.8	1182.1	1406.7	10.3
6	A1 - Găești - Târgoviște - Ploiești - A3	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	74.2	348.2	414.4	4.7
7	A0 - București - Târgoviște	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	59.5	312.4	371.8	5.3

8	Alternativa Techirghiol (A2/A4 - Olimp)	<i>Drum Expres nou (2+2)</i>	27.5	129.1	153.6	4.7
	Total drumuri expres cu valoare socio-economică	8 proiecte	322.0	1504.8	1790.8	
	Total drumuri expres	1 proiect	114.8	1182.1	1406.7	
	Total general	9 proiecte	436.8	2686.9	3197.4	

Drumurile de conectivitate, în număr de 17 proiecte, însumează aproximativ 558 km.

Proiectele de drumurile TransRegio sunt în număr de 24 și însumează o lungime de aproximativ 2728 km (tabelul 2.1.23).

**Tabelul 2.1.23. Lista proiectelor localizate pe rețeaua secundară
- drumuri de conectivitate și transregio -**

Nr. Crt.	Proiect rețea secundară (drumuri transregio)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	Hunedoara - Sântuhalm - A1(profil 2+2)	<i>Drum nou de legătură la rețeaua primară și modernizare drum existent</i>	13.0	32.8	39.0
2	A8 - Lețcani Vest - Centura Iași (profil 2+2)	<i>Drum nou de legătură la rețeaua primară</i>	8.8	43.7	52.0
3	Blaj - Teiuș - A10 (profil 1+1)	<i>Modernizare DN14B + poduri (peste CF M200 - Teiuș și CF M300 - Crăciunel)</i>	23.7	25.8	30.7
4	DX - Centura Craiova Est (profil 2+2)	<i>Drum nou de legătură la rețeaua primară</i>	4.3	18.8	22.4
5	A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)	<i>Drum nou de legătură la rețeaua primară</i>	7.7	22.3	26.5
6	DX4 - Jibou - Românași - A3 (profil 2+2)	<i>Drum nou de legătură între A3 și DX4</i>	20.5	61.5	73.2
7	Slobozia - Drajna - A2 (profil 2+2)	<i>Modernizare, extindere la 4 benzi + pod peste CF M800 Drajna și creșterea siguranței</i>	16.9	16.9	20.1
8	Călărași - Drajna Nouă - A2 (profil 1+1)	<i>Modernizare și creșterea siguranței</i>	22.0	11.0	13.1
	Brăila - Slobozia	<i>Modernizare</i>	103.2	43.2	51.3
9	Reșița - Caransebeș - DX2 (profil 1+1)	<i>Modernizare și creșterea siguranței</i>	41.8	28.9	34.3
	Reșița - Voiteg - A9	<i>Modernizare</i>	62.2	33.7	40.1
10	Vaslui - Iași - A8 (profil 1+1)	<i>Modernizare și creșterea siguranței</i>	85.9	85.9	102.3
	Vaslui - Bacău - A7	<i>Modernizare</i>	65.1	43.6	51.9
11	Miercurea Ciuc - Sf. Gheorghe - Chichiș - A13 (profil 1+1)	<i>Modernizare și creșterea siguranței</i>	73.8	39.9	47.4
	A8 - Ditrău - Gheorghieni - Miercurea Ciuc	<i>Modernizare</i>	73.2	39.2	46.7
12	Rm. Vâlcea - Tigveni - A1 (profil 2+2, 2+1, 1+1)	<i>Modernizare, extindere parțială și creșterea siguranței</i>	20.4	30.6	36.4
	Rm. Vâlcea - Căinenii Mari - A1	<i>Modernizare</i>	39.2	28.6	34.1
13	Tg. Jiu - Filiași - DX2 (profil 2+2)	<i>Modernizare și creșterea siguranței</i>	70.9	106.4	126.6
	A1 - Simeria - Petroșani - Tg. Jiu	<i>Modernizare</i>	155.1	101.1	120.2

14	Centura Metropolitană Cluj-Napoca (Gilău - A3 - Cluj-Napoca - Apahida - DX4) (profil 2+2)	Drum nou + drumuri de legătură	63.0	580.7	691.0
15	A1 - Titu - Bâldana - DX9	Modernizare	30.3	30.3	36.1
16	DX 9 - Târgoviște - Sinaia - A3	Modernizare	51.7	43.4	51.6
17	A4 Cumpăna - DN39 Constanța	Modernizare drum existent, extindere la 4 benzi și conexiune la noul nod rutier de pe A4	3.4	5.1	6.0
	DX12 - Olimp - Mangalia - Vama Veche (BG)	Modernizare	20.9	15.7	18.7
	DX - Botoșani - Tg.Frumos - A8	Modernizare	71.5	36.5	43.4
	Vaslui - Galați - DX (+ Tișița)	Modernizare	199.0	99.5	118.4
	Corabia - Rm. Vâlcea	Modernizare	152.0	76.0	90.4
	Beclean (Bistrița) - Salva - Moisei - Cârlibaba	Modernizare	203.0	165.5	196.9
	A3 - Oradea - Satu Mare - DX4	Modernizare	137.0	68.5	81.5
	Sărățel - Tg. Mureș - A8/A3	Modernizare	78.0	44.0	52.4
	A7 - Focșani - Tg. Secuiesc - A13	Modernizare	114.0	80.3	95.6
	A7 - Piatra Neamț - Tg. Neamț	Modernizare	35.0	19.1	22.7
	A3 - Zalău - Satu Mare - DX4	Modernizare	95.0	49.3	58.7
	A7 - Suceava - Bistrița	Modernizare	178.0	124.9	148.6
	Iacobeni - Borșa - Negrești Oaș	Modernizare	235.0	129.1	153.6
	DX6 - Dr.Tr.Severin - Tg.Jiu - Rm.Vâlcea	Modernizare	185.0	99.3	118.2
	A1 - Deva - Oradea - A3	Modernizare	94.4	54.5	64.9
	Transfăgărășan	Modernizare	91.0	32.0	38.1
	Transalpina	Modernizare	131.0	46.1	54.9
	Crasna - Albița (MD)	Modernizare	50.0	27.0	32.1
	A3/A13 - Brașov - Sighișoara - Tg. Mureș - A3/A8	Modernizare	161.0	120.8	143.7
	Total drumuri de conectivitate	17 proiecte	558.1	1183.8	1408.8
	Total drumuri drumuri transregio	24 proiecte	2728.7	1577.5	1877.2
	Total general	41 proiecte	3286.8	2761.3	3286.0

Variantele de ocolire

Variantele de ocolire asigură tranzitul facil al vehiculelor evitând localitățile și are beneficii directe atât pentru transportul persoanelor și al mărfurilor cât și pentru îmbunătățirea calității vieții comunităților din localitățile pentru care se realizează variantele de ocolire.

Toate aceste variante de ocolire au fost identificate cu ajutorul Modelului Național de Transport în cadrul Master Planului General de Transport și nu au fost implementate până în anul 2021.

Proiectele de variante de ocolire sunt în număr de 24 și însumează o lungime de 217.1 km. Costul estimat pentru realizarea acestor proiecte este de 574 mil. EUR fără TVA și 683.1 mil. EUR cu TVA inclus, iar costul mediu pe km fiind de 2.6 mil. EUR (tabelul 2.1.24).

Tabelul 2.1.24. Lista proiectelor de variante de ocolire

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (variante de ocolire)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)
1	VO Sibiu Sud	drum nou la profil 2+2	22.5	54.0	64.3	2.4
2	VO Rm. Vâlcea	drum nou la profil 2+2	15.9	70.1	83.4	4.4
3	VO Giurgiu	drum nou la profil 2+2	12.1	29.0	34.6	2.4
4	VO Bistrița	drum nou la profil 2+2	15.0	36.0	42.8	2.4
5	VO Vaslui	drum nou la profil 1+1	14.9	26.8	31.9	1.8
6	VO Mediaș	drum nou la profil 1+1	8.5	20.4	24.3	2.4
7	VO Botoșani	drum nou la profil 1+1	8.9	21.4	25.5	2.4
8	VO Piatra Neamț	drum nou la profil 1+1	8.1	19.4	23.1	2.4
9	VO Zalău	drum nou la profil 1+1	8.3	19.8	23.6	2.4
10	VO Slobozia	drum nou la profil 1+1	7.7	13.9	16.5	1.8
11	VO Câmpulung	drum nou la profil 2+2	7.8	18.8	22.3	2.4
12	VO Gura Humorului	drum nou la profil 2+2	4.7	11.3	13.4	2.4
13	VO Sfântu Gheorghe	drum nou la profil 1+1	7.7	13.9	16.5	1.8
14	VO Frasin	drum nou la profil 2+2	4.9	11.8	14.0	2.4
15	VO Miercurea Ciuc	drum nou la profil 1+1	7.4	13.3	15.9	1.8
16	VO Băbeni	drum nou la profil 1+1	4.5	8.0	9.5	1.8
17	VO Câmpulung Moldovenesc	drum nou la profil 2+2	11.9	28.5	34.0	2.4
18	VO Sighișoara	drum nou la profil 1+1	9.0	21.5	25.6	2.4
19	VO Pucioasa	drum nou la profil 1+1	5.4	13.0	15.5	2.4
20	VO Vatra Dornei	drum nou la profil 2+2	3.8	31.2	37.1	8.2
21	VO Mangalia	drum nou la profil 1+1	6.2	11.2	13.3	1.8
22	VO Tg. Mureș	drum nou la profil 1+1	11.6	62.0	73.8	1.8
23	VO Sebeș	drum nou la profil 1+1	3.4	6.1	7.3	1.8
24	VO Valea lui Mihai	drum nou la profil 1+1	7.0	12.6	15.0	1.8
	Total variante de ocolire	24 proiecte	217.1	574.0	683.1	2.6

Față de variantele ocolitoare de sine stătătoare (tabelul 2.1.24), mai jos se regăsește o listă a variantelor ocolitoare regionale (tabelul 2.1.25) care sunt părți componente ale proiectelor de infrastructură rutieră transregio. Aceste variante de ocolire regionale au fost stabilite și prioritizate în funcție de trei criterii importante:

- valorile de trafic medii și maxime ale drumurilor transregio
- populația localității intersectate de drumul transregio
- cifra de afaceri a zonei de deservire

Proiectele de variante de ocolire regionale sunt în număr de 37 și însumează o lungime de 263.4 km. Costul estimat pentru aceste proiecte este de 745.4 mil. EUR fără TVA și 887 mil. EUR cu TVA inclus, iar costul mediu pe km estimat fiind de 2.8 mil. EUR (tabelul 2.1.25).

Atât variante de ocolire propriu-zise cât și cele regionale au ca principale două obiective:

- a) creșterea calității vieții locuitorilor localităților tranzitate de drumurile transregio (scăderea noxelor, scăderea poluării fonice, scădere congestiei în traficul local);
- b) creșterea fluidității traficului rutier și eliminarea congestiilor rutiere pentru traficul de lung parcurs

Tabelul 2.1.25. Lista proiectelor de variante de ocolire regionale

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (Variante de ocolire regionale)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mi.EUR fără TVA)	Cost est.mat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu (mil.EUR/ km)
1	VO Arad (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	11.0	29.5	35.1	2.7
2	VO Baia Mare (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	10.3	29.9	35.6	2.9
3	VO Curtea de Argeș (Reg. Dezvoltare S)	drum nou la profil 1+1	7.8	25.7	30.6	3.3
4	VO Reșița (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	7.2	22.6	26.9	3.1
5	VO Călărași (Reg. Dezvoltare S)	drum nou la profil 1+1	5.1	9.8	11.7	1.9
6	VO Petroșani (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 2+2	10.5	64.3	76.5	6.1
7	VO Buftea (Reg. Dezvoltare BI)	drum nou la profil 1+1	10.3	17.8	21.2	1.7
8	VO Cosmești (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	3.7	5.8	6.9	1.6
9	VO Reghin (Reg. Dezvoltare C)	drum nou la profil 1+1	4.7	10.2	12.1	2.2
10	VO Sînmartin/Băile Felix (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 2+2	7.2	34.8	41.4	4.8
11	VO Liești/Ivesti (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	14.4	23.8	28.3	1.7
12	VO Drăgășani (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	10.0	16.0	19.0	1.6
13	VO Păltinoasa (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 1+1	0.3	3.0	3.6	10.0
14	VO Brad (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	6.4	23.4	27.8	3.7
15	VO Sighetu Marmației (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	16.4	41.1	48.9	2.5
16	VO Hîrlău (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 1+1	5.2	17.8	21.2	3.4
17	VO Huși (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 2+2	12.3	77.3	92.0	6.3
18	VO Flămânzi (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 1+1	7.0	12.4	14.8	1.8
19	VO Gheorgheni (Reg. Dezvoltare C)	drum nou la profil 1+1	6.8	15.8	18.8	2.3
20	VO Motru (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	1.7	5.5	6.5	3.2
21	VO Văleni (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 2+2	5.3	15.6	18.6	2.9
22	VO Bălești (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	5.5	10.9	13.0	2.0
23	VO Bumbești-Jiu (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	3.8	7.0	8.3	1.8
24	VO Viziru (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	4.2	6.1	7.3	1.5
25	VO Bocșa (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	12.9	40.4	48.1	3.1
26	VO Horezu (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	4.6	11.7	13.9	2.5
27	VO Negrești-Oaș (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	9.6	19.3	23.0	2.0
28	VO Năsăud (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	4.7	9.8	11.7	2.1
29	VO Tăuții-Măgherauș (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 2+2	9.3	34.3	40.8	3.7
30	VO Corabia (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	10.8	18.5	22.0	1.7
31	VO Feldioara (Reg. Dezvoltare C)	drum nou la profil 2+2	2.5	8.3	9.9	3.3
32	VO Ardud (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	4.9	10.1	12.0	2.1

33	VO Fieni (Reg. Dezvoltare S)	<i>drum nou la profil 1+1</i>	5.1	17.6	20.9	3.5
34	VO Sîngeorz-Băi (Reg. Dezvoltare NV)	<i>drum nou la profil 1+1</i>	3.9	18.5	22.0	4.7
35	VO Vidra (Reg. Dezvoltare SE)	<i>drum nou la profil 1+1</i>	5.7	12.2	14.5	2.1
36	VO Tudor Vladimirescu (Reg. Dezvoltare SE)	<i>drum nou la profil 1+1</i>	6.7	9.6	11.4	1.4
37	VO Odobești (Reg. Dezvoltare S)	<i>drum nou la profil 1+1</i>	5.6	9.0	10.7	1.6
	Total variante de ocolire regionale	37 proiecte	263.4	745.4	887.0	2.8

Proiectele de variantele de ocolire regionale propuse pentru a fi implementate sunt în proximitatea localităților care nu sunt deservite de drumuri de mare viteză (autostrăzile și drumurile expres asigură tranzitul rutier pentru toate localitățile prin vecinătatea cărora sunt proiectate), vezi figura 2.1.11.

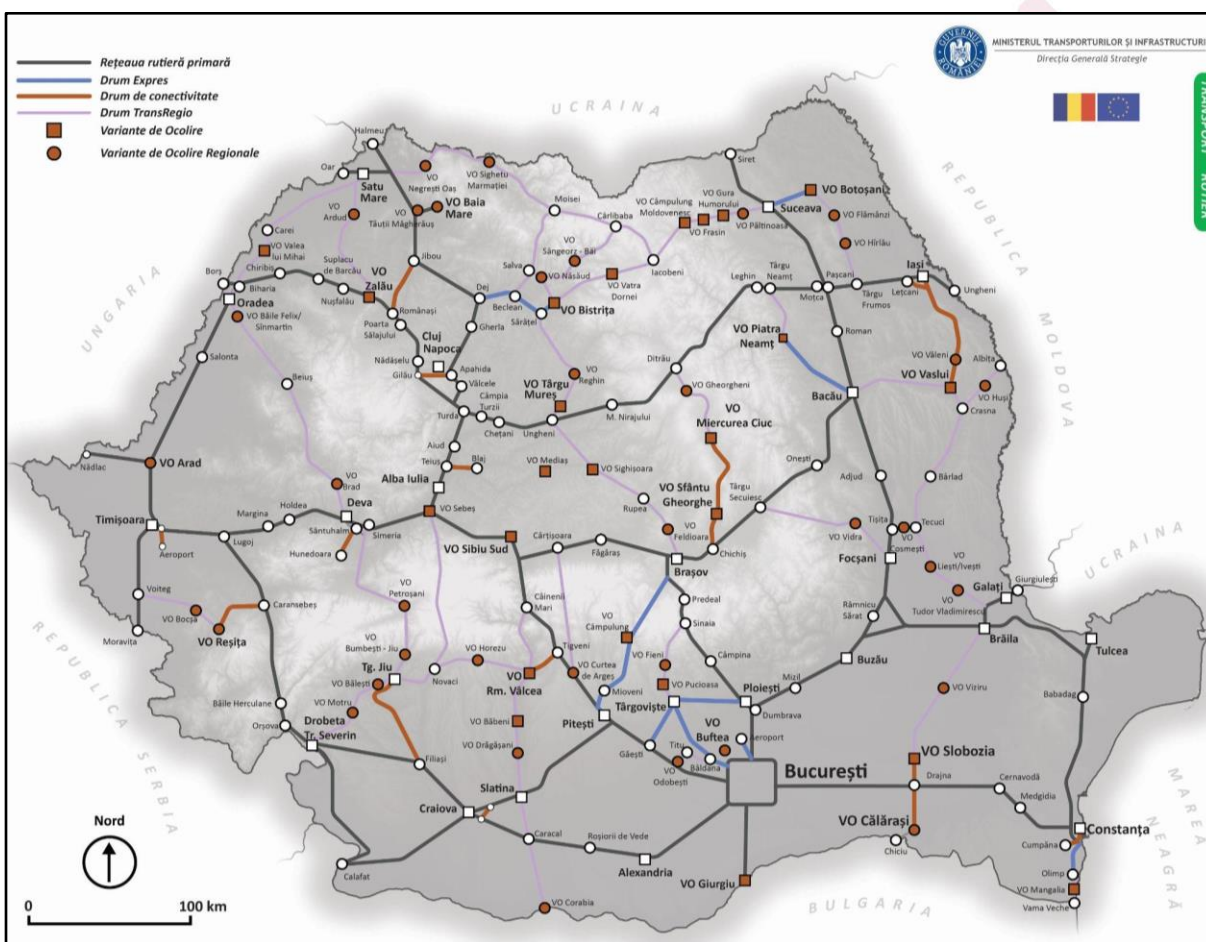


Figura 2.1.11. Harta proiectelor de pe rețeaua rutieră secundară

Astfel, proiectele din rețeaua secundară însumează o lungime de aproximativ 4204 km, având o valoare estimată de 6767.6 mil. EUR fără TVA și reprezintă proiecte prioritizate (tabelul 2.1.26).

Tabelul 2.1.26. Total proiecte rețeaua secundară

Nr. Crt.	Proiect rețea secundară	Proiecte	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)
1	Total drumuri expres	9 proiecte	436.8	2686.9	3197.4	6.2
2	Total transregio	41 proiecte	3286.8	2761.3	3286.0	0.8
3	Total variante de ocolire	24 proiecte	217.1	574.0	683.1	2.6
4	Total variante de ocolire regionale	37 proiecte	263.4	745.4	887.0	2.8
	Total general proiecte rețeaua secundară	111 proiecte	4204.1	6767.6	8053.5	

Ierarhizarea și prioritizarea proiectelor rutiere

Prioritizarea proiectelor reprezintă un pas important în definirea programului de investiții, dată fiind situația în care investițiile necesare identificate, depășesc semnificativ bugetul disponibil. Astfel, este necesară ierarhizarea proiectelor potrivit unui set de criterii de evaluare predefinite, care să asigure un proces de prioritarizare corect și neutru, elaborat pe baze independente și științifice. Adăugarea limitărilor de finanțare la lista de proiecte ierarhizate va avea ca rezultat obținerea strategiei de implementare.

Obiectivele suplimentare aferente noii perioade de programare sunt:

- Reducerea emisiilor în conformitate cu țintele asumate prin actuala politică a Comisiei Europene (Pactul Ecologic European, Fit for 55);
- Dubla utilizare a infrastructurii de transport: construirea sau dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie să permită, în mod continuu, indiferent de condițiile meteorologice, asigurarea fluxurilor de transport, atât pentru pasageri și mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară și transportul echipamentelor aferente acestora;
- Maturitatea pregătirii proiectelor: probabilitatea de a fi implementate în mod real până în anul 2030.

METODOLOGIA DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR DE PE REȚEAUA PRIMARĂ

Metodologia analizei multicriteriale (AMC) pentru proiectele rețelei primare se bazează pe următoarele criterii (tabelul 2.1.27):

1. **Eficiență economică** – 35%
2. **Reducerea emisiilor de carbon** – 20%
3. **Conectivitate strategică** – 25%
4. **Utilizarea duală a infrastructurii** – 15%;
5. **Maturitatea pregătirii proiectului** – 5%

Tabelul 2.1.27. Metodologia de evaluare a rețelei primare - sintetizarea fiecărui criteriu:

Nr. Crt.	Obiectiv	Pondere	Criteriu de evaluare	Modul de punctare
1	Eficiență economică	35%	Pe baza ratei interne de rentabilitate economică (RIRE) a	Au fost alocate 35 puncte pentru proiectul cu valoarea EIRR cea mai mare (Pitești – Sibiu – EIRR 24.75). Pentru valorile

			proiectului	intermediare între zero și 35, punctajul a fost alocat proporțional
2	Reducerea emisiilor de carbon	20%	Pe baza contribuției proiectului la ținta națională de reducere a emisiilor cu efect de seră	20 de puncte pentru proiectul care contribuie cel mai mult la reducerea emisiilor de carbon. Punctaj între 0 și 20 proporțional cu contribuția la ținta de reducere a emisiilor, raportat la proiectul cu cel mai mare punctaj
3	Conectivitatea strategică	25%	În funcție de apartenența la rețeaua națională primară/secundară, TEN-T sau alte rețele	25 puncte pentru proiectele rutiere de pe rețea primară 10 puncte pentru proiectele rutiere de pe rețea secundară 0 puncte pentru proiectele rutiere de pe alte rețele
4	Utilizarea duală a infrastructurii	15%	Pe baza importanței pentru mobilitatea militară pe teritoriul României	15 puncte pentru proiectele de mobilitate militară de prioritate 1 10 puncte pentru proiectele de mobilitate militară de prioritate 2 5 puncte pentru proiectele de mobilitate militară de prioritate 3 0 puncte pentru proiectele de mobilitate militară neprioritare
5	Maturitatea pregătirii proiectului	5%	Pe baza stadiului de pregătire a proiectului	5 puncte pentru proiectele aflate în pregătire 0 puncte pentru proiectele pentru care nu a început pregătirea

Strategia de prioritizare a proiectelor s-a realizat în concordanță cu metodologia agreată cu Comisia Europeană, similară cu cea din Master Planul General de Transport al României. În fapt, considerăm astfel, că se va realiza o actualizare a strategiei de implementare în baza aceluiași priorități de conectivitate identificate în documentul strategic de programare a investițiilor în transport.

Lista de proiecte, după aplicarea criteriilor de mai sus, este structurată în funcție de stadiul proiectelor. Astfel, investițiile care vor face parte din strategia de implementare vor fi reprezentate de:

- **proiecte aflate în faza de execuție** (lucrări care vor fi făcute și finalizate în următorul cadru financiar);
- **proiecte lansate spre a fi implementate** (achiziție publică demarată pentru realizare documentație tehnico-economic sau pentru execuție);
- **proiecte din lista prioritizată.**

Pentru identificarea proiectelor care se află în fază de execuție / lansate spre implementare, precum și a impactului asupra necesarului de finanțare în perioada 2020-2030 s-a utilizat modulul de predicție aferent programului ITtool, folosit de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, pentru managementul fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Astfel, metodologia de evaluare a criteriilor, respectiv prioritizarea a fost realizată asupra 26 de proiecte care însumează un total de 2471.5 km și un cost total estimat de 23934.8 mil. EUR (tabelul 2.1.28).

Tabelul 2.1.28. Metodologia de prioritizare a proiectelor care aparțin rețelei rutiere

Nr. Crt.	Proiect	Tip proiect	Denumire proiect	Indicativ	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Lungime (km)	Eficiență economică		Reducerea emisiilor de carbon		Conectivitatea strategică		Utilizarea duală		Maturitatea pregătirii proiectului		Punctaj
							Scor EIRR (%)	Punctaj EIRR	Valoare emisii de carbon (kt)	Punctaj emisii de carbon	Apartene nța rețea	Punctaj rețea	Prioritate NATO - MAPN	Punctaj prioritate NATO - MAPN	Stadiu pregatir e proiect	Punctaj pregatire proiect	
							35%		20%		25%		15%		5%		
1	Inel București (Nord) + drumuri radiale	A	Orbital Bucuresti (N)	A0	1112.3	145.7	12.05	17.17	-1,883.62	8.01	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	70.18
2	Pitești - Sibiu (L2, L3)	A	Autostrada Transcarpati	A1	1847.0	68.8	24.57	35.00	1,708.07	20.00	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	100.00
3	Giurgiu - Bucuresti	DX	Drumul Siretului	DX7	289.8	55.2	18.65	26.57	-343.48	13.15	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	79.72
4	Pașcani - Suceava	A	Drumul Siretului	A7	423.8	60.5	9.91	14.12	-844.82	11.48	Primara	25.00	Prioritatea 2	10.00	Contract	5.00	65.60
5	Suceava - Siret	DX	Drumul Siretului	DX7	215.0	41.0	9.91	14.12	-844.82	11.48	Primara	25.00	Prioritatea 2	10.00	Contract	5.00	65.60
6	Sibiu - Brasov	A	Autostrada Transilvania	A3	1479.9	129.6	16.19	23.06	-1,590.56	8.99	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	77.05
7	ByPass Brasov Nord	A	ByPass Brasov Nord	A13	118.2	19.7	8.00	11.40	-1,439.64	9.49	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	65.89
8	Brasov - Bacau	A	Autostrada Moldova	A13	2364.0	159.9	8.00	11.40	-1,439.64	9.49	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	65.89
9	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Moțca - Ungheni)	A	Autostrada Montana	A8	875.5	100.9	6.90	9.83	-669.12	12.07	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	66.89
10	Tg.Mureș - Tg. Neamț (Miercurea Nirajului - Leghin)	A	Autostrada Montana	A8	5180.4	151.9	6.72	9.57	-1,423.08	9.55	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	64.12
11	Poarta Sălajului- Biharia	A	Autostrada Transilvania	A3	1057.0	110.0	18.31	26.08	-1,473.50	9.38	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	80.46
12	București - Alexandria	DX	Danubius Expres	DX6	367.5	70.0	13.22	18.83	-614.56	12.25	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	71.08
13	Alexandria - Craiova	DX	Danubius Expres	DX6	656.3	125.0	13.22	18.83	-614.56	12.25	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	71.08
14	Craiova - Filiasi - Dr.Tr.Severin	DX	Danubius Expres	DX6	700.5	104.0	9.97	14.20	-2,397.40	6.30	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	60.50

15	<i>Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj</i>	<i>DX</i>	<i>Danubius Expres</i>	<i>DX6</i>	1533.0	142.0	8.15	11.61	-1,684.47	8.68	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	60.29
16	<i>Ploiesti - Comarnic</i>	<i>A</i>	<i>Autostrada zăpezii</i>	<i>A3</i>	306.8	48.6	19.29	27.48	-830.34	11.53	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	84.01
17	<i>Comarnic - Brasov</i>	<i>A</i>	<i>Autostrada zăpezii</i>	<i>A3</i>	1264.9	50.1	15.73	22.41	245.16	15.12	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	82.52
18	<i>Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila</i>	<i>DX</i>	<i>Muntenia Expres</i>	<i>DX3</i>	464.0	102.1	15.12	21.54	-1,182.83	10.35	Primara	25.00	Prioritatea 2	10.00	Contract	5.00	71.89
19	<i>Macin - Tulcea (+drum de accesibilitate Delta Dunării) - Constanta</i>	<i>DX</i>	<i>Dobrogea Expres</i>	<i>DX8</i>	904.0	187.7	1.22	1.74	-739.45	11.83	Primara	25.00	Prioritatea 2	10.00	Contract	5.00	53.57
20	<i>Arad - Oradea</i>	<i>DX</i>	<i>Drumul Crișurilor</i>	<i>DX11</i>	522.6	134.0	15.36	21.88	-1,422.81	9.55	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	76.43
21	<i>Timișoara - Moravița</i>	<i>DX</i>	<i>Autostrada Banat</i>	<i>A9</i>	343.6	88.1	7.92	11.28	-458.44	12.77	Primara	25.00	Neprioritar	0.00	Contract	5.00	54.05
22	<i>Dr.Tr.Severin - Calafat</i>	<i>DX</i>	<i>Tracia Expres</i>	<i>DX1</i>	283.9	72.8	8.15	11.61	-1,684.47	8.68	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	60.29
23	<i>Craiova - Calafat</i>	<i>DX</i>	<i>Tracia Expres</i>	<i>DX2</i>	306.9	78.7	9.97	14.20	-2,397.40	6.30	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	PI	0.00	60.50
24	<i>Cluj Napoca (Apahida) - Dej</i>	<i>DX</i>	<i>Drumul Someșului</i>	<i>DX4</i>	450.0	75.0	18.84	26.84	-4,283.96	0.00	Primara	25.00	Neprioritar	0.00	PI	0.00	51.84
25	<i>Dej - Baia Mare - Halmeu</i>	<i>DX</i>	<i>Drumul Someșului</i>	<i>DX5</i>	608.9	95.2	18.84	26.84	-4,283.96	0.00	Primara	25.00	Neprioritar	0.00	PI	0.00	51.84
26	<i>Baia Mare - Satu Mare</i>	<i>DX</i>	<i>Drumul Someșului</i>	<i>DX5</i>	259.0	55.0	18.84	26.84	-4,283.96	0.00	Primara	25.00	Neprioritar	0.00	PI	0.00	51.84
	Total drumuri de mare viteză				23934.8	2471.5											

În urma prioritizării s-a realizat o ierarhizare a celor 26 de proiecte în funcție de punctajul obținut (tabel 2.1.29). Se identifică faptul că proiectul de autostradă Pitești - Sibiu (Lotul 2 și Lotul 3) are cel mai mare punctaj (100 puncte) în urma prioritizării, având o lungime de 68.8 km și un cost estimat de 1847 mil.EUR fără TVA. Pe de altă parte, proiectele de drum expres Baia Mare - Satu Mare, Cluj-Napoca (Apahida) - Dej și Dej - Baia Mare - Halmeu au obținut un punctaj de 51.84 puncte și se află pe ultimul loc în lista ierarhizată.

Tabelul 2.1.29. Lista proiecte prioritizate și ierarhizate

Nr. Crt.	Proiect	Tip proiect	Denumire proiect	Indicativ	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Punctaj
1	<i>Pitești - Sibiu (L2, L3)</i>	A	<i>Autostrada Transcarpați</i>	A1	68.8	1847.0	100.00
2	<i>Ploiesti - Comarnic</i>	A	<i>Autostrada zăpezii</i>	A3	48.6	306.8	84.01
3	<i>Comarnic - Brasov</i>	A	<i>Autostrada zăpezii</i>	A3	50.1	1264.9	82.52
4	<i>Poarta Sălajului- Biharia</i>	A	<i>Autostrada Transilvania</i>	A3	110.0	1057.0	80.46
5	<i>Giurgiu - Bucuresti</i>	DX	<i>Drumul Siretului</i>	DX7	55.2	289.8	79.72
6	<i>Sibiu - Brasov</i>	A	<i>Autostrada Transilvania</i>	A3	129.6	1479.9	77.05
7	<i>Arad - Oradea</i>	DX	<i>Drumul Crișurilor</i>	DX11	134.0	522.6	76.43
8	<i>Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila</i>	DX	<i>Muntenia Expres</i>	DX3	102.1	464.0	71.89
9	<i>București - Alexandria</i>	DX	<i>Danubius Expres</i>	DX6	70.0	367.5	71.08
10	<i>Alexandria - Craiova</i>	DX	<i>Danubius Expres</i>	DX6	125.0	656.3	71.08
11	<i>Inel București (Nord) + drumuri radiale</i>	A	<i>Orbital Bucuresti (N)</i>	A0	145.7	1112.3	70.18
12	<i>Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Moțca - Ungheni)</i>	A	<i>Autostrada Montana</i>	A8	100.9	875.5	66.89
13	<i>ByPass Brasov Nord</i>	A	<i>ByPass Brasov Nord</i>	A13	19.7	118.2	65.89
14	<i>Brasov - Bacau</i>	A	<i>Autostrada Moldova</i>	A13	159.9	2364.0	65.89
15	<i>Pașcani - Suceava</i>	A	<i>Drumul Siretului</i>	A7	60.5	423.8	65.60
16	<i>Suceava - Siret</i>	DX	<i>Drumul Siretului</i>	DX7	41.0	215.0	65.60
17	<i>Tg.Mureș - Tg. Neamț (Miercurea Nirajului - Leghin)</i>	A	<i>Autostrada Montana</i>	A8	151.9	5180.4	64.12
18	<i>Craiova - Filiași - Dr.Tr.Severin</i>	DX	<i>Danubius Expres</i>	DX6	104.0	700.5	60.50
19	<i>Craiova - Calafat</i>	DX	<i>Tracia Expres</i>	DX2	78.7	306.9	60.50
20	<i>Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj</i>	DX	<i>Danubius Expres</i>	DX6	142.0	1533.0	60.29
21	<i>Dr.Tr.Severin - Calafat</i>	DX	<i>Tracia Expres</i>	DX1	72.8	283.9	60.29
22	<i>Timișoara - Moravița</i>	DX	<i>Autostrada Banat</i>	A9	88.1	343.6	54.05
23	<i>Macin - Tulcea (+drum de accesibilitate Delta Dunării) - Constanta</i>	DX	<i>Dobrogea Expres</i>	DX8	187.7	904.0	53.57
24	<i>Baia Mare - Satu Mare</i>	DX	<i>Drumul Someșului</i>	DX5	55.0	259.0	51.84
25	<i>Cluj Napoca (Apahida) - Dej</i>	DX	<i>Drumul Someșului</i>	DX6	75.0	450.0	51.84
26	<i>Dej - Baia Mare - Halmeu</i>	DX	<i>Drumul Someșului</i>	DX7	95.2	608.9	51.84

Total drumuri de mare viteză				2471.5	23934.8	
------------------------------	--	--	--	--------	---------	--

Pentru a identifica nevoia totală, alături de proiectele prioritizate și ierarhizate s-au adăugat proiectele din scenariul de referință astfel încât se poate vizualiza și identifica în sistem complet coridoarele rutiere. Așadar, se identifică un total general estimat de 31 mld.EUR fără TVA pentru 3072.7 km din rețeaua rutieră primară (tabel 2.1.30). Vizualizarea grafică a rețelei rutiere primare și tipul de finanțare identificat se află în figura 2.1.12.

Tabelul 2.1.30. Lista de proiecte din scenariul de referință și a celor prioritizate

Nr. Crt.	Proiect	Tip proiect	Cost estimat (mil.EUR fără TVA))	Lungime (km)	Punctaj
1	Pitești - Sibiu (L2, L3)	A	1847.0	68.8	100.00
	Pitești - Sibiu (L1, L4, L5)	A	926.4	53.4	SR
	Holdea - Margina	A	297.0	9.0	SR
2	Ploiesti - Comarnic	A	306.8	48.6	84.01
3	Comarnic - Brasov	A	1264.9	50.1	82.52
	Chețani - Cp. Turzii	A	58.3	15.7	SR
	Nădășelu - Poarta Sălajului	A	409.0	42.0	SR
4	Poarta Sălajului - Biharia	A	1057.0	110.0	80.46
5	Giurgiu - Bucuresti	DX	289.8	55.2	79.72
	Ploiești - Buzău	A	635.2	63.3	SR
	Buzău - Focșani	A	797.3	82.4	SR
	Focșani - Bacău	A	998.3	95.9	SR
	Bacău - Pașcani	A	654.7	77.4	SR
6	Sibiu - Brasov	A	1479.9	129.6	77.05
7	Arad - Oradea	DX	522.6	134.0	76.43
11	Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila	DX	464.0	102.1	71.89
8	București - Alexandria (faza 1 din București - Craiova)	DX	367.5	70.0	71.08
9	Alexandria - Craiova (faza 2 din București - Craiova)	DX	656.3	125.0	71.08
10	Inel București (Nord) + drumuri radiale	A	1112.3	145.7	70.18
	Inel București (Sud)	A	507.3	51.2	SR
12	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Moțca - Ungheni)	A	875.5	100.9	66.89
	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Leghin - Moțca)	A	304.0	34.0	SR
13	Brasov - Bacau	A	2364.0	159.9	65.89
14	ByPass Brasov Nord	A	118.2	19.7	65.89
15	Pașcani - Suceava	A	423.8	60.5	65.60
16	Suceava - Siret	DX	215.0	41.0	65.60
17	Tg.Mureș - Tg. Neamț (faza 1 din Miercurea Nirajului - Leghin)	A	1000.0	151.9	64.12
	Tg.Mureș - Tg. Neamț (faza 2 din Miercurea Nirajului - Leghin)	A	4180.4	0.0	64.12

	Tg.Mureș - Tg. Neamț (Tg.Mureș - Miercurea Nirajului)	A	223.5	25.0	SR
	Pitești - Craiova	DX	775.2	121.0	SR
18	Craiova - Filiasi - Dr.Tr.Severin (faza 1)	DX	300.0	104.0	60.50
	Craiova - Filiasi - Dr.Tr.Severin (faza 2)	DX	400.5	0.0	60.50
19	Craiova - Calafat	DX	306.9	78.7	60.50
20	Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj (faza 1)	DX	800.0	142.0	60.29
	Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj (faza 2)	DX	733.0	0.0	60.29
21	Dr.Tr.Severin - Calafat	DX	283.9	72.8	60.29
	Brăila - Galați	DX	75.5	11.1	SR
22	Timișoara - Moravița	DX	343.6	88.1	54.05
	Pod peste Dunare la Brăila	DX	415.8	2.0	SR
23	Macin - Tulcea (+drum de accesibilitate Delta Dunării) - Constanta (faza 1)	DX	200.0	187.7	53.57
	Macin - Tulcea - Constanta (faza 2)	DX	704.0	0.0	53.57
24	Cluj Napoca (Apahida) - Dej	DX	450.0	75.0	51.84
25	Dej - Baia Mare - Halmeu	DX	608.9	95.2	51.84
26	Baia Mare - Satu Mare	DX	259.0	55.0	51.84
	A3 - Tureni	DX	65.5	9.0	SR
	Satu Mare - Oar	DX	63.4	10.9	SR
	Total drumuri de mare viteză prioritizare		23934.8	2471.5	
	Total drumuri de mare viteză scenariul de referință		7206.4	703.3	
	Total general drumuri de mare viteză		31141.1	3174.8	

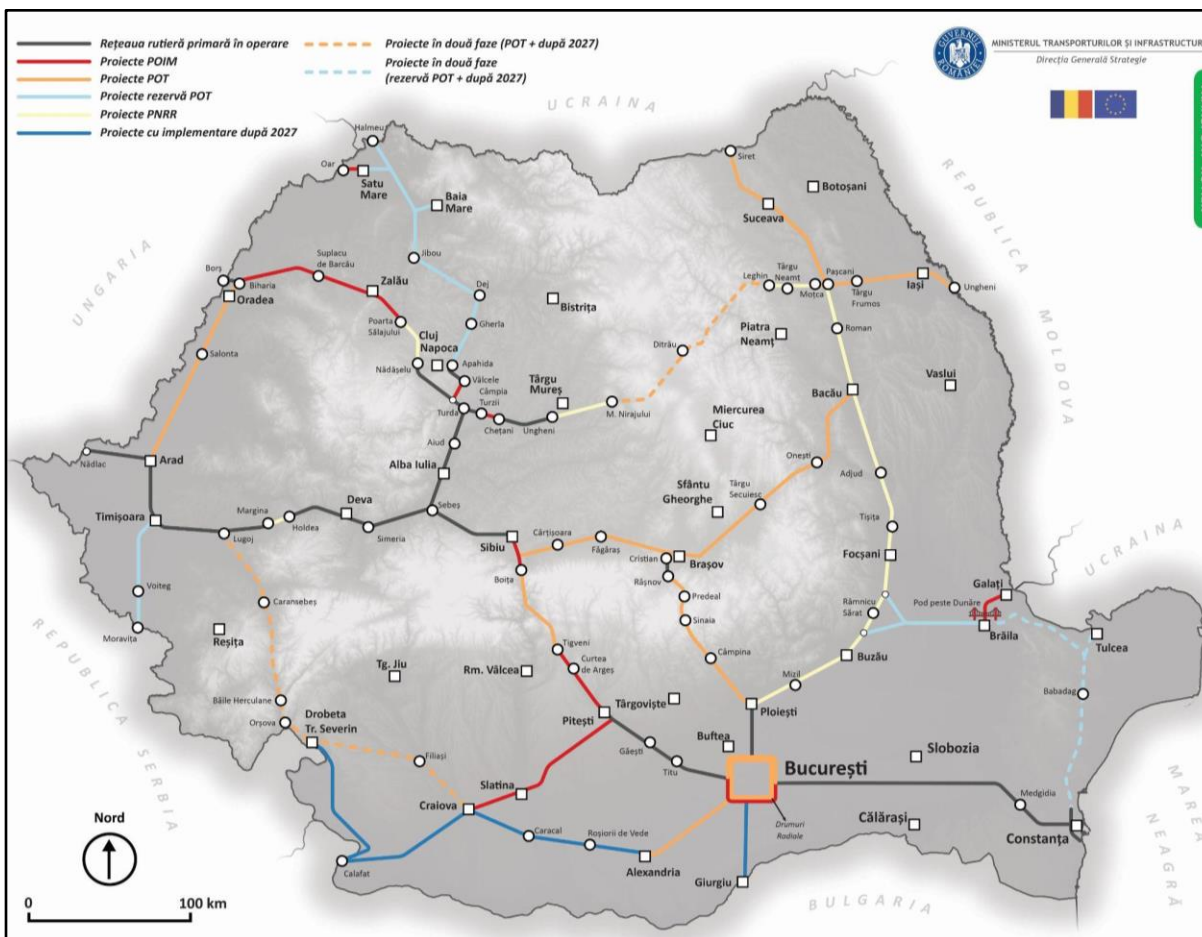


Figura 2.1.12. Harta proiectelor de pe rețeaua rutieră primară și tipul de finanțare

METODOLOGIA DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR DE PE REȚEAUA SECUNDARĂ

Rețeaua rutieră secundară are rol de a conecta reședințele de județ la rețeaua primară într-o manieră rapidă și sigură, pentru populație și mediul de afaceri. Rețeaua rutieră secundară funcționează ca sursă care alimentează rețeaua rutieră rapidă, crescând astfel atractivitatea investițiilor.

Așadar, criteriile de definire și de prioritzare a investițiilor din rețeaua rutieră secundară țin cont de trei elemente esențiale: *volumele de trafic estimate pentru anul 2040 în scenariul cu toată rețeaua rutieră integrată (2040 - DoAll)*, *populația deservită din zona de influență a rețelei*, respectiv *cifra de afaceri a companiilor din zona de influență a rețelei*.

Astfel, metodologia de prioritzare și ierarhizare a proiectelor de pe rețeaua rutieră secundară s-a realizat în baza celor trei criterii esențiale cu ponderi diferite (tabelul 2.1.31):

1. **Media zilnică anuală (MZA - 2040 DoAll)** – 40%;
2. **Populația deservită în bazinul de captare** – 30%;
3. **Cifra de afaceri cumulată a companiilor din bazinul de captare** – 30%;

Tabelul 2.1.31. Metodologia de evaluare pentru fiecare criteriu este sintetizată în tabelul de mai jos

Nr. Crt.	Obiectiv		Pondere	Criteriu de evaluare	Modul de punctare
1	Media zilnică anuală ponderată (MZA) - 40%	Media zilnică anuală medie (MZA Avr.)	20%	Volumele de trafic medii anuale pentru scenariul DoAll 2040 stabilite în baza modelării cu Modelul Național de Transport (MNT)	A fost alocat punctaj maxim pentru proiectul cu cea mai mare MZA Avr. (DX A1 - Mioveni - 18143 vehicule), respectiv punctaje proporționale în raport cu valoarea fiecărui proiect și valoarea maximă. Pentru drumurile transregio, proiectul cu cea mai mare MZA Avr. este proiectul Legătura A8 - Lețcani - Centura Iași - 18261 vehicule).
		Media zilnică anuală maximă (MZA Max.)	20%	Volumele de trafic anuale maxime pentru scenariul DoAll 2040 stabilite în baza modelării cu Modelul Național de Transport (MNT)	A fost alocat punctaj maxim pentru proiectul cu cea mai mare MZA Max. (DX A1 - Mioveni - 18978 vehicule), respectiv punctaje proporționale în raport cu valoarea fiecărui proiect și valoarea maximă. Pentru drumurile transregio, proiectul cu cea mai mare MZA Max. este proiectul A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia/DNCT- 24169 vehicule).
2	Deservirea populației		30%	Populația totală din bazinul de captare (stabilit ca zonă buffer de 5 km de-o parte și de alta a proiectului)	A fost alocat punctaj maxim pentru proiectul de drum expres cu cea mai mare populație deservită din bazinul de captare (DX A0 - București - Târgoviște - 538788 locuitori), respectiv punctaje proporționale în raport cu valorile fiecărui proiect și valoarea maximă. De asemenea a fost alocat punctaj maxim pentru proiectul de drum transregio cu cea mai mare populație deservită din bazinul de captare (TR Vaslui - Iași - A8 - 606974 locuitori), respectiv punctaje proporționale în raport cu valorile fiecărui proiect și valoarea maximă.
3	Deservirea mediului de afaceri		30%	Cifra de afaceri totală din bazinul de captare (stabilit ca zonă buffer de 5 km de-o parte și de alta a proiectului)	A fost alocat punctaj maxim pentru proiectul de drum expres cu cea mai mare cifră totală de afaceri din bazinul de captare (DX A3 - Aeroport Henri Coandă -DN1 -279.14 mld.RON), respectiv punctaje proporționale în raport cu valorile fiecărui proiect și valoarea maximă. A fost alocat punctaj maxim pentru proiectul de drum transregio cu cea mai mare cifră totală de afaceri din bazinul de captare (Centura Metropolitană Cluj-Napoca - 53.79 mld.RON), respectiv punctaje proporționale în raport cu valorile fiecărui proiect și valoarea maximă.

Astfel, metodologia de evaluare a criteriilor, respectiv prioritizarea a fost realizată asupra 8 proiecte din rețeaua rutieră secundară care însumează un total de 322 km și un cost total estimat de 1504.8 mil. EUR (tabelul 2.1.32). Iar pentru rețea rutieră secundară - drumuri transregio, s-a aplicat metodologia pentru 17 proiecte care însumează 558.1 km și un cost total estimat de 1183.8 mil.EUR (tabelul 2.1.33).

Tabelul 2.1.32. Metodologie prioritizare rețea rutieră secundară - drumuri expres

Nr. Crt	Proiect rețea secundară	L (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR/km)	MZA 2040 DOA (Avg)	Punctaj MZA Avg	MZA 2040 DOA (Max)	Punctaj MZA Max	Punctaj ponderat MZA(40%)	Pop. 2015	Punctaj pop.	Punctaj pop. ponderat 30%	Cifra afaceri (mld. RON)	Punctaj cifra afaceri	Punctaj cifră afaceri ponderat 30%	Punctaj total
1	A3 - Aeroport Henri Coandă - DN1	9	43.1	51.3	4.8	13298	73.3	13452	70.9	28.8	341618	63.4	19.0	279.1	100.0	30.0	77.9
2	DX4 - Dej - Bistrita	55.6	266.4	317.0	4.8	5373	29.6	16640	87.7	23.5	212060	39.4	11.8	10.9	3.9	1.2	36.4
3	A7 - Suceava - Botoșani	26	124.5	148.2	4.8	6059	33.4	13237	69.7	20.6	200505	37.2	11.2	6.1	2.2	0.7	32.4
4	A7 - Bacău - Piatra Neamț	61	239.1	284.5	3.9	6078	33.5	7607	40.1	14.7	471740	87.6	26.3	24.4	8.8	2.6	43.6
5	A1 - Pitești - Mioveni	9.2	42.04	50.0	4.6	18143	100.0	18978	100.0	40.0	255000	47.3	14.2	32.2	11.5	3.5	57.7
6	A1 - Găești - Târgoviște - Ploiești - A3	74.2	348.2	414.4	4.7	12263	67.6	15905	83.8	30.3	333306	61.9	18.6	23.0	8.2	2.5	51.3
7	A0 - București - Târgoviște	59.5	312.4	371.8	5.3	6406	35.3	9998	52.7	17.6	538788	100.0	30.0	257.8	92.4	27.7	75.3
8	Alternativa Techirghiol (A2/A4 - Olimp)	27.5	129.1	153.6	4.7	6649	36.6	11205	59.0	19.1	388199	72.1	21.6	26.6	9.5	2.9	43.6
	Total drumuri expres cu valoare socio-economică	322.0	1504.8	1790.8	4.7												

Tabelul 2.1.33. Metodologia de prioritizare a proiectelor de pe rețeaua rutieră secundară - drumuri transregio

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (drumuri transregio)	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil. EUR/km)	MZA 2040 DOA (Avg)	Punctaj MZA Avg	MZA 2040 DOA (Max)	Punctaj MZA Max	Punctaj ponderat MZA (40%)	Pop. 2015	Punctaj pop.	Punctaj pop. ponderat 30%	Cifra afaceri (mld. RON)	Punctaj cifra afaceri	Punctaj cifră afaceri ponderat 30%	Punctaj total
1	Hunedoara - Sântuhalma - A1	13.0	32.8	39.0	2.5	8330	45.6	17282	71.5	23.4	178686	29.4	10.0	6.7	12.5	3.7	37.1
2	A8 - Lețcani Vest - Centura Iași	8.8	43.7	52.0	5.0	18261	100.0	19590	81.1	36.2	410364	67.6	22.9	22.1	41.0	12.3	71.4
3	Blaj - Teiuș - A10	23.7	25.8	30.7	1.1	1899	10.4	2325	9.6	4.0	46566	7.7	2.6	5.2	9.6	2.9	9.5
4	DX - Centura Craiova Est	4.3	18.8	22.4	4.4	8002	43.8	14336	59.3	20.6	314448	51.8	17.5	29.5	54.8	16.5	54.6
5	A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia/DNCT	7.7	22.3	26.5	2.9	12407	67.9	24169	100.0	33.6	357202	58.8	19.9	47.0	87.5	26.2	79.7
6	DX4 - Jibou - Românași - A3	20.5	61.5	73.2	3.0	7414	25.5	10503	34.9	12.1	98494	16.2	4.9	5.1	9.5	2.9	19.8
7	Slobozia - Drajna - A2	16.9	16.9	20.1	1.0	11855	64.9	12083	50.0	23.0	66599	11.0	3.3	4.9	9.2	2.7	29.0
8	Călărași - Drajna Nouă - A2	22.0	11.0	13.1	0.5	5135	28.1	5344	22.1	10.0	103797	17.1	5.1	4.1	7.6	2.3	17.4
9	Reșița - Caransebeș - DX2	41.8	28.9	34.3	0.7	4078	22.3	6301	26.1	9.7	137127	22.6	6.8	4.7	8.7	2.6	19.1
10	Vaslui - Iași - A8	85.9	85.9	102.3	1.0	7332	40.2	7933	32.8	14.6	606974	100.0	30.0	25.0	46.4	13.9	58.5
11	Miercurea Ciuc - Sf. Gheorghe - Chichiș - A13	73.8	39.9	47.4	0.5	4572	25.0	6487	26.8	10.4	184609	30.4	9.1	7.8	14.5	4.4	23.9
12	Rm. Vâlcea - Tigveni - A1	20.4	30.6	36.4	1.5	4917	26.9	5008	20.7	9.5	130814	21.6	6.5	9.1	17.0	5.1	21.1
13	Tg. Jiu - Filiași - DX2	70.9	106.4	126.6	1.5	6998	38.3	8138	33.7	14.4	213937	35.2	10.6	6.5	12.0	3.6	28.6
14	Centura Metropolitană Cluj-Napoca	63.0	580.7	691.0	9.2	4065	22.3	15306	63.3	17.1	410135	67.6	20.3	53.8	100.0	30.0	67.4
15	A1 - Titu - Bâldana - DX9	30.3	30.3	36.1	1.0	3415.04	18.7	9756.29	40.4	11.8	85233	14.0	4.2	1.5	2.8	0.8	16.9
16	DX 9 - Târgoviște - Sinaia - A3	51.7	43.4	51.6	0.8	3439.21	18.8	5881.53	24.3	8.6	236636	39.0	11.7	8.88	16.5	5.0	25.3
17	A4 Cumpăna - DN39 Constanța	3.4	5.1	6.0	1.5	2611.9	14.3	2612.1	10.8	5.0	355057	58.5	17.5	27.61	51.3	15.4	38.0
	Total drumuri transregio cu valoare socio-economică	558.1	1183.8	1408.8	2.1												

Așadar, în urma prioritizării s-a realizat o ierarhizare în funcție de punctajul obținut a celor 8 proiecte cuprinse pe rețeaua rutieră secundară de drumuri expres (tabelul 2.1.34). Se identifică că proiectul A3 - Aeroport Henri Coandă - DN1 are cel mai mare punctaj (77.9 puncte) în urma prioritizării, având o lungime de 9 km și un cost estimat de 43.1 mil. EUR fără TVA. Pe de altă parte, proiectul de drum expres A7 - Suceava - Botoșani a obținut un punctaj de 32.4, astfel se află pe ultimul loc în lista ierarhizată și are o lungime de 26 km cu un cost estimat de 124.5 mil. EUR.

Tabelul 2.1.34. Lista proiectelor prioritizate și ierarhizate - rețea rutieră secundară drumuri expres

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (drumuri expres)	Lungime (km)	Cost estimat (mil. EUR fără TVA)	Cost estimat (mil. EUR cu TVA)	Punctaj total
1	A3 - Aeroport Henri Coandă - DN1	9	43.1	51.3	77.9
2	A0 - București - Târgoviște	59.5	312.4	371.8	75.3
3	A1 - Pitești - Mioveni	9.2	42.04	50.0	57.7
4	A1 - Găești - Târgoviște - Ploiești - A3	74.2	348.2	414.4	51.3
5	Alternativa Techirghiol (A2/A4 - Olimp)	27.5	129.1	153.6	43.6
6	A7 - Bacău - Piatra Neamț	61	239.1	284.5	43.6
7	DX4 - Dej - Bistrița	55.6	266.4	317.0	36.4
8	A7 - Suceava - Botoșani	26	124.5	148.2	32.4
	Total drumuri expres cu valoare socio-economică	322.0	1504.8	1790.8	

Așadar, în urma prioritizării s-a realizat o ierarhizare în funcție de punctajul obținut a celor 17 proiecte cuprinse pe rețeaua rutieră secundară de drumuri transregio (tabelul 2.1.35). Se identifică faptul că proiectul A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia/DNCT are cel mai mare punctaj (79.7 puncte) în urma prioritizării, având o lungime de 7.7 km și un cost estimat de 22.3 mil. EUR fără TVA. Pe de altă parte, pentru proiectul de drum expres Blaj - Teiuș - A10 s-a obținut un punctaj de 9.5, astfel se află pe ultimul loc în lista ierarhizată și are o lungime de 23.7 km cu un cost estimat de 25.8 mil.EUR.

Tabelul 2.1.35. Lista proiectelor prioritizate și ierarhizate - rețea rutieră secundară drumuri transregio

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (Drumuri TransRegio)	Lungime (km)	Cost estimat (mil. EUR fără TVA)	Cost estimat (mil. EUR cu TVA)	Punctaj total
1	A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia/DNCT	7.7	22.3	26.5	79.7
2	A8 - Lețcani Vest - Centura Iași	8.8	43.7	52.0	71.4
3	Centura Metropolitană Cluj-Napoca	63.0	580.7	691.0	67.4
4	Vaslui - Iași - A8	85.9	85.9	102.3	58.5
5	DX - Centura Craiova Est	4.3	18.8	22.4	54.6
6	A4 Cumpăna - DN39 Constanța	3.4	5.1	6.0	38.0
7	Hunedoara - Sântuhalm - A1	13.0	32.8	39.0	37.1
8	Slobozia - Drajna - A2	16.9	16.9	20.1	29.0
9	Tg. Jiu - Filiași - DX2	70.9	106.4	126.6	28.6
10	DX 9 - Târgoviște - Sinaia - A3	51.7	43.4	51.6	25.3
11	Miercurea Ciuc - Sf. Gheorghe - Chichiș - A13	73.8	39.9	47.4	23.9
12	Rm. Vâlcea - Tigveni - A1	20.4	30.6	36.4	21.1

13	DX4 - Jibou - Românași - A3	20.5	61.5	73.2	19.8
14	Reșița - Caransebeș - DX2	41.8	28.9	34.3	19.1
15	Călărași - Drajna Nouă - A2	22.0	11.0	13.1	17.4
16	A1 - Titu - Bâldana - DX9	30.3	30.3	36.1	16.9
17	Blaj - Teiuș - A10	23.7	25.8	30.7	9.5
	Total drumuri transregio cu valoare socio-economică	558.1	1183.8	1408.8	

Propuneri cu caracter aplicativ

Pentru creșterea beneficiilor rețelei rutiere de transport în raport de sporirea fluxurilor de trafic, creșterea siguranței și a accesibilității la rețeaua rutieră primară, a fost propus un set de măsuri și o serie de intervenții cu rezultate imediate, în corelație cu exemplele de bune practici din alte țări ale Uniunii Europene.

Creșterea accesibilității municipiilor reședință de județ la rețeaua rutieră primară

Această măsură vizează două componente:

- creșterea accesibilității la rețeaua rutieră rapidă a municipiilor reședință de județ tranzitate de autostrăzi și drumuri expres, prin creșterea numărului de noduri rutiere;
- dezvoltarea drumurilor de conexiune a municipiilor reședință de județ la rețeaua rutieră rapidă. Astfel, cele 42 de orașe reședință de județ sunt/vor fi conectate, direct sau indirect, la rețeaua rutieră rapidă prin construcția de noi noduri sau de noi legături rutiere, pentru accesul rapid la rețeaua de autostrăzi sau drumuri expres (tabelul 2.1.36).

Tabelul 2.1.36. Conexiunea rapidă, directă sau indirectă, a reședințelor de județ la rețeaua rutieră de mare viteză

Nr. crt.	Reședință de județ	Populație după domiciliu (2020)	Acces	Status
1	Alba Iulia	74885	2 noduri: Alba Iulia Sud, Alba Iulia Nord	În operare
2	Arad	176064	4 noduri: Arad Sud, Arad Sud - Zadareni, Arad Vest - Aeroport, DN7 Ciala	În operare
3	Pitești	172982	3 noduri: Pitești Sud, Pitești Est, Pitești Nord	În operare
4	Bacău	197222	3 noduri: Bacău Sud, Bacău Est, Bacău Nord	În operare
5	Oradea	221413	1 nod: Oradea Biharia	În operare
6	Bistrița	94574	1 nod: Bistrița Viisoara	În proiect
7	Botoșani	119521	1 nod: Botoșani Vest - Manolesti	În proiect
8	Brașov	289502	6 noduri: DN73 Cristian Nord, DN1 Ghimbav, Aeroport, DN13 Stupini, DJ103 Sanpetru, DN11 Harman	În proiect / În operare
9	Brăila	200159	5 noduri: DN2B Lacu Sarat, DN22 Cazasu, DN23 Calea Focșani DNCB, DN2B Baldovinesti, DN22B Nord Brăila	În proiect / În construcție

10	București	2151665	n/a	
11	Buzău	131100	4 noduri: DN2 Spataru, DNCB Buzău Sud, DN2B, DN2 Vadu Pașii - Bobocu	În proiect
12	Reșița	84435	Legătură la DX2 la Caransebes	DX în proiect
13	Călărași	75058	Legătură la A2 la Drajna	A în operare
14	Cluj-Napoca	327272	Centura metropolitană - TR Feleac	În proiect
15	Constanța	311374	5 noduri: DN2A Ovidiu, Poiana/Palazu Mare, DN3 Valu lui Traian, DN39 Lazus, DN39A Port Constanța Sud	În operare
16	Sfântu Gheorghe	63659	Legătură la A5 la Chichis	În proiect
17	Târgoviște	91655	3 noduri: DN72 Dumbrava, DN71 Ulmi, DN72 Răzvad	În proiect
18	Craiova	299743	5 noduri: DN6 Carcea, DN65 Aeroport, DN65C Simnicu de Jos, DN6B Dudovici, DN6 Isalnita	În proiect
19	Galați	306424	2 noduri: DN22B Galați Sud, DN2B Calea Prutului	În proiect
20	Giurgiu	66303	2 noduri: DN5 în zona vămii, DN5 la Remuș	În proiect
21	Târgu Jiu	94734	Legătură la DX2 la Filiasi	În proiect
22	Miercurea Ciuc	41460	Legătură la A5 la Chichis / Legatura la A8 la Ditrau	În proiect
23	Deva	68643	2 noduri: DN76 Soimus, Sântuhalm (în proiect)	În operare
24	Slobozia	51391	Legătură la A2 la Drajna	În operare
25	Iași	387103	DN28 Lețcani, DJ24C Popricani, DN24 Stanca, DJ249A Manzatesti	În proiect
26	Baia Mare	144925	2 noduri Legătură la DX în centura de vest, cu DX în zona Tăuții Măgheruș	În proiect
27	Dr.Tr. Severin	105651	3 noduri DN6 la Șimian, DN67 Drobeta Nord, DN6 Drobeta Vest	În proiect
28	Târgu Mureș	146918	1 nod Legătură la A3 Mureseni	În construcție
29	Piatra Neamț	112186	1 nod Legătură la DX în est în str.Fermelor	În proiect
30	Slatina	82466	2 noduri DN65 în vest, DJ546 în sud	În construcție
31	Ploiești	225049	3 noduri DNCP în sud (Barcanesti), DN1A Ploiești Vest, DN72 Crângul lui Bot	În operare / în proiect
32	Satu Mare	118819	4 noduri DN19 Botiza, DJ194A Gorunului, DN19A Satu Mare Vest, DN19 Carei	În proiect
33	Zalău	69087	Legatura la A3 la Aghires	În proiect
34	Sibiu	168273	5 noduri DN1 Selimbar, DJ106 Sibiu Est, Sibiu Nord - Henri Coanda, DN14 Sibiu Nord, DN7H Sibiu Aeroport	În operare
35	Suceava	125191	3 noduri DN29 Mereni, DN29A Suceava Est, DN2 Iltani	În proiect
36	Alexandria	49519	2 noduri DJ504 Alexandria Nord, DJ703 Mavrodin	În proiect
37	Timișoara	325363	3 noduri DN29 Mereni, DN29A Suceava Est, DN2 Iltani	În operare / în proiect
38	Tulcea	85562	2 noduri Legătură la DX în Somova (Tulcea Vest), legatura la DJ 222C acces Delta Dunării conform ITI	În proiect
39	Vaslui	130622	2 legături la autostradă prin transregio (la Bacău și Iași)	În proiect
40	Râmnicu Vâlcea	117480	2 legături la autostradă spre nord la Racovița și spre est la Tigveni	În proiect
41	Focșani	91481	2 noduri DN23B Focșani Est, DJ204E Petrești	În proiect
42	Bufteni	22718	1 nod Legatura A0 Orbital Nord	În proiect

Pe rețeaua rutieră primară existentă se identifică limitări în ceea ce privește conectivitatea infrastructurii rutiere la această rețea. În acest sens, se propun pentru construire o serie de noduri de legătură pentru a crește conectivitatea unor zone sau municipii la rețeaua primară. Astfel, se propun 10 noduri rutiere, respectiv o descărcare pe Autostrada de Centură A0, trei noduri pe A1 (legături noi la DJ 701, DN7, DJ 687), două legături noi pe A2 (DJ 100, DJ 222), două amenajări de descărcări existente pe A2 (Dunărea, Peștera), o legătură nouă pe A3 cu DJ 101D și o legătură nouă pe A4 cu DN 39E care însumează un cost estimativ de 61 mil. EUR (tabel 2.1.37).

Tabelul 2.1.37. Propunere de valorificare superioară a rețelei rutiere primare prin creșterea conectivității la aceasta. Propunere de noi noduri rutiere pe rețeaua existentă de autostrăzi (pentru creșterea conectivității populației și stimularea investițiilor în zone cu potențial socio-economic)

Nr. crt.	Autostrada	Sector	Poziția kilometrică	Nodul rutier propus	Drum de legătură	Infrastructură conexă	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Impact socio-economic
1	A0 Nord	DN2-A2	km. 48	<i>Pantelimon</i>	descărcare nouă DN3	Da	5	Creșterea conectivității zonei Pantelimon din municipiul București, conexiunea cu DN3 între București și Brănești și acces pentru situații de urgență
2	A1	București - Pitești	km. 53	<i>Ungureni</i>	legătura nouă la DJ 701	Da	6	Creșterea conectivității orașului Titu și Centrului Tehnic Titu, conexiunea cu DN7 între Pitești - București
3	A1	Sebeș - Orăștie	km. 327	<i>Șibot</i>	legătură nouă la DN 7	Da	5	Creșterea conectivității orașelor Cugir și Șibot, conexiune cu DN7 Sebeș - Orăștie și cu platforma industrială
4	A1	Simeria - Deva	km. 362	<i>Sântuhalma</i>	legătură nouă la DN7 și DJ687	Nu	10	Creșterea conectivității municipiul Deva Centru și Est, a municipiul Hunedoara, conexiunea cu DN7 între Deva și Simeria și acces pentru situații de urgență
5	A2	București - Fundulea	km. 22	<i>Brănești</i>	legătură nouă la DJ 100	Da	6	Creșterea conectivității orașului Brănești și a Platformei industriale Est Brănești
6	A2	Fetești - Cernavodă	km. 146	<i>Ovidiu</i>	amenajare descărcare existentă	Da	6	Realizarea conexiunii cu Insula Ialomiței sector vestic (spațiu agricol extins)
7	A2	Fetești - Cernavodă	km. 157	<i>Dunărea</i>	amenajare descărcare existentă	Da	6	Realizarea conexiunii cu Insula Ialomiței sector estic (spațiu agricol extins)
8	A2	Cernavodă - Constanța	km. 181	<i>Peștera</i>	legătură nouă la DJ 222	Da	6	Creșterea conectivității orașului Medgidia, a Portului Medgidia și a zonei turistice Adamclisi - Dobrogea de Sud și acces pentru situații de urgență
9	A3	București - Ploiești	km. 63	<i>Ghighiu</i>	legătură nouă la DJ 101D	Da	6	Creșterea conectivității municipiului Ploiești și a zonei industriale de sud și acces pentru situații de urgență
10	A4	ByPass Constanța	km. 16	<i>Cumpăna</i>	legătura nouă la DN 39E	Da	5	Creșterea conectivității municipiului Constanța Sud și acces facil în partea centrală a portului Constanța
Total							61	

Măsurile pentru creșterea sustenabilității în transportul rutier

Viziunea strategică privind dezvoltarea sustenabilă a transportului rutier a fost definită prin MPGT și prin reglementări specifice fiecărui mod de transport, însă necesită o actualizare în acord cu noile politici de mediu definite la nivel european. În prezent, măsurile necesare pentru a asigura tranziția către un transport sustenabil sunt disparate și lipsește armonizarea cadrului strategic și legislativ sectorial care să conducă spre atingerea acestei viziuni pe termen mediu și lung. Pregătirea cadrului legal, instituțional și operațional pentru implementarea măsurilor prevăzute în *Strategia pentru o Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă*, agreată la nivelul Uniunii Europene, necesită eforturi susținute și asigurarea de sinergii între principalii actori naționali afectați sau cu responsabilități în domeniu.

Având în vedere documentele programatice de la nivel european și de la nivel național, privind promovarea transportului sustenabil, România va întreprinde un program accelerat de promovare a investițiilor în infrastructura de alimentare cu combustibili alternativi și de susținere a autovehiculelor cu emisii reduse, inclusiv prin promovarea măsurilor de politică fiscală și financiară.

Ca parte a acestei abordări strategice, în cadrul **PNRR** au fost incluse o serie de reforme și măsuri corelate cu intervențiile specifice pentru mobilitatea urbană, după cum urmează:

- Modificarea politicilor de tarification a drumurilor de la o abordare de tip "vignette" la o abordare bazată pe distanță;
- Implementarea principiilor de taxare ecologică;
- Descurajarea înmatriculării mașinilor mai vechi de 15 ani;
- Creșterea valorii schemelor de casare pentru vehiculele poluante;
- Stimulente fiscale prelungite pentru vehiculele cu emisii zero;
- Suport pentru extinderea infrastructurii de încărcare a mașinilor electrice;
- Utilizarea criteriilor de achiziții publice ecologice ale UE pentru toate aspectele din domeniul transporturilor.

Implementarea acestor măsuri și reforme revine în sarcina mai multor autorități din România. Astfel, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) va fi responsabil de actualizarea cadrului legislativ care reglementează aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. În ceea ce privește politica de stimulare a achiziționării de vehicule private, respectiv sistemul fiscal de descurajare a utilizării vehiculelor poluante, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor au responsabilitatea actualizării cadrului legislativ.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va pregăti un mecanism de corelare a sistemului de taxare utilizat pentru toate modurile de transport, astfel încât și celelalte moduri de transport, în special cel feroviar, să devină competitive și atractive, în special în ceea ce privește traficul de marfă.

Noul sistem de taxare pentru vehicule gestionat în principal de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va include:

- nivelul specific al taxelor și criteriile clare de tarificare a vehiculelor grele, în conformitate cu principiul "*poluatorul plătește*";
- stimulente pentru vehicule curate/cu emisii reduse și pentru moduri curate de transport;
- un sistem de descurajare a utilizării celor mai poluante vehicule, inclusiv prin măsuri fiscale/financiare, prin intermediul nivelurilor taxelor de proprietate pentru vehiculele private de pasageri;
- utilizarea veniturilor pentru sprijinirea întreținerii drumurilor și a noilor investiții în transportul durabil;
- canalizarea a 10 % din traficul rutier (pasageri și mărfuri) către transportul feroviar până în anul 2026, comparativ cu anul 2020.

În ceea ce privește dezvoltarea **infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi**, competențele în domeniu sunt partajate între mai mulți actori instituționali:

- (1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP/AFM),
- (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA),
- (3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI/CNAIR) și autoritățile publice locale.

Ținta națională pentru punctele de încărcare electrică este formată din:

- 1.836 puncte de reîncărcare electrică deja existente;
- 2.896 de puncte de reîncărcare electrică (din care 264 de puncte de reîncărcare electrică sunt propuse prin proiectele de dezvoltare a rețelei de autostrăzi din PNRR) vor fi realizate pe rețeaua de drumuri naționale/autostrăzi, conform *Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) privind instalarea de stații de reîncărcare vehicule electrice pe rețeaua TEN-T din România, până în anul 2030*. Astfel, CNAIR va începe să utilizeze *Recomandările Forumului privind Transportul Sustenabil* pentru viitoarele documente de licitație și concesiune care includ și puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.
- 13.283 puncte de reîncărcare vor fi finanțate prin componenta *Fondul local pentru tranziția verde și digitală* din PNRR (mediul urban și rural), din care 13.200 de puncte de reîncărcare cu putere înaltă, distribuite astfel:
 - 2.000 de puncte de reîncărcare vor fi finanțate prin componenta *Fondul pentru Valul Renovării* din PNRR (mediul urban), din care 1.000 de puncte de reîncărcare cu putere înaltă și 1.000 cu putere normală;
 - cel puțin 10.000 de alte puncte de reîncărcare cu putere înaltă și cu putere normală finanțate din surse naționale, alte finanțări ale UE (inclusiv politica de coeziune) și/sau din surse private (inclusiv prin concesiuni).

Adițional acestor măsuri, menționăm că toate investițiile în infrastructura rutieră vor respecta standardele TEN-T și vor include, încă din faza de proiectare, cerințele EIA (Evaluarea Impactului asupra Mediului) și cele privind evaluarea adecvată de mediu (parte a Directivei habitate - *Directiva Consiliului European 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992*) precum și noile reglementări tehnice necesare pentru a limita poluarea în sectorul de transport (perdele forestiere, panouri fonoabsorbante, stații de reîncărcare electrice).

Măsuri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere

În 2016, a fost elaborată o evaluare a riscurilor în materie de siguranță rutieră, în conformitate cu strategiile naționale existente, cu scopul de a corobora toate informațiile și acțiunile prioritare propuse în *Strategia Națională privind Siguranța Rutieră*, cu problemele, obiectivele și intervențiile identificate în MPGT.

În prezent, este necesară revizuirea obiectivului de siguranță rutieră în vederea implementării „viziunii zero” în domeniul siguranței rutiere, precum și a măsurilor aferente prevăzute în MPGT.

Pentru atingerea acestui obiectiv, pentru perioada 2020-2030 se propune alocarea unui buget de 100 mil.EUR pentru măsurile de creștere a siguranței traficului rutier (tabel 2.1.38), repartizate proporțional, după cum urmează:

- 25% pentru măsuri de organizare instituțională, creșterea capacității administrative, revizuire standarde etc.;
- 15% pentru măsuri de educație rutieră și intervenții asupra comportamentului conducătorului auto;
- 60% - pentru măsuri de intervenție asupra infrastructurii rutiere pentru eliminarea punctelor negre și minimizarea riscului de accidente rutiere.

În acest scop, în cadrul PNRR va fi finanțată elaborarea *Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră* pentru perioada 2021-2030 care urmărește implementarea normelor și liniilor directoare ale Uniunii Europene, așa cum sunt ele prezentate în documentul cadru de politici europene în domeniul siguranței rutiere „*Vision Zero*”, anume reducerea numărului de decedați în accidente rutiere până în anul 2050 până aproape de zero. Ca obiectiv intermediar, România își asumă ținta Uniunii Europene de reducere a numărului de victime (răniți sau decedați) cu 50% față de anul 2019, până în anul 2030.

Dintre elementele specifice care vor fi pregătite și implementate ca urmare a adoptării Strategiei menționăm:

- Inspecția de siguranță: se va optimiza evaluarea tehnică pentru determinarea gradului de siguranță rutieră;
- Evaluarea vehiculelor rulate, care au fost implicate în evenimente sau pentru determinarea stării de depreciere;
- Dezvoltarea unor baze de date compatibile, privind elementele de siguranță rutieră, în cadrul stațiilor de inspecție, cât și a unităților de reparații vehicule;
- Implementarea și dezvoltarea activității de expertiză tehnică extrajudiciară auto;
- Înființarea de laboratoare de cercetare și expertize capabile să ofere baza tehnică pentru obținerea de date necesare unor analize complexe, corecte și precise, care vizează metodologiile de monitorizare, inspecție și testare a vehiculelor pe toată durata vieții acestora, monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de asistență a șoferului precum și a interfeței om-mașină (Human - Machine Interface – HMI);

- Alinierea la standardele tehnice impuse de **Regulamentul (UE) 2019/2144** privind siguranța generală a autovehiculelor și protecția ocupanților, precum și a utilizatorilor vulnerabili, acțiune sprijinită și de programul **Rabla Clasic (Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024)**;
- Dezvoltarea metodologiei culegerii de date și a bazei de culegere a datelor primare pentru analiza indicatorilor - cheie de performanță referitori la: viteză, utilizarea centurilor de siguranță și a sistemelor de siguranță pentru copii, utilizarea echipamentelor de protecție, distragerea atenției șoferului prin folosirea dispozitivelor portabile, siguranța vehiculului.

Ca parte a implementării *Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră*, va fi pregătită și **Strategia privind eliminarea punctelor negre (hotspot-uri) de pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi**.

Pe rețeaua existentă, din aproximativ 18.000 km de drumuri, a fost identificat de către Poliția Română, în perioada 2015-2019, un număr de **267 locații puncte negre (hotspot-uri)**, în care a fost înregistrat un număr de 5.784 accidente rutiere grave, soldate cu 504 persoane decedate și 9.424 răniți (tabelul 2.1.38).

Tabelul 2.1.38. Strategia privind eliminarea punctelor negre (hotspot-uri) de pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale

Nr. Crt.	Puncte ce vor fi tratate în perioada 2021 - 2030		Valoare estimată pentru măsurile care se vor implementa
1	Proiectul de siguranță rutieră cu finanțare BEI Implementare în perioada 2021 – 2026	46 locații	86 mil.EUR
2	Proiecte de siguranță rutieră cu finanțare din cadrul PNRR Implementare în perioada 2021 – 2026	129 locații	100 mil.EUR
3	Proiecte de siguranță rutieră cu finanțare din cadrul POT Implementare în perioada 2023 – 2030	92 locații	30 mil.EUR
	TOTAL	267 locații	216 mi.EUR

Soluțiile tehnice care vor fi implementate pentru eliminarea acestor puncte negre sunt:

- reamenajări de intersecții și direcționarea fluxurilor de trafic;
- construirea de sensuri giratorii noi;
- construirea de pasaje denivelate;
- resistemizarea circulației pe sectoarele periculoase cu platformă de 12 m (sistem 2+1);
- îmbunătățirea semnalizării verticale și orizontale;
- îmbunătățirea vizibilității pe sectoarele periculoase, prin asigurarea iluminatului pe timp de noapte, prin implementarea de soluții moderne;
- implementarea de soluții high – tech, semnalizare variabilă sistem LED, ansambluri luminoase pentru semnalizarea obstacolelor;
- implementarea de măsuri de siguranță pasivă cum ar fi atenuatori de impact și parapete de ghidare pe rulouri;

- monitorizarea punctelor negre după implementarea de măsuri tehnice fizice prin digitalizarea sectoarelor în exploatare și urmărirea parametrilor tehnici ai măsurilor implementate;
- pregătirea personalului din punct de vedere tehnic în vederea stabilirii și implementării soluțiilor de siguranță rutieră.

La nivelul PNRR au fost incluse o serie de măsuri care se adresează punctual mai multora dintre aceste sectoare critice, după cum urmează:

- Creșterea siguranței rutiere prin protejarea conducătorilor auto împotriva ieșirilor în afara părții carosabile, prin amplasarea de parapete rutiere din beton – 250 300 ml;
- Amplasarea de parapete rutiere cu rulouri pentru creșterea siguranței rutiere în zonele cu risc crescut de producere a accidentelor rutiere – 21000 ml;
- Creșterea siguranței rutiere pe drumul național DN 7C - Transfăgăraș și DN 67C - Transalpina și pe alte sectoare de drumuri montane, prin montarea de parapete rutiere cu cabluri la marginea părții carosabile - 25000 ml;
- Măsuri de diminuare a consecințelor produse de coliziunile cu obiecte rigide din zona drumului, prin amplasarea atenuatoarelor de impact echipate cu sistem de detecție accidente și monitorizare trafic – 600 bucăți;
- Creșterea eficienței activității de întreținere a elementelor de siguranță rutieră prin achiziția de sonete (utilaj) pentru montarea/întreținerea parapetului metalic – 14 bucăți;
- Achiziționarea de sisteme pentru protejarea lucrătorilor care efectuează intervenții de urgență la infrastructură autostrăzilor și drumurilor naționale deschise traficului internațional, tip atenuator montat pe camion (*Truck mounted attenuator*) - 90 bucăți;
- Campanie de siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic – o campanie cu aproximativ 51830 Kit-uri de educație rutieră pentru elevi, 545 workshop-uri pentru implementarea materialelor educaționale în școli și în licee, 12 materiale video promoționale, 12 conferințe de presă;
- Sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină care utilizează energie verde – 1000 bucăți;
- Dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpi de dirijare, butoni luminoși, inclusiv elemente de semnalizare dedicate protejării participanților la trafic de animalele sălbatice – 27059 bucăți;
- Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune – 1277 buc stâlpi;
- Pasaje denivelate pentru creșterea siguranței rutiere și eliminarea blocajelor din trafic – 20 bucăți;
- Pasarele și pasaje subterane pietonale – 50 bucăți + 50 bucăți;
- Creșterea gradului de siguranță rutieră pe rețeaua de drumuri naționale, prin dirijarea traficului în soluție giratorie – 64 bucăți;
- Implementarea sistemului de circulație 2+1 - 137 km de drum;
- Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități – 5 localități;

- Facilități de circulație în condiții de siguranță a pietonilor în localitățile tranzitate de DN-uri - 11 localități cu facilități noi;
- Sporirea gradului de siguranță rutieră prin suplimentarea semnalizării cu semnificația "Acces interzis" pe bretelele autostrăzilor – 500 bucăți;
- Încurajarea păstrării distanței în mers pe autostrada A1 și pe drumul național DN1, prin semnalizare orizontală și verticală - 15 km de drum;
- Achiziția de utilaje specializate pentru ștergerea marcajelor rutiere în vederea reconfigurării semnalizării orizontale – 75 bucăți;
- „Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutieră” – 1 soft + 55 dispozitive IT pentru 17000 km de drumuri inventariate + 150 km de drumuri măsurate;
- Achiziționarea a 1.000 limitatoare de viteză, 300 radare mobile și 500 camere video;
- Proiect pilot - Asigurarea unui grad ridicat de siguranță rutieră pe un sector de autostradă care să permită circulația vehiculelor autonome.

Măsuri de digitalizare a transportului rutier

La nivelul PNRR au fost incluse o serie de măsuri pentru digitalizarea sectorului de transport ce țin de operaționalizarea sistemelor de trafic inteligent și a celor destinate taxării și controlului, după cum urmează:

a) Infrastructura aferentă operaționalizării sistemelor de trafic inteligent:

- Implementarea sistemului de radiodifuziune/mesaje TA pentru sectoarele de autostrăzi din România;
- Implementarea sistemelor de monitorizare și informare în timp real al locurilor de parcare disponibile pe rețeaua de autostrăzi;
- Implementarea și integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A3 Târgu-Mureș – Nădășelu (TEN-T Comprehensive);
- Implementarea și integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A1 Sibiu – Holdea (TEN-T Core);
- Implementarea și integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A1 Margina – Nădlac (TEN-T Core);
- Studiu de fezabilitate privind asigurarea continuității sistemelor ITS pe rețeaua de drumuri europene;
- Studiu de fezabilitate pentru înființarea Centrului Național de Management al Traficului pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale;
- Ateliere mobile pentru intervenții de urgență ITS;
- Achiziție VMS mobile pentru furnizare informații/avertizări în perioadele de vârf de trafic în special în sezonul estival și semnalizarea locului unui accident pentru autostrăzi și drumuri naționale deschise traficului internațional.

b) Infrastructura de taxare și control – instalații automate de măsurare a greutatei camioanelor pentru zonele de frontieră, sisteme integrate de control rutier, taxarea camioanelor pe distanță parcursă

- Modernizarea a 22 de instalații de cântărire situate în 10 puncte de frontieră, inclusiv automatizarea acestora;
- Instalarea de porți de gabarit (34);
- Implementarea de sisteme integrate de inspecție rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecția siguranței traficului și cântărirea vehiculelor destinate transportului de mărfuri;
- Implementarea unui sistem de taxare în funcție de distanța parcursă.

Definirea unor pachete de intervenție pentru podurile și podețele de pe rețelele rutiere primară și secundară, pentru creșterea gradului de siguranță, eliminarea restricțiilor de viteză și creșterea capacității portante. Aceste pachete de intervenție vor fi definite la nivelul fiecărei unități subordonate CNAIR, pentru cele șapte direcții regionale de drumuri și poduri (DRDP: București, Constanța, Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova). Pachetul de intervenție va include lucrări de consolidare pentru podurile și podețele existente din lungul autostrăzilor, viitoarelor drumuri expres și a drumurilor naționale, așa cum au fost definite în cele două rețele rutiere de transport.

Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1 (sectorul București - Pitești) și a altor autostrăzi operaționale în zona marilor orașe. Din analizele de trafic elaborate de către CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor rezultă că, pe măsură ce se vor implementa cele două proiecte de drumuri de mare viteză, autostrada Pitești – Sibiu respectiv drumul expres Pitești – Craiova, capacitatea autostrăzii București – Pitești va fi depășită, fapt ce impune identificare de soluții etapizate pentru creșterea capacității acesteia. Astfel, având la bază experiențe similare din alte state UE și pe baza prognozelor matematice modelate de către CESTRIN, se propun patru etape de mărire a capacității autostrăzii A1 București – Pitești:

- **Etapa 1 (cu caracter experimental):** suprimarea benzii de urgență (model european de mărire a capacității) și transformarea în sector de autostradă cu trei benzi pe sens (calea 2 – Pitești – București) între nodul Bolintin Vale și intrarea în București, coroborat cu scăderea vitezei maxime de circulație de la 130 km/h la 100 km/h. Această intervenție va conduce la creșterea capacității de transport și eliminarea blocajelor de trafic, în special a celor specifice intrării în drumul național centura București. Pe de altă parte se va elimina posibilitatea blocării actualei benzi 1 prin staționarea autovehiculelor care folosesc nodul de descărcare cu acces la centura de vest a Bucureștiului;
- **Etapa 2:** Dezvoltarea autostrăzii la trei benzi de circulație pe sens (pentru ambele sensuri) între București și km. 35 (sector de drum a cărei capacitatea de transport este depășită în anumite intervale ale zilei și ale săptămânii);
- **Etapa 3:** Dezvoltarea autostrăzii la trei benzi de circulație pe sens (pentru ambele sensuri) între km. 80 și Pitești Sud (sector de drum a cărei capacitatea de transport va fi depășită la

momentul finalizării sectoarelor de drum de mare viteză Pitești – Sibiu, Pitești – Craiova și Găești – Târgoviște – Ploiești);

- **Etapa 4:** Dezvoltarea autostrăzii la trei benzi de circulație pe sens (pentru ambele sensuri) între km. 35 și km. 80 în concordanță cu fluxurile de transport nou generate prin dezvoltarea rețelei rutiere de transport.

În măsura în care se vor identifica și alte creșteri semnificative ale traficului rutier de-a lungul drumurilor de mare viteză, în proximitatea municipiilor, se pot propune și alte dezvoltări etapizate ale infrastructurii rutiere existente (ex: autostrada A2 între București și Brănești, autostrada A1 în zona Sebeș, autostrada A1 în zona PTF Nădlac II – calea 1)

Toate aceste dezvoltări etapizate se vor realiza în baza analizelor de trafic, a studiilor și modelărilor efectuate de către CESTRIN / modelărilor de trafic.

- **Creșterea digitalizării și implementarea soluțiilor smart și prietenoase cu mediul pentru transportul rutier**
- **Plan de investiții pentru siguranța rutieră**

Planul de investiții în domeniul siguranței rutiere include linii bugetare pentru punerea în aplicare a următoarelor tipuri de măsuri:

- implementarea amenajării de tip intersecție giratorie pentru intersecțiile la nivel;
- îmbunătățirea amenajării intersecțiilor la nivel;
- construirea de benzi suplimentare pentru vehiculele lente;
- asigurarea siguranței întoarcerii pe loc;
- alte îmbunătățiri (aliniamente, semnalizare, bariere etc.)

La acest moment, este în derulare un proiect de asistență tehnică din partea BEI/EIAH (*Platforma europeană de consiliere în materie de investiții*) care urmărește sprijinirea, confirmarea și rafinarea investițiilor în intersecții cu sens giratoriu, intersecții la nivel și benzi pentru vehicule lente. Asistența include o componentă pilot de aplicare a unui sistem de clasificare în domeniul siguranței rutiere pentru evaluarea eficacității și a performanței siguranței rutiere în România, pe un eșantion de sectoare rutiere/măsuri.

Asistența tehnică va include:

1. Verificarea, validarea și prioritizarea investițiilor identificate de către CNAIR (sensuri giratorii, intersecții și banda a treia / benzi pentru vehicule lente) prin:
 - analiza independentă a costurilor și beneficiilor economice ale măsurilor de siguranță rutieră propuse;
 - evaluarea soluțiilor tehnice, inclusiv a potențialului de standardizare/reducere a costurilor și a potențialelor probleme de planificare/autorizare/Evaluarea Impactului asupra Mediului;

- identificarea eventualelor lacune în activitatea desfășurată până în prezent și stabilirea conținutului unei prime etape a programului de investiții în domeniul siguranței rutiere (Etapa 1), în valoare de aproximativ 100 mil.EUR, care să acopere investițiile cele mai adecvate/mature dintre cele trei categorii de măsuri identificate (tabel 2.1.38).

Domeniul de aplicare va include și definirea etapelor ulterioare ale unui program multianual de investiții în domeniul siguranței rutiere.

2. Evaluarea următoarelor faze de implementare ale Etapei 1 (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și documentația tehnică pentru achiziția publică a lucrărilor/serviciilor aferente) și formularea de recomandări în conformitate cu normele în vigoare din România.
3. Asistență în stabilirea strategiei de achiziții pentru Etapa 1 prin analiza opțiunilor disponibile și optimizarea pachetelor/planurilor de achiziții de lucrări.
4. Derularea unei evaluări de siguranță rutieră (printr-o metoda de clasificare iRAP- International Road Assessment Programme sau similară) asupra unui eșantion de drumuri naționale cuprinse în Etapa 1 de implementare a planului, pentru a permite analiza performanței din punct de vedere al siguranței rutiere, înainte și după implementarea măsurilor. Aceasta testare va pune bazele utilizării metodologiei la scară națională.

Măsuri privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH

În scopul punerii în practică a obiectivelor politicii europene privind neutralitatea climatică cuprinse în *Pactul Ecologic European*, respectiv în cadrul *Strategiei UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă*, precum și a acțiunilor propuse în cadrul pachetului *Fit for 55* este necesar stabilirea unor măsuri la nivel național.

Cadrul legal privind combustibilii alternativi în infrastructura rutieră este reprezentat de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului *privind implementarea infrastructurii combustibililor alternativi (AFIR)* care impune norme privind tipurile de stații de alimentare, puterea acestora, distanța dintre acestea și standardele generale de funcționare. În acest sens, fiecare proiect de infrastructură rutieră va include la nivel de documentație tehnico-economică realizarea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi. De asemenea, în cadrul procesului de evaluare al proiectelor respective, beneficiarii vor elabora o analiză privind respectarea principiului DNSH, ca o condiție pentru finanțarea proiectelor din fondurile europene.

Standarde

Autostrăzile sunt definite ca drumuri de mare capacitate și viteză, rezervate exclusiv circulației autovehiculelor, care nu deserveșc proprietățile riverane și care prezintă următoarele caracteristici:

1. <i>Au cel puțin două benzi de circulație pe fiecare sens, separate (printr-o bandă de teren care nu este destinat circulației sau, în mod excepțional, prin alte mijloace) și sunt prevăzute cu benzi de staționare de urgență spre exterior;</i>				
2. <i>Nu intersectează la nivel alte drumuri, cale ferată sau de tramvai, cale pentru circulația pietonilor;</i>				
3. <i>Vitezele de proiectare sunt împărțite astfel: 140 km/h în zona de șes, 120 km/h în zona de deal și 100 km/h în zona de munte;</i>				
4. <i>Lățimea benzilor de circulație este de 3.75 m pentru zonele de șes și deal, de 3.50 m pentru zona de munte;</i>				
5. <i>Razele minime pentru racordarea curbilor în plan orizontal pentru fiecare viteză de proiectare și panta transversal maximă de 7%, sunt:</i>				
<i>Viteză de proiectare (km/h)</i>	140	120	100	80
<i>Raza minimă (m)</i>	1000	650	450	240

Drumurile expres au caracteristici similare cu autostrăzile, fiind tot drumuri de mare capacitate și viteză, care nu deservește proprietățile riverane fiind diferențiate de acestea printr-o serie de standarde „mai permissive” și au următoarele caracteristici:

1. <i>Viteza de proiectare maximă este de 120 km/h sau mai mică;</i>
2. <i>Benzile de circulație au o lățime de 3.5 m (și în zonele de deal sau câmpie) fata de 3.75 m în cazul autostrăzilor;</i>
3. <i>Drumul expres cuprinde două acostamente a câte 1.5 m față de două benzi de staționare de urgență a câte 2.5 m în cazul autostrăzilor;</i>

Proiectele de *drumuri transregio* (care cuprind unul sau mai multe drumuri naționale), asigură conectivitatea municipiilor reședință de județ cu rețeaua primară compusă din drumuri de mare viteză. *Drumurile transregio* reprezintă unul sau mai multe sectoare de drumuri naționale, care facilitează conectivitatea rutieră între regiunile României, între reședințele de județ sau polii de creștere economică și rețeaua rutieră primară (drumurile de mare viteză).

Pentru implementarea drumurilor Transregio conform Master Planului General de Transport se recomandă îndeplinirea următorilor parametrii și standarde tehnice:

1. <i>Eliminarea trecerilor la nivel cu calea ferată</i>
2. <i>Realizarea de variante de ocolire pentru localitățile dens populate</i>
3. <i>Realizarea unui marcaj rezonant în zonele cu limitări de viteză sau în zonele periculoase</i>
4. <i>Creșterea razelor de curbura (acolo unde acest lucru este posibil)</i>
5. <i>Adăugarea celei de-a treia benzi de circulație pentru vehicule lente în zonele în care declivitatea depășește 8%</i>
6. <i>Realizarea de insule de calmare a traficului la intrarea în localități și în zona trecerilor de pietoni</i>

7. Realizarea de separatoare de sens pentru sectoarele de drum cu patru benzi de circulație sau pentru cele cu două benzi de circulație în zonele în care depășirea este interzisă
8. Eliminarea trecerilor de pietoni prin construirea de pasaje pietonale
9. Realizarea de benzi reversibile pentru sectoarele de drum cu trafic ridicat (ex: vineri 2+1, duminică 1+2)
10. Introducerea de elemente siguranță rutieră (parapeți laterali, iluminarea drumului în zonele periculoase, supralărgirea și supraînălțarea drumului în curbe, introducerea de sensuri giratorii în zonele cu conflict de trafic)
11. Realizarea câte unui district de intervenție, management și gestiune propriu pentru fiecare drum
12. Realizarea de stații de alimentare cu combustibili alternativi

De asemenea, drumurile care îndeplinesc funcția de drum transfrontalier au fost clasificate conform MPGT ca drumuri eurotrans.

Drumurile EuroTrans reprezintă un sector sau mai multe sectoare de drumuri naționale, cu două sau mai multe benzi de circulație, care facilitează conectivitatea rutieră între rețeaua primară de transport (drumuri de mare viteză) și rețelele rutiere din statele vecine.

Pentru implementarea drumurilor Eurotrans conform Master Planului General de Transport se recomandă îndeplinirea următorilor parametri și standarde tehnice:

1. Facilități de trecere rapidă a frontierei de stat
2. Spații de servicii, parcuri și spații de odihnă în vecinătatea punctelor de frontieră
3. Indicatoare rutiere în trei limbi (RO/EN/limba țării vecine)
4. Suplimentarea drumului cu încă o bandă de circulație pe sensul de ieșire din țară pentru vehicule grele
5. Facilități de plată electronică a taxelor de pod (Giurgiu-Ruse, Calafat-Vidin)
6. Eliminarea trecerilor la nivel cu calea ferată
7. Realizarea de variante de ocolire pentru localitățile dens populate
8. Realizarea de marcaj rezonant în zonele cu limitări de viteză sau zonele periculoase
9. Creșterea razelor de curbură (acolo unde acest lucru este posibil)
10. Adăugarea celei de-a treia benzi de circulație pentru vehicule lente, în zonele în care declivitatea este de peste 8%
11. Realizarea de insule de calmare a traficului la intrarea în localități și în zona trecerilor de pietoni
12. Realizarea de separatoare de sens pentru sectoarele de drum cu patru benzi de circulație sau pentru cele cu două benzi de circulație, în zonele în care depășirea este interzisă
13. Eliminarea trecerilor de pietoni prin construcția de pasarele pietonale
14. Realizarea de benzi reversibile pentru sectoarele cu trafic ridicat (ex: vineri 2+1, duminică 1+2)
15. Introducerea de elemente de siguranță rutieră (parapete laterale, iluminarea drumului în zonele periculoase, supralărgirea și supraînălțarea drumului în curbe, introducerea de sensuri giratorii în zonele cu conflict de trafic)
16. Realizarea câte unui district de intervenție, management și gestiune propriu pentru fiecare drum
17. Stații de alimentare cu combustibili alternativi

Notă: Tipul infrastructurii și nivelul de servicii al acestor legături transfrontaliere vor fi stabilite la nivelul studiilor de fezabilitate (în funcție de fluxurile de trafic existente, cele nou atrase sau nou generate) și în corelare cu proiectele similare din statele vecine (astfel încât legăturile rutieră transfrontaliere să aibă un caracter unitar).

2.2. MODURI DE TRANSPORT: FEROVIAȚ

Obiectivele strategice de conectivitate feroviară

În contextul noii politici europene de protecție și conservare a mediului, dar și de atenuare a modificărilor globale cauzate de schimbările climatice, transpusă în viziunea *Green Deal* a Comisiei Europene, prezentul Plan Investițional și-a aliniat obiectivele strategice cu tendințele europene. Unul dintre cele mai importante și provocatoare obiective pentru sectorul feroviar, stipulat în cadrul Master Planului General de Transport al României se referă la transferarea, până în anul 2030, a unui procent de 30% din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile. Acest procent trebuie să depășească 50 % până în anul 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară dezvoltarea unei infrastructuri feroviare adecvate, eficiente din punct de vedere economic, care să conducă la valorificarea sustenabilă a resurselor energetice și care să reducă impactul negativ asupra mediului.

Pentru atingerea acestui deziderat, în Planul Investițional se propune dezvoltarea unui sistem feroviar echilibrat și eficient din punct de vedere economic și energetic, competitiv, prin intervenții și investiții în îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii feroviare și modernizarea parcului de material rulant.

Planul investițional, prin intervențiile și investițiile propuse, promovează complementaritatea și compatibilizarea modurilor de transport, astfel încât sistemul de transport să se dezvolte într-o manieră eficientă și sustenabilă care să contribuie decisiv la o creștere majoră a accesibilității transportului de persoane și mărfuri.

Pentru dezvoltarea sectorului feroviar au fost identificate câteva obiective specifice care să contribuie la atingerea obiectivului general de bună conectivitatea feroviară și complementaritate cu alte moduri de transport, respectiv:

- **Obiectivul de eficiență economică:** dezvoltarea unui sistem de transport feroviar care generează beneficii mai mari decât costurile înregistrate;
- **Obiectivul de echitate:** costurile și veniturile unui sistem de transport vor fi distribuite corect între cetățeni, industrii și între zone geografice;
- **Obiectivul de siguranță:** infrastructura și serviciile de transport vor fi furnizate astfel încât să protejeze persoanele împotriva vătămării sau a deceselor;
- **Obiectivul de integrare:** sistemul de transport va permite persoanelor (inclusiv pentru cele cu mobilitate redusă) să călătorească confortabil și sigur, utilizând o varietate de moduri de transport și să minimizeze costurile de transport de mărfuri;
- **Obiectivul de mediu:** sistemul de transport va proteja mediul înconjurător sprijinind dezvoltarea socială și economică în folosul prezentei generații dar și a celor viitoare.

Pentru stabilirea nevoilor prioritare feroviare totale s-a identificat nevoia de conectivitate, s-au definit coridoarele de conectivitate, rețeaua feroviară, lista de proiecte care au fost prioritizate și ierarhizate în așa fel încât să se obțină un rezultat fundamentat în funcție de criterii științifice, concrete și corecte (figura 2.2.1).




Figura 2.2.1. Etapele parcurse pentru stabilirea listei de proiecte feroviare

Obiectivele generale de conectivitate feroviară sunt axate pe creșterea accesibilității și a competitivității serviciilor feroviare de călători și de mărfuri, atât la nivelul regiunilor României, cât și prin racordarea la rețelele feroviare ale statelor vecine (utilizând toate coridoarele TEN-T ce tranzitează teritoriul național).

În acest context, au fost identificate 4 obiective generale de conectivitate feroviară (figura 2.2.2), ce asigură conexiunea provinciilor istorice, a regiunilor de dezvoltare ale României cât și interconectarea cu rețelele feroviare din statele vecine:

- **Obiectivul general de conectivitate 1 (OCF1)** – asigură mobilitatea populației și a mărfurilor pe direcția vest-est, între Europa Centrală și Marea Neagră, din vestul spre estul României trecând prin centrul și sudul țării. Reprezintă o veritabilă axă națională transcarpatică și transregională, de importanță europeană regională.
- **Obiectivul general de conectivitate 2 (OCF2)** – asigură conexiunea între nordul și sudul României, reprezentând totodată și o axă între nordul și sudul continentului, în actualul context geopolitic.
- **Obiectivul general de conectivitate 3 (OCF3)** – reprezintă, la nivelul țării, o legătură importantă între Moldova și Transilvania dar și o axă de tranzit între țările aflate la est de România și Europa Centrală.
- **Obiectivul general de conectivitate 4 (OCF4)** – realizează legătura între sudul și vestul țării, traversând Muntenia, Oltenia și Banat. La nivel european reprezintă o legătură facilă între sudul continentului și partea centrală și vestică a acestuia.

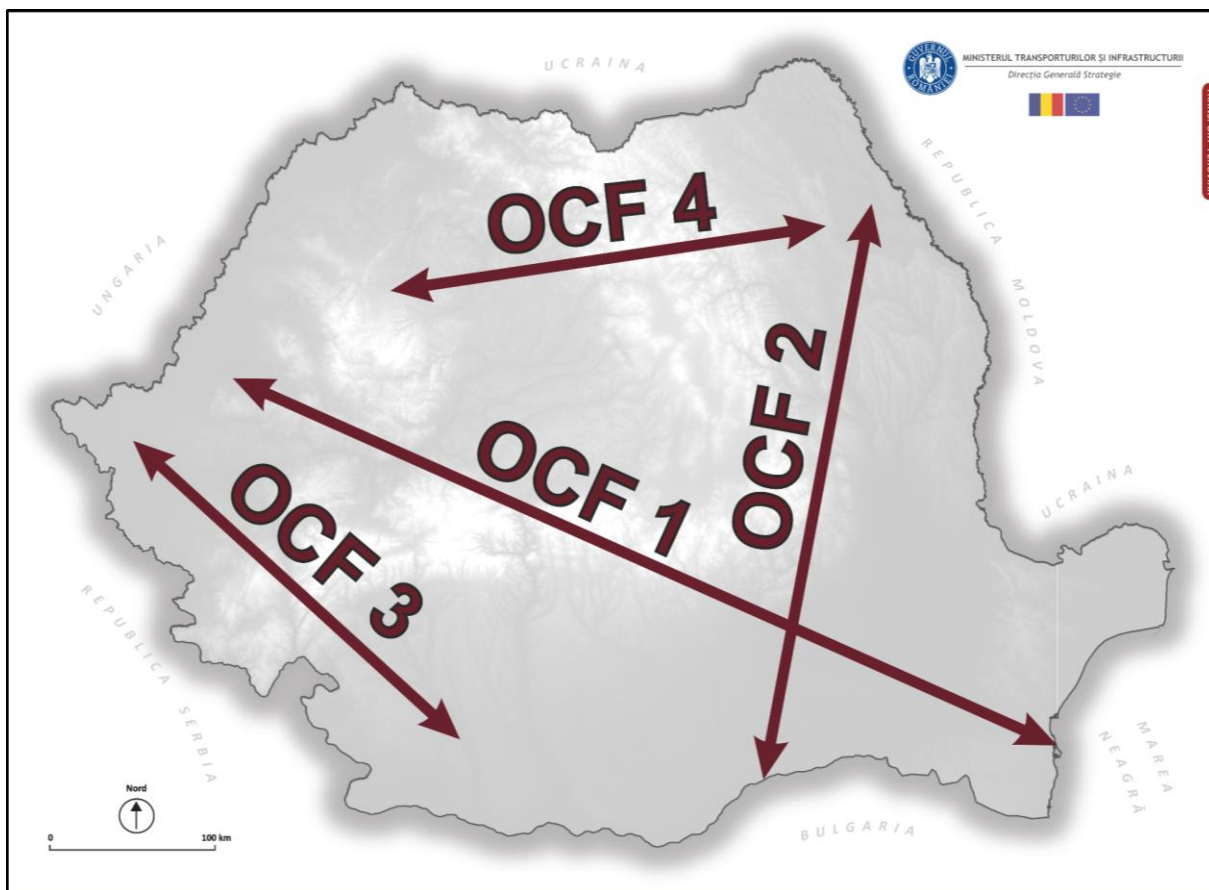


Figura 2.2.2. Harta obiectivelor generale de conectivitate feroviară

Având la bază obiectivele generale de conectivitate feroviară în corelație directă cu suprapunerea rețelei TEN-T pe teritoriul României, pentru creșterea eficienței sectorului feroviar, au fost stabilite coridoarele de conectivitate feroviară. Acestea vor fi utilizate pentru stabilirea listei de intervenții la nivelul infrastructurii feroviare care să producă efecte majore, directe și indirecte, după implementare (figura 2.2.3).

Coridoarele naționale de conectivitate feroviară

Păstrând metodologia folosită pentru sectorul rutier, în mod similar s-a realizat identificarea și analizarea coridoarelor de conectivitate feroviară, demers necesar pentru a stabili și a fundamenta intervențiile și proiectele feroviare. Coridoarele feroviare evidențiază, în mod unitar, performanțele proiectelor din care sunt compuse și asigură o viziune de ansamblu asupra conectivității naționale, între regiuni, dar și în context european.

Condiționările geografice induse de dispunerea munților Carpați au impus dezvoltarea a 4 coridoare de conectivitate feroviară și a mai multor coridoare de conexiune națională și internațională (figura 2.2.3).

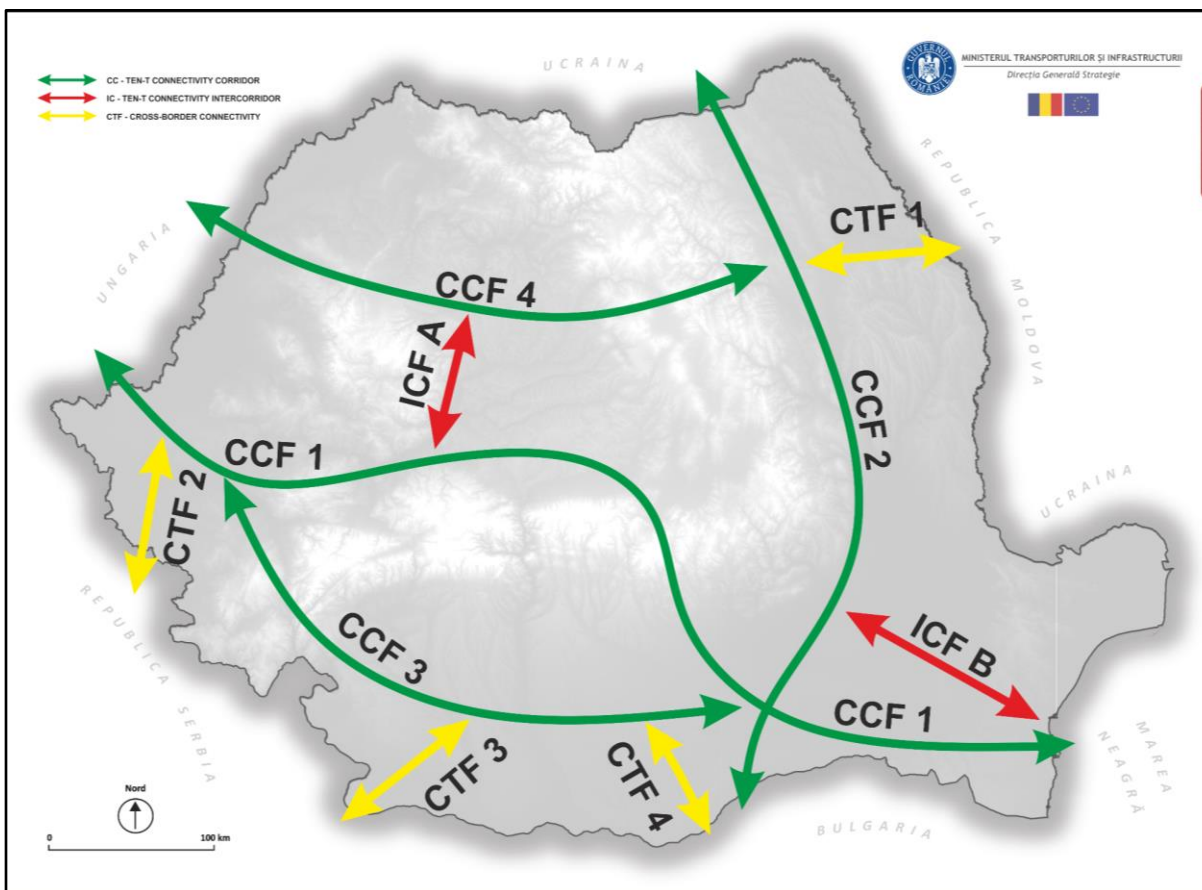


Figura 2.2.3. Harta coridoarelor de conectivitate feroviară din România

Coridoarele de conectivitate feroviară

Cele patru coridoare de conectivitate feroviară sunt:

- **Coridorul de conectivitate 1 (Coridorul Feroviar Central)** – reprezintă cel mai important coridor de cale ferată din România (tabelul 2.2.1). Acesta este compus din 10 proiecte de cale ferată care asigură conectivitatea feroviară între Marea Neagră și Europa Centrală prin PTF Curtici. Lungimea coridorului este de 1.641 km (în acest total fiind incluse și căile ferate din Portul Constanța – 180 km, dar și Complexul Feroviar București - 600 km). Din lungimea totală a coridorului, 580 km de cale ferată, corespunzător sectoarelor Constanța – București – Predeal, Sighișoara - Coșlariu - Vințu de Jos - Simeria și km 614 – Arad – Curtici, sunt modernizați și se află în operare. Chiar dacă sectorul Constanța – București a fost modernizat în ultimii zece ani, o sumă de aproximativ 64 mil. EUR a fost prevăzută pentru finalizarea lucrărilor pentru stațiile CF Ciulnița și Fetești. Întregul coridor este parte componentă a rețelei TEN-T Core, făcând parte din coridorul european Rin-Dunăre. Lucrări în curs sunt pe sectorul Simeria – Gurasada – KM 614. Întreg coridorul este format din cale ferată dublă electrificată și se suprapune rutelor feroviare 800, 300, 200A și 200.

**Tabelul 2.2.1. Proiectele de infrastructură feroviară care compun
coridorul de conectivitate 1 – ‘Coridorul Feroviar Central’**

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil. EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE FEROVIARĂ 1 CCF 1 - "Coridorul Feroviar Central" Port Constanța / Constanța - Complex Feroviar București - Brașov - Sighișoara - Simeria - Arad - Curtici	TEN-T Core	Port Constanța - Palas	P	180.0	727.4	865.6	4.0	Constanța FeeryBoat, Constanța Port Nord
2			Constanța - București	O	225.0	64.8	77.1	n/a	Constanța, Medgidia, Fetești, București
3			Complex feroviar București	P	600.0	1000.0	1190.0	1.7	Otopeni, Mogoșoaia, Chitila, Jilava, Voluntari
4			București - Predeal	O	140.0	-	-	-	Bucuresti, Ploiesti, Campina, Sinaia, Predeal
5			Predeal - Brașov	P	27.0	630.0	749.7	23.3	Predeal, Brașov
6			Brașov - Sighișoara	C	112.6	1535.0	1826.7	13.6	Brașov, Rupea, Sighișoara
7			Sighișoara - Coșlariu	O	99.0	-	-	-	Sighișoara, Mediaș, Copșa Mică, Blaj, Teiuș
8			Coșlariu - Simeria	O	75.3	-	-	-	Teiuș, Alba Iulia, Vințu de Jos, Orăștie, Simeria
9			Simeria - Gurasada - Km. 614	C	141.2	1888.0	2246.7	13.4	Simeria, Deva, Săvârșini, Radna
10			Km. 614 - Arad - Curtici Frontieră	O	41.2	-	-	-	Arad, Curtici
	Total coridor				1641.3	5845.2	6955.8		
	în operare				580.5				
	în construcție				253.8				
	în proiect				807.0				

- **Coridorul de conectivitate 2 (Coridorul Feroviar de Est)** – este compus din 7 proiecte de cale ferată din care doar unul a fost reabilitat (București – Ploiești, parte componentă a coridorului de conectivitate 1). Acest coridor asigură legătura pe axa nord – sud, între Moldova și Muntenia, dar și între Ucraina / Moldova și Bulgaria la nivel de tranzit continental. Lungimea coridorului este de aproximativ 535 km, acesta fiind parte componentă a rețelei TEN-T Core (tabelul 2.2.2). Pentru implementarea proiectelor București – Giurgiu și Dărmănești – Vicșani, pe lângă modernizare se va realiza și electrificarea acestora. Coridorul este compus din cale ferată dublă electrificată între București și Suceava. Se suprapune rutelor feroviare 902 și 500.

**Tabelul 2.2.2. Proiectele de infrastructură feroviară care compun
coridorul de conectivitate 2 – ‘Coridorul Feroviar de Est’**

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE FERVIARĂ 2 CCF 2 - "Coridorul Feroviar de Est" Giurgiu - București - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava - Vicșani	TEN-T Core	Giurgiu frontieră - București	P	99.0	577.7	687.4	5.8	Giurgiu, Jilava, București
2			București - Ploiești Triaj	O	56.0	-	-	-	București, Buftea, Ploiești
3			Ploiești Triaj - Focșani	P	143.0	572.0	680.7	4.0	Ploiești, Mizil, Buzău, Rm. Sărat, Focșani
4			Focșani - Roman	P	147.0	588.0	699.7	4.0	Focșani, Mărășești, Adjud, Bacău, Roman
5			Roman - Pașcani	P	41.0	164.0	195.2	4.0	Roman, Pașcani
6			Pașcani - Suceava - Dărmănești	P	71.0	284.0	338.0	4.0	Pașcani, Verești, Dolhasca, Suceava
7			Dărmănești - Vicșani Frontieră	P	34.0	57.0	67.8	1.7	Suceava, Dornești
	Total coridor				535.0	2242.7	2668.8		
	în operare				0.0				contorizat la Coridorul Feroviar Central - CCF1
	în construcție				0.0				
	în proiect				535.0				

- **Coridorul de conectivitate 3 (Coridorul Feroviar de Sud)** – este compus din trei proiecte feroviare majore. Lungimea lui este de aproximativ 600 km și se suprapune rețelei TEN-T Core, dar și Coridoarelor Rin-Dunăre (ramura sudică) și Orient East-Med (tabelul 2.2.3). Prin proiectele Craiova – Caransebeș și Arad – Caransebeș se asigură accesul feroviar la podul dunărean transfrontalier de la Calafat-Vidin. Între București și Strehaia coridorul este dublu electrificat, iar mai departe, spre Arad, este doar electrificat. Acesta se suprapune rutelor feroviare 900 și 310.

**Tabelul 2.2.3. Proiectele de infrastructură feroviară care compun
coridorul de conectivitate 3 – ‘Coridorul Feroviar de Sud’**

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE FERVIARĂ 3	TEN-T Core	București - Craiova	P	209.0	1254.0	1492.3	6.0	București, Videle, Roșiori, Caracal, Craiova
2	CCF 3 - "Coridorul Feroviar de Sud"		Craiova - Dr.Tr.Severin - Caransebeș	P	234.0	2110.1	2511.0	9.0	Craiova, Filiași, Strehaia, Dr. Tr. Severin, Orșova, Băile

	București - Roșiori - Craiova - Dr. Tr. Severin - Caransebeș - Lugoj - Timișoara - Arad							Herculane, Caransebeș
3		Caransebeș - Timișoara - Arad	P	155.0	1499.9	1784.9	9.7	Caransebeș, Lugoj, Recaș, Timișoara, Arad
	Total coridor			598.0	4864.0	5788.2		
	în operare			0.0				
	în construcție			0.0				
	în proiect			598.0				

- **Coridorul de conectivitate 4 (Coridorul Feroviar de Nord)** – este compus din trei proiecte feroviare ce unesc Moldova de Transilvania, dar și țările din estul României cu țările din Europa Centrală. Lungimea coridorului este de aproximativ 470 km, din care 322 km (Suceava – Cluj-Napoca) aparțin rețelei TEN-T Core, iar restul de 156 km (Cluj-Napoca – Ep. Bihor) se suprapun rețelei TEN-T Comprehensive (tabelul 2.2.4). Sectorul de cale ferată dintre Suceava și Cluj-Napoca este în totalitate electrificat și parțial dublat. În modernizarea sectorului de cale ferată dintre Cluj-Napoca și Episcopia Bihor sunt prevăzute și lucrări de electrificare. Acesta se suprapune rutelor feroviare 502, 401 și 300.

Tabelul 2.2.4. Proiectele de infrastructură feroviară care compun coridorul de conectivitate 4 – ‘Coridorul Feroviar de Nord’

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL DE CONECTIVITATE FEROVIARĂ 4 CCF 4 - "Coridorul Feroviar de Nord" Suceava - Ilva Mică - Dej - Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor	TEN-T Core	Suceava - Ilva Mică	P	191.0	1807.5	2150.9	9.5	Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Ilva Mică
2			Ilva Mică - Apahida	P	119.0	714.0	849.7	6.0	Ilva Mică, Năsăud, Beclean, Dej, Gherla, Cluj-Napoca
3		TEN-T Compr ehensiv e	Cluj-Napoca - Ep. Bihor Frontieră	P	160.0	1493.4	1777.1	9.3	Cluj-Napoca, Huedin, Aleșd, Oradea, Ep. Bihor
Total coridor					470.0	4014.9	4777.7		
	în operare				0.0				
	în construcție				0.0				
	în proiect				470.0				

Inter-coridoarele de conectivitate feroviară

Legătura dintre coridoarele de conectivitate se realizează prin intermediul a două inter-coridoare de conectivitate feroviară:

- **Inter-coridorul de conectivitate A (Inter-coridorul Ardeal)** – se suprapune rețelei europene TEN-T Core și este compus din două proiecte feroviare (102 km în total), care conectează coridorul de conectivitate 1 de coridorul de conectivitate 4, pe relația Teiuș – Aiud – Câmpia Turzii – Apahida (tabelul 2.2.5). Întreg inter-coridorul este compus din cale ferată dublă electrificată și se suprapune rutei feroviare 300.

Tabelul 2.2.5. Proiectele de infrastructură feroviară care compun inter-coridorul de conectivitate A – 'Inter-coridorul Ardeal'

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE FEROTIARĂ A	TEN-T Core	Teiuș - Cp. Turzii	P	51.0	306.0	364.1	6.0	Teiuș, Aiud, Ocna Mureș, Câmpia Turzii
2	ICF A - Inter-coridorul "Ardeal" Teiuș - Apahida - Cluj-Napoca		Cp. Turzii - Cluj-Napoca	P	51.0	484.5	576.6	9.5	Câmpia Turzii, Apahida, Cluj-Napoca
Total coridor					102.0	790.5	940.7		
	în operare				0.0				
	în construcție				0.0				
	în proiect				102.0				

- **Inter-coridorul de conectivitate B (Inter-coridorul Bărăgan)** – este compus din două proiecte feroviare și are o lungime de aproximativ 129 km, suprapunându-se rețelei TEN-T Comprehensive între Buzău, Făurei și Fetești. Inter-coridorul asigură conexiunea feroviară între coridorul de conectivitate 1 și coridorul de conectivitate 2 (tabelul 2.2.6). Întreg coridorul este dublu electrificat și se suprapune rutei feroviare 702. Ruta poate avea valențe de transport cereale, având în vedere că traversează zone mari generatoare de produse agricole.

Tabelul 2.2.6. Proiectele de infrastructură feroviară care compun inter-coridorul de conectivitate B – 'Inter-coridorul Bărăgan'

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	INTER-CORIDORUL DE CONECTIVITATE FERROVIARĂ B	TEN-T Comprehensive	Buzău - Făurei	P	40.0	160.0	190.4	4.0	Buzău, Făurei
2	ICF B - Inter-coridorul "Bărăgan" Buzău - Făurei - Fetești		Făurei - Fetești	P	89.0	356.0	423.6	4.0	Făurei, Țândărei, Fetești
Total coridor					129.0	516.0	614.0		
O	în operare				0.0		614.0		
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				129.0				

Coridoarele transfrontaliere

Legătura coridoarelor de conectivitate cu rețelele feroviar din statele vecine se realizează de-a lungul coridoarelor TEN-T în mod direct sau indirect.

Legătura directă a coridoarelor de conectivitate cu rețelele feroviare ale statelor vecine se face după cum urmează:

- **Coridorul de conectivitate CCF 1 Coridorul Feroviar Central:** asigură conectivitatea cu rețeaua feroviară din Ungaria prin PTF Curtici în vest, respectiv cu alte state prin portul Constanța, în est;
- **Coridorul de conectivitate CCF 2 Coridorul Feroviar de Est:** asigură conectivitatea cu rețeaua feroviară din Bulgaria prin PTF Giurgiu Nord în sud, respectiv cu Ucraina prin PTF Vicșani în nord;
- **Coridorul de conectivitate CCF 4 Coridorul Feroviar de Nord:** asigură conectivitatea cu rețeaua feroviară din Ungaria prin PTF Episcopia Bihor în vest.

De asemenea, coridoarele de conectivitate se racordează direct cu rețelele feroviare ale statelor vecine și indirect prin intermediul coridoarelor feroviare transfrontaliere, după cum urmează:

- **Coridorul feroviar transfrontalier CTF 1 (Coridorul Prut)** – conectează coridorul de conectivitate 2, în vest (Pașcani), cu Republica Moldova prin PTF Cristești – Ungheni în est. Lungimea coridorului este de aproximativ 97 km, din care 76 km (Pașcani – Iași) sunt reprezentați de cale ferată dublă electrificată, restul de cale ferată simplă neelectrificată (tabelul 2.2.7). Coridorul aparține rețelei TEN-T Core și se suprapune rutelor feroviare 606 și 600.

Tabelul 2.2.7. Proiectul de infrastructură feroviară care formează coridorul feroviar trans-frontalier CTF 1 – 'Prut'

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL FERROVIAR TRANSFRONTALIER 1 CTF 1 - CORIDORUL "Prut" <i>Pașcani - Iași - Ungheni Frontieră</i>	TEN-T Core	<i>Pașcani - Iași - Ungheni</i>	P	97.0	388.0	461.7	4.0	Pașcani, Tg. Frumos, Iași
Total coridor					97.0	388.0	461.7		
O	în operare				0.0		461.7		
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				97.0				

- **Coridorul transfrontalier CTF 2 (Coridorul Banat)** – conectează coridorul de conectivitate 3, în nord (Timișoara), cu Serbia prin PTF Stamora Moravița în sud. Lungimea coridorului este de aproximativ 56 km. Coridorul se suprapune rețelei TEN-T Core și poate conecta fostul coridor feroviar IV PanEuropean de pe teritoriul României cu fostul coridor X Pan-European de pe teritoriul Serbiei, cu beneficii majore asupra fluxurilor de mărfuri care pot fi direcționate dinspre Slovenia sau Croația spre portul Constanța (tabelul 2.2.8). În prezent, calea ferată este simplă electrificată, însă în intervenția de modernizare sunt incluse și lucrări de electrificare. Coridorul se suprapune rutei feroviare 922.

Tabelul 2.2.8. Proiectul de infrastructură feroviară care formează coridorul feroviar trans-frontalier CTF 2 – 'Banat'

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL FERROVIAR TRANSFRONTALIER 2 CTF 2 - CORIDORUL "Banat" <i>Timișoara - Stamora Moravița</i>	TEN-T Core	<i>Timișoara - Stamora Moravița frontieră</i>	P	56.0	120.0	142.8	2.1	Timișoara, Moravița
Total coridor					56.0	120.0	142.8		
O	în operare				0.0		142.8		
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				56.0				

- **Coridorul transfrontalier CTF 3 (Coridorul Tracia)** – conectează coridorul de conectivitate 3, în nord (Craiova), cu Bulgaria prin PTF Calafat în sud. Lungimea coridorului este de aproximativ 107 km (tabelul 2.2.9). Coridorul se suprapune rețelei TEN-T Core, fiind parte componentă a Coridorului Orient East-Med. În prezent, calea ferată este simplă

neelectrificată, însă în cadrul intervenției de modernizare sunt incluse și lucrări de electrificare. Coridorul se suprapune rutei feroviare 912.

Tabelul 2.2.9. Proiectul de infrastructură feroviară care formează coridorul feroviar trans-frontalier CTF 3 – ‘Tracia’

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL FERVIAR TRANSFRONTALIER 3 CTF 3 - CORIDORUL "Tracia" Craiova - Calafat	TEN-T Core	Craiova - Calafat	P	107.8	561.3	667.9	5.2	Craiova, Calafat
Total coridor					107.8	561.3	667.9		
O	în operare				0.0		667.9		
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				107.8				

- **Coridorul transfrontalier CTF 4 (Coridorul Muntenia)** – conectează coridorul de conectivitate 3, în nord (Videle/Rădulești), cu Bulgaria prin PTF Giurgiu Nord în sud. Lungimea coridorului este de aproximativ 67 km (tabelul 2.2.10). Coridorul se suprapune rețelei TEN-T Core și reprezintă un bypass feroviar al Bucureștiului pentru fluxul feroviar dinspre Europa Centrală - Bulgaria, Turcia și Grecia. În prezent, calea ferată este simplă neelectrificată, însă în intervențiile de modernizare sunt incluse și lucrări de electrificare. Coridorul se suprapune rutei feroviare 903.

Tabelul 2.2.10. Proiectul de infrastructură feroviară care formează coridorul feroviar trans-frontalier CTF 4 – ‘Muntenia’

Nr. Crt.	Coridor	Rețea TEN-T	Denumire proiect	Status	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA per km (mil.EUR)	Localități urbane deservite
1	CORIDORUL FERVIAR TRANSFRONTALIER 4 CTF 4 - CORIDORUL "Muntenia" Videle - Giurgiu	TEN-T Core	Videle - Giurgiu	P	67.0	113.0	134.5	1.7	Videle, Giurgiu
Total coridor					67.0	113.0	134.5		
O	în operare				0.0		134.5		
C	în construcție				0.0				
P	în proiect				67.0				

În sinteză, coridoarele prezentate mai sus, rezultate din obiectivele feroviare de conectivitate ale României, însumează aproximativ 3.800 km, dintre care 580 km de cale ferată au fost modernizați

(primul semestru al anului 2021), 253 km se află în diverse faze de implementare, iar peste 2.900 km sunt în faza de concept. Din totalul de 3.800 km, coridoarele de conectivitate feroviară reprezintă 3.244 km, inter-coridoarele de conectivitate feroviară reprezintă 231 km și 327 km sunt reprezentați de coridoarele feroviare transfrontaliere (tabelul 2.2.11).

Tabelul 2.2.11. Sinteza lungimilor coridoarelor și inter-coridoarelor (lungimile sunt exprimate în km)

Nr. Crt.	Lungime coridor	Total	Operare	Construcție	Proiect
		km	km	km	km
1	Coridoare Conectivitate	3244.3	580.5	253.8	2410.0
2	Inter-coridoare Conectivitate	231.0	0.0	0.0	231.0
3	Coridoare Transfrontaliere	327.8	0.0	0.0	327.8
	Total	3803.1	580.5	253.8	2968.8

Valoare totală a proiectelor de-a lungul coridoarelor este de 19.4 mld.EUR (23.1 mld.EUR cu TVA), dintre care 16.9 mld.EUR (20.1 mld.EUR cu TVA) reprezintă proiectele de-a lungul coridoarelor feroviare de conectivitate, 1.3 mld.EUR (1.5 mld.EUR cu TVA) reprezintă costul pentru modernizarea inter-coridoarelor feroviare de conectivitate, iar 1.2 mld.EUR (1.4 mld.EUR cu TVA) reprezintă necesarul financiar pentru implementarea proiectelor de-a lungul coridoarelor feroviare transfrontaliere (tabelul 2.2.12).

Tabelul 2.2.12. Sinteza costurilor totale pentru implementarea proiectelor din lungul coridoarelor

Nr. Crt.	Costuri coridoare	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	Total Coridoare Conectivitate	16966.8	20190.4
2	Total Inter-coridoare Conectivitate	1306.5	1554.7
3	Total Coridoare Transfrontaliere	1182.3	1406.9
	Total	19455.5	23152.1

Definirea rețelei feroviare din România

Complementaritatea rețelei feroviare cu cea rutieră trebuie realizată printr-o dezvoltare integrată și unitară. Prin analogie cu metodologia folosită pentru definirea rețelelor aferente sectorului rutier, a fost realizată o analiză ce vizează stabilirea tipurilor de rețele feroviare din România și poziționarea căilor ferate. Definirea rețelelor feroviare vizează, pe de-o parte concentrarea investițiilor și intervențiilor pentru așa numita *închidere a coridoarelor*, ceea ce va avea ca rezultat canalizarea investițiilor pentru îndeplinirea acestui deziderat.

Pentru atingerea Țintelor propuse și pentru valorificarea superioară a beneficiilor pe care le poate furniza calea ferată, atât pentru traficul de călători cât și pentru cel de marfă, au fost definite trei tipuri de rețele, în baza analizelor din cadrul MPGT, dar și în corelare cu obiectivele de conectivitate feroviară specifice coridoarelor prezentate mai sus, după cum urmează:

- **Rețeaua feroviară primară** – constituie *rețeaua feroviară de bază* a României în context național (coridoarele de conectivitate feroviară) și european (coridoarele TEN-T din România);
- **Rețeaua feroviară secundară** – se constituie atât dintr-o rețea de complementaritate a rețelei primare, cât și dintr-o rețea de legătură între aceasta și rețeaua terțiară;
- **Rețeaua feroviară terțiară** – este reprezentată de căile ferate complementare care se conectează direct la rețeaua feroviară secundară și asigură legătura sistemică a orașelor mici cu celelalte rețele.

Sectorul feroviar – rețeaua primară

Rețeaua feroviară primară îndeplinește următoarele funcții:

- Conectivitate între regiunile și provinciile istorice ale României;
- Conectivitate între centrele economice populate și centrele industriale importante;
- Conectivitate cu punctele de trecere ale frontierei către statele vecine (treceri de frontieră și porturi importante);
- Coridoare de o importanță majoră, din punct de vedere economic, caracterizate printr-o capacitate mare care permite transportul persoanelor și a mărfurilor;
- Coridoare de importanță europeană, pentru asigurarea tranzitului de pasageri și a schimbului de mărfuri cu statele vecine;
- Coridoare de conectivitate, inter-coridoarele de conectivitate și coridoarele transfrontaliere;
- Prezintă un potențial major de dezvoltare, prin implementarea unor intervenții și a unor măsuri de management.

Având la bază criteriile prezentate mai sus, **rețeaua feroviară primară** conectează toate regiunile de dezvoltare și cei mai importanți poli de creștere economică din România. Rețeaua feroviară primară traversează lanțul montan carpatic prin 6 sectoare de cale ferată: Dr. Tr Severin – Caransebeș, Comarnic – Brașov, Gura Humorului – Ilva Mică, Cluj-Napoca – Aleșd, Deva – Radna, respectiv între Apața și Cața ceea ce creează premisele unor conexiuni valoroase din punctul de vedere economic și al impactului asupra mediului (figura 2.2.4).

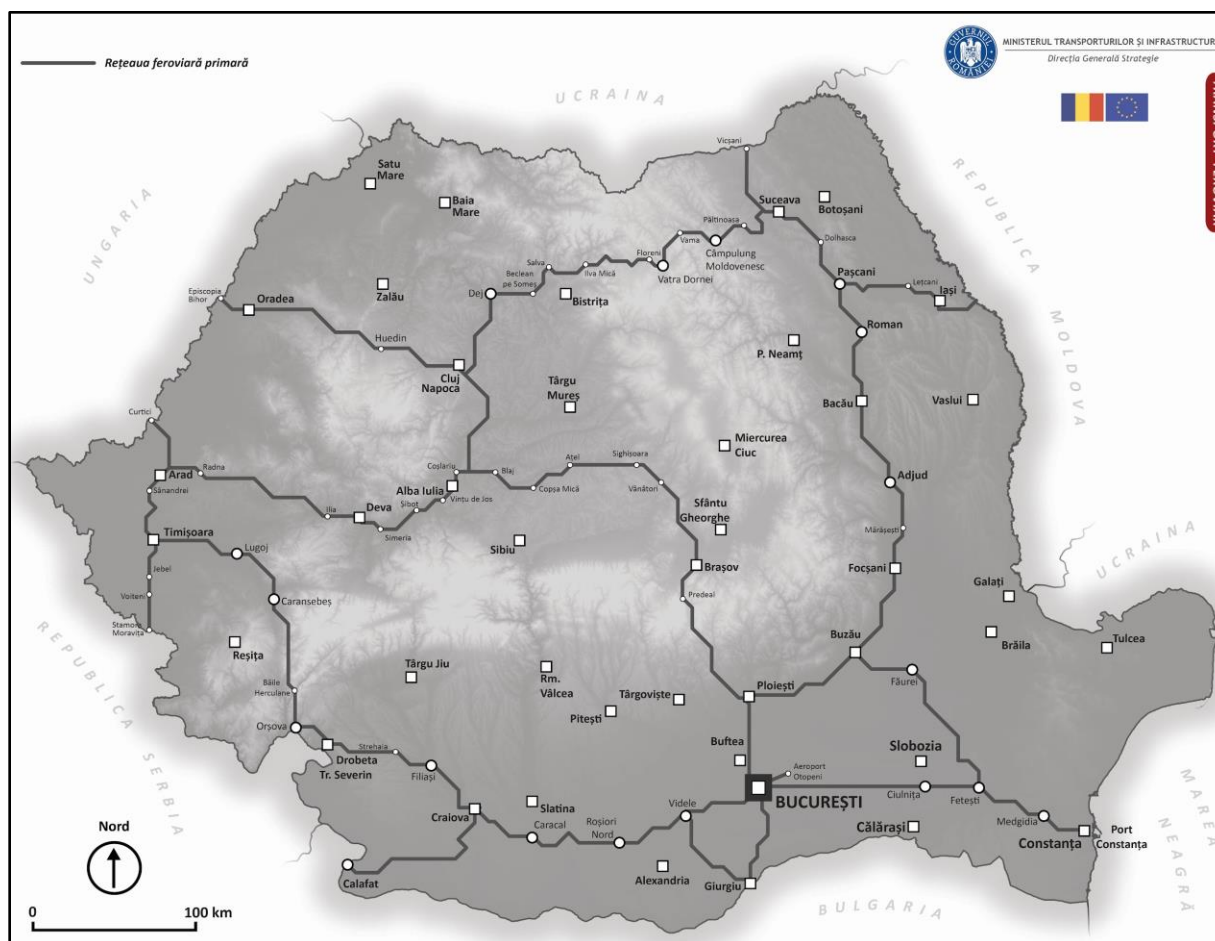


Figura 2.2.4. Harta rețelei feroviare primare

Rețeaua feroviară primară prezintă o dispunere unitară și echilibrată la nivelul țării noastre, în strânsă conexiune cu fluxurile de mărfuri transportate pe calea ferată. Prin modernizarea rețelei feroviare primare se creează premisele unei dezvoltări economice sustenabile, bazate pe o mobilitate constantă asigurată de transportul pe calea ferată.

Pe de altă parte, rețeaua feroviară primară se suprapune întregii rețele europene TEN-T Core și în parte rețelei TEN-T Comprehensive din România, contribuind astfel la dezvoltarea mobilității feroviare generale, atât la nivel național cât și la nivel european. Pe de altă parte, rețeaua feroviară primară se suprapune, în întregime, celor două coridoare europene de transport multimodal: Coridorul TEN-T Rin-Dunăre (cu ambele ramuri) și Coridorul TEN-T Orient East-Med (figura 2.2.5).

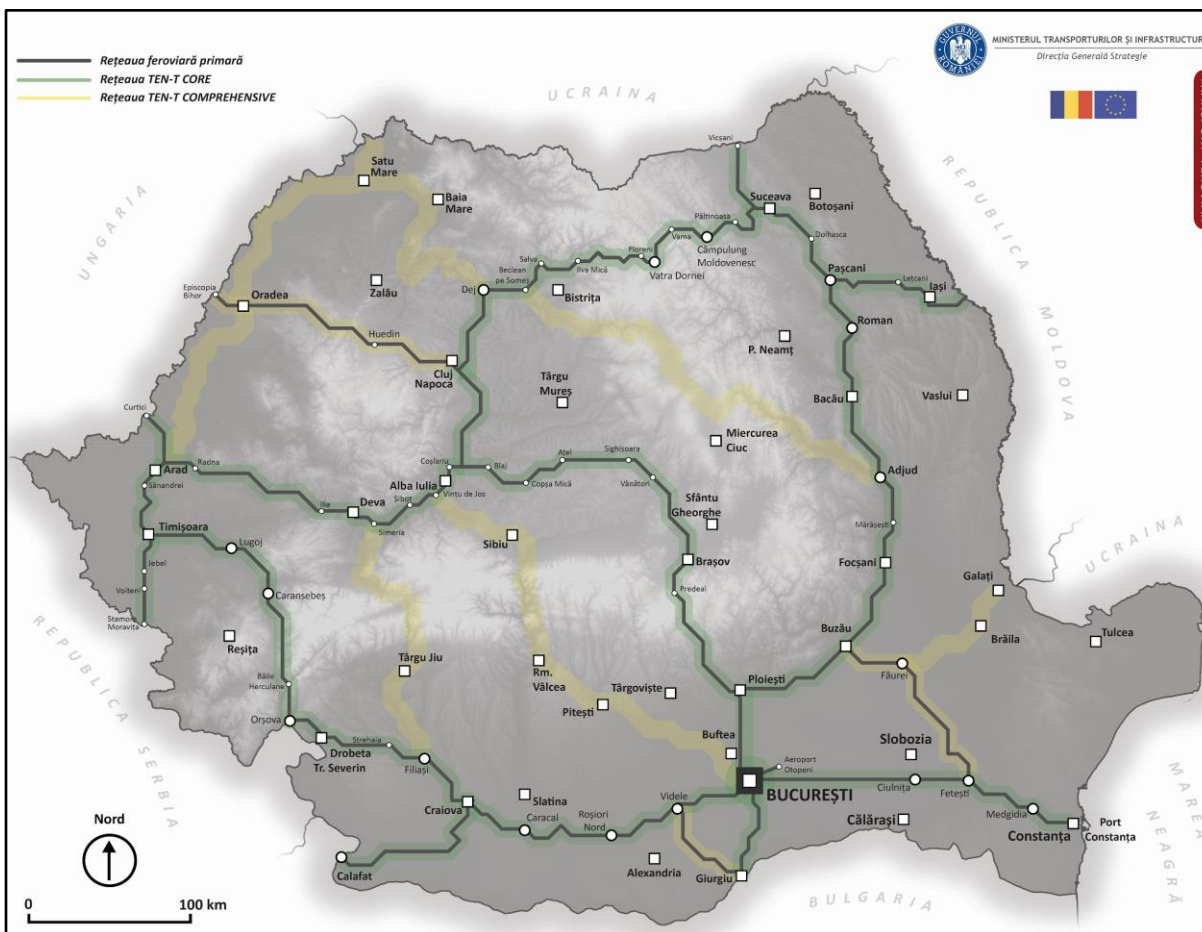


Figura 2.2.5. Harta rețelei feroviare primare în relație cu rețeaua TEN-T din România

Sectorul feroviar – rețeaua secundară

Rețeaua feroviară secundară are funcție de complementaritate cu rețeaua feroviară primară, dar și de asigurare a legăturilor funcționale între aceasta și rețeaua feroviară terțiară. Rețeaua feroviară secundară asigură conectivitatea unor zone economice importante, respectiv (figura 2.2.6):

- Calea ferată 202 dublă/simplă electrificată Filiași – Tg. Jiu – Petroșani - Simeria (asigură accesibilitatea spre și de la bazinul lignitifer Motru - Rovinari și huilifer Petroșani);
- Calea ferată 901 simplă neelectrificată Pitești – Slatina – Craiova (accesul facil la două centre industriale, importante pentru industria constructoare de automobile, dar și la o importantă fabrică de producție a aluminiului);
- Calea ferată 700 dublă electrificată Făurei – Brăila – Galați (conectează două importante porturi fluvio-maritime, dar și cel mai mare combinat siderurgic din România);
- Calea ferată simplă 906, 201, 200 neelectrificată Pitești – Rm. Vâlcea – Sibiu – Vințu de Jos (o alternativă la coridorul feroviar central, însă cu un sector lipsă între Vâlcele și Rm. Vâlcea);

- Calea ferată simplă 310, 402, 400 neelectrificată Arad – Oradea – Satu Mare – Baia Mare – Dej (reprezintă o axă feroviară importantă în partea de vest a țării, cu potențial de dezvoltarea a traficului, atât de călători cât și de marfă).

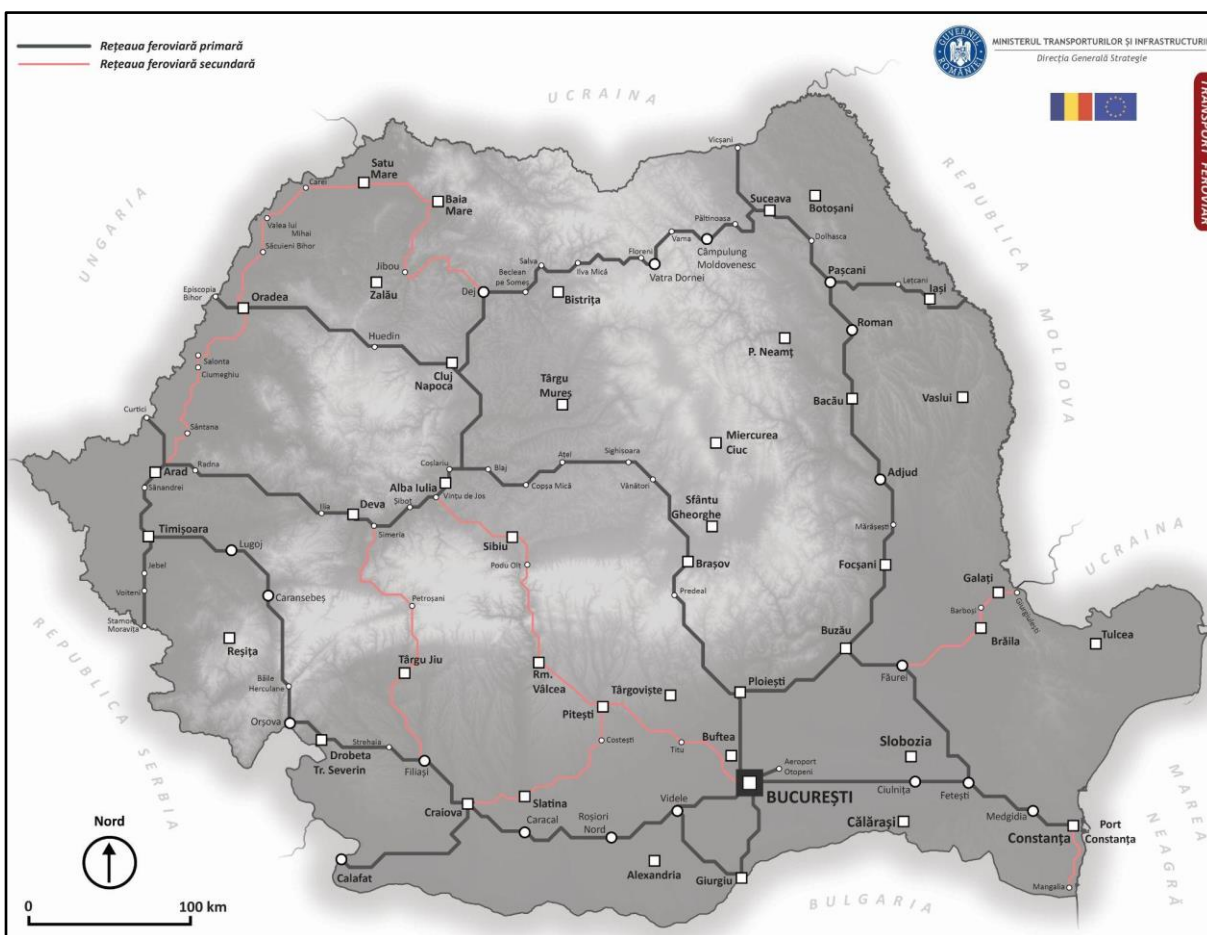


Figura 2.2.6. Harta rețelei feroviare secundare în raport cu rețeaua primară

Stabilirea listei de proiecte

a) rețeaua primară

Lista proiectelor de pe rețeaua primară reprezintă, în fapt, toate intervențiile vitale de modernizare a infrastructurii care au ca scop îmbunătățirea semnificativă a principalelor parametrii de viteză, capacitate, confort, siguranță în armonie cu elementele de mediu. Lista proiectelor de pe rețeaua primară a fost generată având la bază atât nevoile de conectivitate feroviară și complementaritate cu celelalte moduri de transport, dar și în corelație directă cu coridoarele TEN-T din România și coridoarele de conectivitate feroviară. Așadar, putem remarca faptul că această listă de proiecte reprezintă prioritatea primară de intervenție pentru realizarea unor legături feroviare moderne și pentru generarea efectului de coridor.

Lista proiectelor feroviare de pe rețeaua primară a fost generată prin excluderea din cadrul coridoarelor de conectivitate și a rețelei primare a sectoarelor de cale ferată care au fost

modernizate și se află deja în operare. Pe de altă parte, lista de proiecte conține atât proiecte care sunt în faza de concept (neavând practic niciun demers de implementare), dar și proiecte care sunt în diverse faze de construcție sau care au contracte de lucrări semnate.

Lista proiectelor localizate pe rețeaua primară cuprinde 26 de sectoare de cale ferată din lungul coridoarelor, în lungime de aproximativ 3222 km. Dintre acestea, 22 de proiecte aparțin rețelei TEN-T Core, iar 4 rețelei TEN-T Comprehensive (tabelul 2.2.13). Intervențiile propuse constau în lucrări de modernizare sau reînnoire, respectiv electrificare și dublare dacă este cazul. Costul total estimat este de aproximativ 19.4 mld. EUR (23.1 mld. EUR cu TVA).

Tabelul 2.2.13. Lista proiectelor localizate pe rețeaua primară

Nr. Crt.	Proiect rețea primară	Rețea TEN-T	Tip Intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)
1	Port Constanța - Palas	Core	M+D	180.0	727.4	865.6	4.0
2	Constanța - București	Core	M	0.0	64.8	77.1	n/a
3	Complex feroviar București	Core	M+E+D	600.0	1000.0	1190.0	1.7
4	Predeal - Brașov	Core	M	27.0	630.0	749.7	23.3
5	Brașov - Sighișoara	Core	C	112.6	1535.0	1826.7	13.6
6	Simeria - Gurasada - km.614	Core	C	141.2	1888.0	2246.7	13.4
7	Giurgiu Frontieră - București	Core	M+E	99.0	577.7	687.4	5.8
8	Ploiești Triaj - Focșani	Core	M	143.0	572.0	680.7	4.0
9	Focșani - Roman	Core	M	147.0	588.0	699.7	4.0
10	Roman - Pașcani	Core	M	41.0	164.0	195.2	4.0
11	Pașcani - Suceava - Dărmănești	Core	M	71.0	284.0	338.0	4.0
12	Dărmănești - Vicșani Frontieră	Core	M+E	34.0	57.0	67.8	1.7
13	București - Craiova	Core	M	209.0	1254.0	1492.3	6.0
14	Craiova - Dr.Tr.Severin - Caransebeș	Core	M+D parțial	234.0	2110.1	2511.0	9.0
15	Caransebeș - Timișoara - Arad	Core	M+D	155.0	1499.9	1784.9	9.7
16	Suceava - Ilva Mică	Core	M	191.0	1807.5	2150.9	9.5
17	Ilva Mică - Apahida	Core	M	119.0	714.0	849.7	6.0
18	Cluj Napoca - Ep. Bihor Frontieră	Comprehensive	M+E	160.0	1493.4	1777.1	9.3
19	Teiuș - Cp. Turzii	Core	M	51.0	306.0	364.1	6.0
20	Cp. Turzii - Apahida (Cluj Napoca)	Core	M	51.0	484.5	576.6	9.5
21	Buzău - Făurei	Comprehensive	R	40.0	160.0	190.4	4.0
22	Făurei - Fetești	Comprehensive	R	89.0	356.0	423.6	4.0
23	Pașcani - Iași - Ungheni	Core	M+E parțial	97.0	388.0	461.7	4.0
24	Timișoara - Stamora Moravița Fr.	Core	M+E	56.0	120.0	142.8	2.1
25	Craiova - Calafat	Core	M+E	107.8	561.3	667.9	5.2
26	Videle - Giurgiu	Comprehensive	R+E	67.0	113.0	134.5	1.7
Total				3222.6	19455.5	23152.1	
Legendă							
M		Lucrări de modernizare CF					
E		Lucrări de electrificare CF					
D		Lucrări de dublare CF					

C	Construcție în curs
R	Lucrări de reînnoire

Având în vedere importanța rețelei primare pentru transportul pe calea ferată, atât în context național cât și european, majoritatea eforturilor au fost îndreptate în intervenții asupra proiectelor localizate pe această rețea. Atât modernizările deja realizate sau în curs de realizare, cât și cele care sunt în pregătire vizează în special rețeaua primară, iar lucrările de reînnoire se vor realiza pe rețeaua secundară (figura 2.2.7).

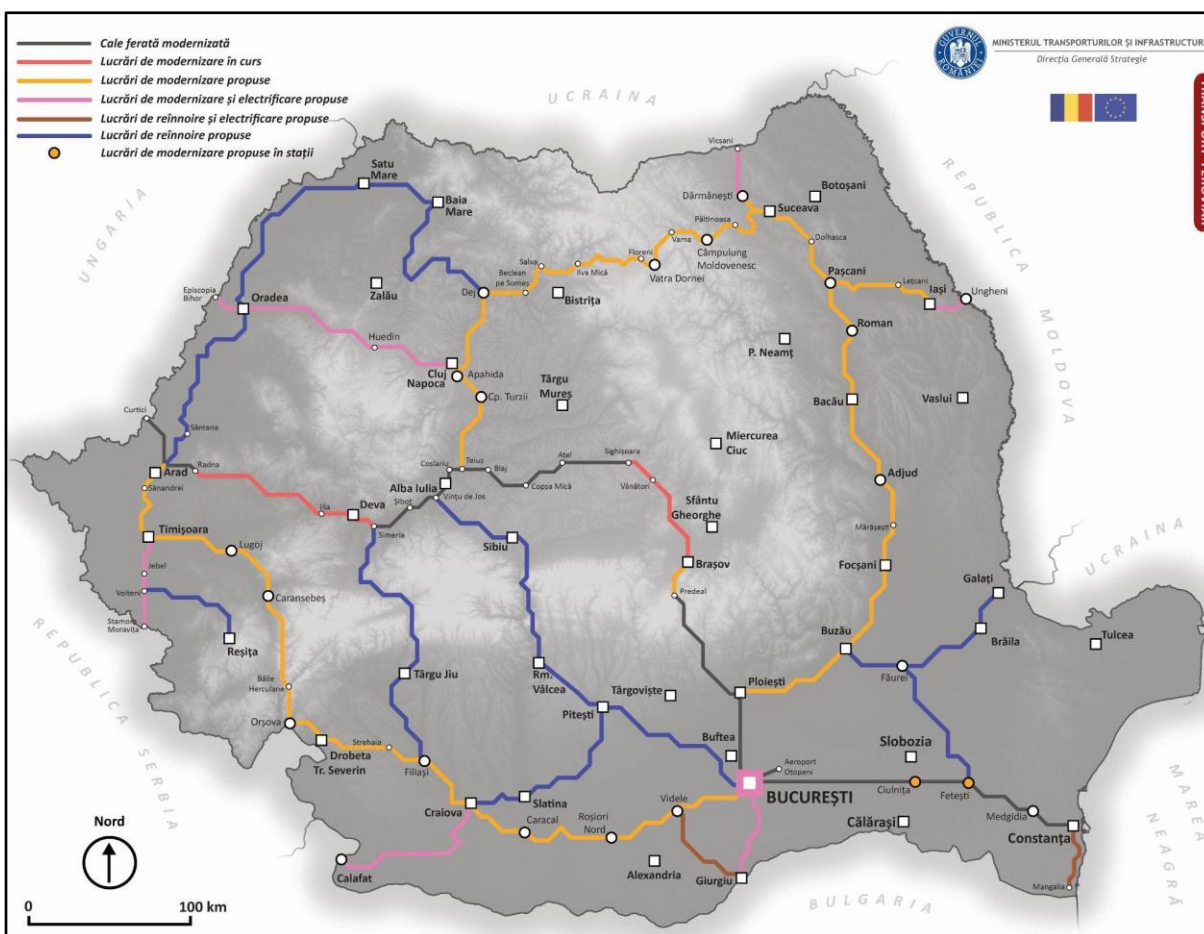


Figura 2.2.7. Harta intervențiilor pe rețeaua feroviară primară

b) rețeaua secundară

În baza analizei făcute în Master Planul General de Transport al României, în complementaritate și sinergie cu proiectele aflate pe rețeaua primară, a fost stabilită lista proiectelor de cale ferată care aparțin rețelei secundare. Acestea au valențe economice și sociale ridicate și asigură conectivitatea feroviară la rețeaua primară atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de marfă. Cele 7 proiecte propuse în cadrul rețelei feroviare secundare au o lungime totală de aproximativ 1.271 km și un cost estimat de aproximativ 3.4 mld. EUR (4.05 mld. EUR cu

TVA). Intervențiile propuse sunt de tipul reînnoirilor, respectiv dublări și electrificări dacă este cazul. Proiectele aparțin preponderent rețelei TEN-T Comprehensiv (tabelul 2.2.14).

Tabelul 2.2.14. Lista proiectelor localizate pe rețeaua secundară

Nr. Crt.	Proiect rețea secundară	Rețea TEN-T	Tip Intervenții	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu (mil.EUR/km)
1	Constanța - Mangalia	<i>Propunere Comprehensive</i>	R+E+D parțial	43.0	123.0	146.4	2.9
2	Arad - Oradea	<i>Comprehensive</i>	R	121.0	217.6	258.9	1.8
3	Oradea - Satu Mare - Baia Mare - Dej	<i>Comprehensive</i>	R	326.0	567.8	675.7	1.7
4	Făurei - Brăila - Galați	<i>Comprehensive</i>	R	91.0	364.0	433.2	4.0
5	București - Pitești - Sibiu - Vințu de Jos	<i>Comprehensive</i>	R	340.0	1048.0	1247.1	3.1
6	Filiași - Tg.Jiu - Petroșani - Simeria	<i>Comprehensive</i>	R	208.0	853.3	1015.4	4.1
7	Pitești - Slatina - Craiova	<i>Altă rețea</i>	R	142.0	227.2	270.4	1.6
Total				1271.0	3400.9	4047.1	

Pentru rețeaua feroviară secundară sunt prevăzute intervenții de tipul reînnoiri, dar și electrificare și dublare pe anumite secțiuni pentru proiectul de cale ferată Constanța - Mangalia (figura 2.2.8).

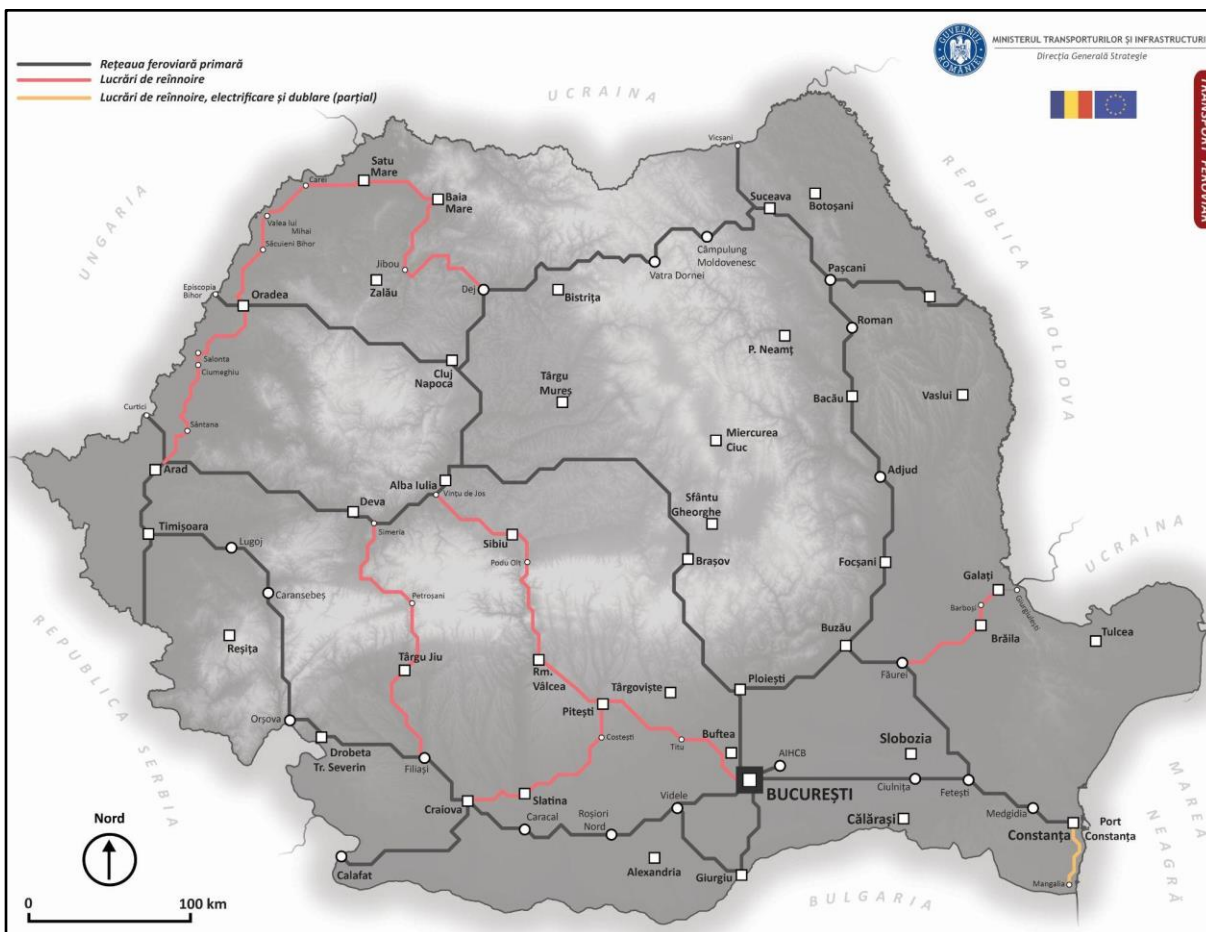


Figura 2.2.8. Harta intervențiilor pe rețeaua feroviară secundară

Așadar, proiectele feroviare aflate pe rețeaua primară și pe cea secundară asigură o conectivitate directă sau indirectă a centrelor urbane și economice din România printr-o repartitie echitabilă a investițiilor la nivelul tuturor regiunilor.

Rețelele feroviare primare și secundare se suprapun în cea mai mare parte rețelei feroviare TEN-T (Core și Comprehensive). Rețeaua TEN-T Core este acoperită în totalitate de rețeaua primară din România, iar cea mai mare parte din rețeaua Comprehensive este acoperită fie de rețeaua primară (Cluj-Napoca - Oradea - EP. Bihor, Videle - Giurgiu, Buzău - Făurei), fie de rețeaua secundară. De asemenea, două sectoare din rețeaua secundară (Constanța - Mangalia și Pitești - Craiova, ambele legături la coridorul TEN-T Core) sunt propuse să facă parte din rețeaua TEN-T Comprehensive în baza revizuirii rețelei din 2022 (figura 2.2.9).

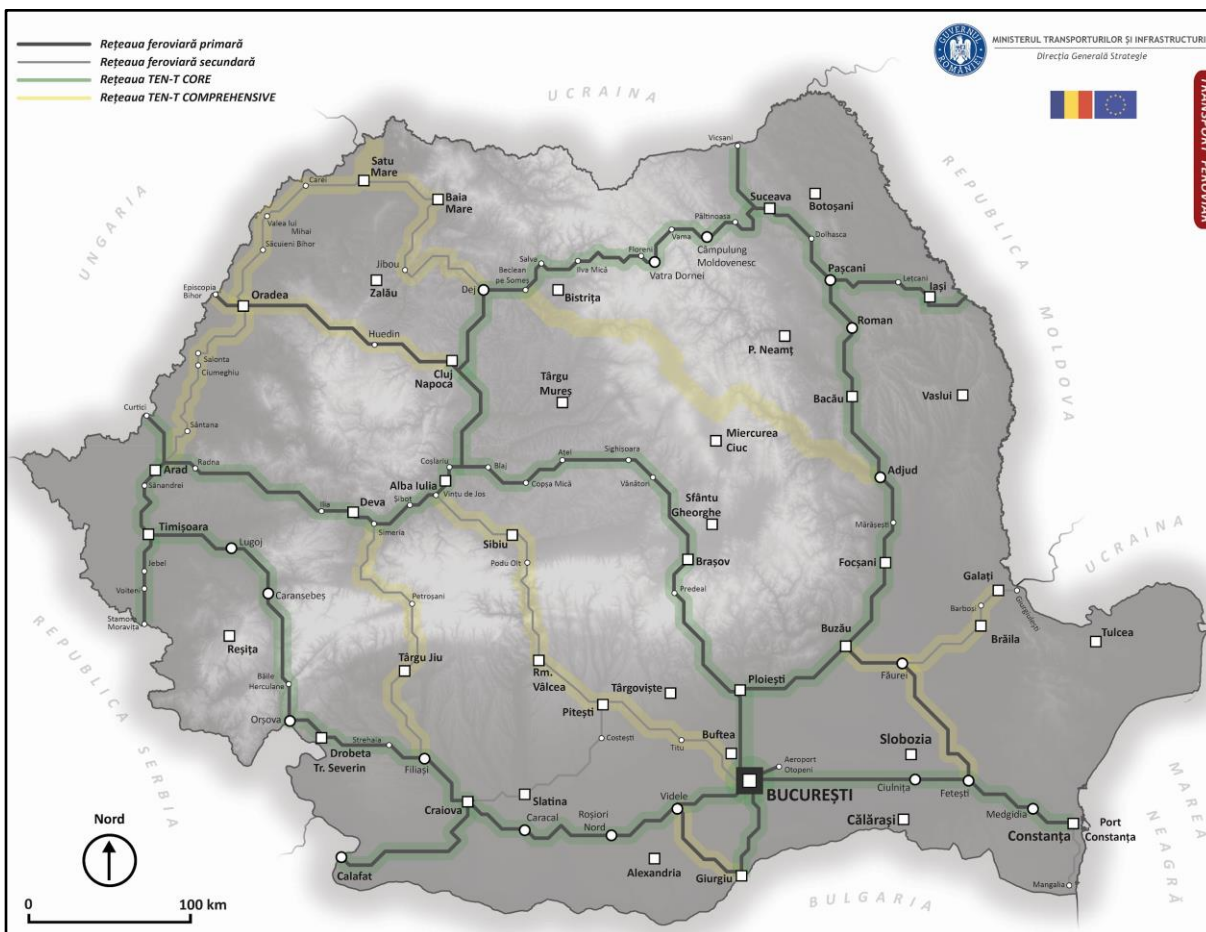


Figura 2.2.9. Harta relației dintre rețeaua feroviară primară și cea secundară cu rețeaua feroviară TEN-T din România

Investițiile din sectorul feroviar cuprind și alte intervenții care să contribuie la implementarea conceptului de alegere modală feroviară în contextul creșterii calității serviciilor feroviare. Cele 7 proiecte feroviare complementare modernizării/reînnoirii infrastructurii feroviare se referă la:

- 1) Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei linii de mare viteză Constanța - București - Budapesta (HSR);
- 2) Lucrări pentru creșterea vitezei la peste 160 km/h pe coridoarele modernizate;
- 3) Studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcele - Rm. Vâlcea;
- 4) Modernizare stații de cale ferată;
- 5) Modernizarea Gării de Nord;
- 6) Modernizare poduri, podețe și tuneluri;
- 7) Elemente de siguranță feroviară.

1) Realizarea unui SF pentru construcția unei linii de mare viteză Constanța - București - Budapesta (HSR)

Calea ferată de mare viteză reprezintă o alternativă economică sustenabilă, precum și pentru protecția și conservarea mediului, fapt dovedit prin extinderea continuă a rețelei (High Speed Rail - HSR / Tren de Mare Viteză - TMV) în Europa. Astfel, trenurile de mare viteză au devenit un concurent redutabil pentru transportul aerian pe distanțe medii și lungi atât în țările Europei Centrale și de Vest, cât și între ele. Exemple precum „InterCity-Express” - ICE din Germania sau între Germania, Austria, Elveția, Belgia și Regatul Țărilor de Jos sau TGV (Train à Grande Vitesse)/Thalis/Eurostar între Franța, Belgia, Marea Britanie și Regatul Țărilor de Jos reprezintă veritabile modele de succes pentru construirea căilor ferate de mare viteză și introducerea unor servicii feroviare superioare, confortabile, sigure și rapide.

În acest context, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii manifestă interes pentru o legătură feroviară de mare viteză sau cu viteză sporită (superioară vitezei de 200 km/h) care să conecteze zona Constanța / Port Constanța cu capitala României și mai departe cu Budapesta și implicit cu rețeaua europeană de cale ferată modernă.

Acest deziderat este impus și prin documentul strategic de programare a investițiilor în infrastructură, respectiv MPGT. Astfel, în acest document se stipulează că:

În măsura în care România va beneficia de alocări financiare suplimentare pentru sectorul feroviar în scopul dezvoltării rețelei de linii de mare viteză sau va face parte dintr-un program european transfrontalier cu alocare financiară dedicată căilor feroviare de mare viteză, beneficiarul va putea implementa un proiect de HSR (High Speed Rail / Tren de Mare Viteză). Calea ferată de mare viteză va avea un traseu care va conecta rețelele feroviare asemănătoare din țările vecine, dar și marile centre urbane din România. Construcția liniilor de cale ferată de mare viteză se va face pe aliniamente noi, fără a utiliza infrastructura feroviară actuală cu care va avea doar legături de conectivitate.

Astfel, pentru a atinge acest deziderat, în Planul Investițional este propusă realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei căi ferate de mare viteză pe axa est-vest care să se suprapună cât mai puțin cu investițiile feroviare realizate sau în curs de realizare.

Obiectivele principale vizate sunt următoarele:

- a) Conectarea României la rețeaua feroviară europeană de mare viteză;
- b) Conectarea marilor centrelor urbane România prin cale ferată de mare viteză.

Studiul de fezabilitate ar trebui să evidențieze printre altele:

- sustenabilitatea investiției (analiza cost-beneficiu);
- deservirea principalelor centre urbane și a polilor de creștere pe direcția sud est – nord vest;
- să aibă în vedere faptul de a nu dubla alte investiții care au obiectiv asemănător (modernizarea în curs a coridorul feroviar Rin - Dunăre);
- analiza formelor de relief, impactul asupra mediului și propunerea de soluții pentru sectoarele critice identificate;

- să se realizeze în baza unor studii de teren specifice (geologice, topografice și de mediu);
- să prevadă viteza de operare a trenurilor: mare viteză / viteză sporită (200 km/h, 250 km/h, 300 km/h, peste 300 km/h).

În urma unei analize preliminare realizată de către experții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au rezultat două potențiale abordări:

- a. Un aliniament sustenabil din punct de vedere economic și social pentru dezvoltarea unei căi ferate de mare viteză / viteza sporită ar fi: București – Pitești – Curtea de Argeș – Sibiu – Mediaș – (Tg. Mureș) – Cluj-Napoca – Zalău – Oradea - Episcopia Bihor. Această soluție ar urma să fie validată de rezultatele studiului de fezabilitate. Lungimea căii ferate de mare viteză are o lungime de aproximativ 590 km și ar urma să aibă un cost estimat de 25 - 30 mil. EUR/km (ceea ce ar conduce la un cost estimat al investiției de aproximativ 17 mld.EUR).
- b. Un aliniament hibrid ce include secțiuni modernizate la nivelul 160 km/h pentru o parte a traseului (traversări montane, culoare existente), respectiv aliniament nou cu viteză de peste 200 km/h în funcție de aspectele geografice și cele de rentabilitate economică pe anumite porțiuni ale traseului.

În acest context, este propusă realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția primei căi ferate de mare viteză din România cu un cost estimat de 120 mil. EUR (142 mil. EUR cu TVA).

2) Lucrări pentru creșterea vitezei la peste 160 km/h pe coridoarele modernizate

Acest proiect este propus pentru valorificarea superioară a sectoarelor de cale ferată modernizate sau în curs de modernizare în contextul implementării și operaționalizării instalației ETCS/ERTMS, dar și în sinergie cu investițiile pentru achiziția de material rulant nou sau pentru modernizarea celui existent. Astfel, investiția prevede analize, studii, teste, dar și lucrări pentru creșterea vitezei de circulației a trenurilor de călători la peste 160 km, în special pe sectoarele în care geometria actuală a căii ferate este una permisivă (în palier și în aliniament). În stabilirea nevoii financiare de aproximativ 70 mil. EUR (83.3 mil. EUR cu TVA) au fost incluse și lucrări de supraînălțare a firului exterior în curbe, eliminarea unor treceri la nivel sau alte intervenții care să permită circulația trenurilor cu viteze superioare.

3) Studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcele - Rm. Vâlcea

Lista proiectelor feroviare complementare cuprinde și realizarea unui studiu cu privire la soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcele - Rm. Vâlcea care să evidențieze mai multe aspecte, printre care:

- analiza stadiului juridic al contractului de lucrări existent;

- analiza și evaluarea stadiului lucrărilor realizate (stabilirea degradărilor în perioada de conservare);
- revizuirea analizelor economice și a soluțiilor tehnice propuse în studiile existente;
- propunerea unei soluții economice viabile pentru finalizare sau conservarea proiectului.

Pentru realizarea acestui studiu a fost estimat un necesar de 5 mil. EUR (6 mil. EUR cu TVA).

4) Modernizare stații de cale ferată, depouri și revizii de vagoane

La fel ca și în Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în Programul Operațional Transport este propus un pachet de 30 de stații CF care urmează a fi modernizate. Valoarea pachetului a fost estimată la 90 mil. EUR (107.1 mil. EUR cu TVA). Stațiile propuse pentru modernizare vor fi localizate pe sectoarele de cale ferată cu lucrări de modernizare/reînnoire realizate sau în curs de realizare.

5) Modernizarea Gării de Nord

Stațiile de cale ferată din Europa reprezintă veritabile hub-uri/centre multimodale pentru transportul de pasageri, acest fapt având un important rol în viața cotidiană a orașelor. Noile concepte de mari stații de cale ferată au devenit rapid foarte atractive pentru pasageri prin prisma numeroaselor facilități pe care le oferă, veritabile mall-uri cu peroane de cale ferată, veritabili poli de atracție pentru petrecerea timpului liber nu doar pentru călătorii care utilizează serviciile feroviare.

În acest context, Gara de Nord, cel mai mare nod feroviar din România, poate să devină prin amplasamentul său în oraș și prin numărul mare de pasageri care o tranzitează, cel mai important hub/centru multimodal din țară și un important furnizor de servicii al orașului. Gara de Nord devine astfel o placă turnantă între pasagerii care folosesc serviciile feroviare de lung parcurs (trenurile care conectează Bucureștiul cu toate municipiile reședință de județ) cu cele feroviare regionale sau metropolitane (în special cele care conectează Gara de Nord cu Aeroportul Henri Coandă), dar și cu serviciile publice de transport urban (două magistrale de metrou, linii de autobuz, linii de troleibuz, linii de tramvai, linii expres).

Conceptul de stație CF de tip CityRail prevede realizarea unui spațiu modern comercial, cultural, multimodal și multifuncțional integrat architectural în zona în care se află.

De asemenea, în cadrul acestei investiții este prevăzută și modernizarea depoului București Călători și a grupei tehnice Grivița pentru asigurarea unor condiții de staționare, stocare, pregătirea și întreținere superioare pentru viitoarele trenuri noi și moderne (inclusiv pentru trenurile cu hidrogen) achiziționate cu fonduri europene nerambursabile (POIM, POT, PNRR sau alte surse de finanțare).

Estimarea financiară pentru modernizarea Gării de Nord și a depoului/grupei tehnice este de 300 mil. EUR (357 mil. EUR cu TVA).

6) Modernizare poduri, podețe și tuneluri

Acest proiect reprezintă continuarea proiectului finanțat prin POIM 2014-2020 și are ca principal scop creșterea vitezei de circulație a trenurilor în condiții de siguranță pe sectoarele cu lucrări de artă. Pachetul de poduri, podețe și tuneluri va fi stabilit în urma unei evaluări care trebuie să țină cont de următoarele elemente:

- apartenența structurilor la rețeaua feroviară TEN-T;
- diferența dintre viteza proiectată și viteza actuală (restricționată) pentru trenurile care utilizează structura;
- tipul de cale ferată nemodernizată, modernizată, în curs de modernizare sau propusă spre modernizare/reînnoire pe care se află structura;
- numărul de trenuri care tranzitează structura.

Implementarea proiectului se poate face fie prin coordonare centrală, fie la nivelul sucursalelor regionale de cale ferată.

Costul estimat pentru această intervenție este de 450 mil.EUR (535 mil.EUR cu TVA).

7) Elemente de siguranță feroviară

Proiectul prevede evaluarea unor sectoare de cale ferată în care recurența persoanelor accidentate de tren este mare, dar și identificarea și implementarea de soluții moderne pentru reducerea sau eliminarea acestor puncte (amplasarea de garduri de protecție în zonele în care persoanele traversează calea ferată, construcția de pasaje pietonale). Totodată, pentru stațiile terminus, evaluarea și implementarea soluțiilor de siguranță va prevedea instalarea de opritoare hidraulice moderne. În funcție de disponibilitatea alocărilor financiare, pot fi incluse în aceste intervenții și proiecte care privesc echipamentele și infrastructuri pentru probe, încercări și teste gestionate de către Autoritatea Feroviară Română (AFER). De asemenea, în cadrul acestui capitol pot fi incluse și investiții în Centrul de Testări Feroviare de la Făurei.

Costul estimat pentru această investiție este de 75 mil.EUR (89.3 mil.EUR cu TVA).

Toate aceste intervenții complementare, prezentate mai sus, au o valoare estimată de aproximativ 1272 mil.EUR (1513.7 mil.EUR cu TVA) (tabelul 2.2.15).

Tabelul 2.2.15. Alte proiecte feroviare propuse pentru dezvoltarea transportului feroviar

Nr. Crt.	Alte proiecte feroviare	Rețea TEN-T	Tip Intervenție	Unitate de măsură	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR)
1	Studiu/documentații pentru tren de mare viteză Constanța - București - Budapesta (HSR)	TEN-T Core	realizare SF	600 km	120.0	142.8	0.2
2	Lucrări pentru creșterea vitezei la peste 160 km/h pe coridoarele modernizate	TEN-T Core	SF dacă este cazul și lucrări	n/a	70.0	83.3	n/a

3	Studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcele - Rm. Vâlcea	TEN-T Comp.	analize, evaluări și studii de teren	38 km	5.0	6.0	n/a
4	Reabilitare stații, depouri și revizii de vagoane	TEN-T Core TEN-T Comp.	SF și lucrări	n/a	90.0	107.1	3.0
5	Modernizare Gara de Nord	TEN-T Core	modernizare gara tip City Rail	1 stație	300.0	357.0	n/a
6	Reabilitare poduri, podețe și tuneluri	TEN-T Core TEN-T Comp.	SF și lucrări	8 sucursale	450.0	535.5	n/a
7	Elemente de siguranță feroviară inclusiv modernizarea Centrului de Testări Feroviare Făurei	TEN-T Core TEN-T Comp.	opritoare, garduri de protecție	n/a	75.0	89.3	n/a
8	Proiect de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată	TEN-T Core TEN-T Comp.	modernizare treceri la nivel	n/a	162.0	192.8	n/a
Total					1272.0	1513.7	

Pentru creșterea atractivității transportului de călători pe calea ferată și pentru valorificarea superioară a coridoarelor de cale ferată modernizate sau reînnoite au fost propuse, în conformitate cu Master Planul General de Transport al României, mai multe achiziții care vizează înnoirea parcului de material rulant (vagoane, locomotive, rame electrice), investiții în noi vehicule feroviare și modernizări ale celui existent. Astfel, în continuarea investiției de rame electrice de tip RE-IR și RE-R finanțate prin POIM și a celor propuse prin PNRR (locomotive și rame electrice noi, modernizarea de locomotive electrice și vagoane), prin PI se propune achiziția a 151 de trenuri noi cu o valoare estimată de 750 mil.EUR (892 mil.EUR cu TVA). Aceste trenuri de tip RE-R vor fi utilizate pentru trenurile de scurt și mediu parcurs, în special pentru traficul de navetă în contextul transferului acestui tip de deplasare din domeniul rutier spre cel feroviar (tabelul 2.2.16). Ramele electrice vor fi dotate cu sisteme de informare în timp real al pasagerilor, echipamente WiFi, camere de tip CCTV (Closed-circuit television) pentru siguranța pasagerilor și împotriva vandalismului, iar parte dintre rame să fie prevăzute cu spații de depozitare biciclete/schiuri și cu adaptări pentru persoane cu mobilitate redusă și nevoi speciale.

Tabelul 2.2.16. Achiziție material rulant feroviar

Nr. Crt.	Achiziție material rulant	Tip intervenție	Nr. trenuri	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR)
1	Trenuri de tip RE-R de scurt parcurs cu 2 și 3 unități (în afara celor prevăzute a fi achiziționate din POIM și PNRR)	Achiziție trenuri noi	151	750	892.5	4.97
Total				750	892.5	

Pentru a stabili nevoia de finanțare reală pentru dezvoltarea sectorului feroviar, este importantă includerea în lista de intervenții a proiectelor feroviare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În scopul eficientizării procesului de realizare a investițiilor în infrastructura feroviară, prin PNRR sunt propuse trei direcții de abordare a intervențiilor:

- a) proiecte de modernizare completă a infrastructurii feroviare;
- b) lucrări de refacere și electrificare pentru restul liniilor, într-o primă fază, urmate de lucrările aferente structurilor, respectiv implementării ERTMS în faza a doua de modernizare;
- c) înnoirea / modernizarea parcului de material rulant cu vehicule feroviare electrice.

Costul estimat al acestor intervenții este de aproximativ 1.5 mld.EUR (1.78 mld.EUR cu TVA) și nu include costul lucrărilor de modernizare / reînnoire și electrificare pentru proiectele cuprinse în rețeaua feroviară primară și cea secundară (Cluj-Napoca - Oradea - Ep. Bihor, Arad - Timișoara - Caransebeș, Constanța - Mangalia, Videle - Giurgiu) (tabelul 2.2.17, figura 2.2.10).

Tipurile de obiective de investiții propuse a fi finanțate prin PNRR sunt următoarele:

1. **Proiecte de modernizare completă** - reprezintă lucrările complete ce includ înlocuire șină, traversă, substrat, electrificare, consolidare/construire poduri/podețe, ERTMS nivel 2 – totul la standardele TEN-T. În ce privește proiectele de modernizare completă, acestea vor include:
 - creșterea capacității cu aproximativ 30%, prin creșterea vitezei de circulație (timp mai scurt de călătorie), creșterea sarcinii pe osie (trenuri mai grele), creșterea indicatorilor de volum călători/km;
 - înlocuirea tracțiunii diesel cu cea electrică (de la 1000t la 2800t);
 - introducerea sistemelor ERTMS.
2. **Proiecte de electrificare** care vizează atât lucrări de electrificare propriu-zisă, cât și lucrări de tip renewal. Intervențiile constau în lucrări de electrificare, centralizare electronică, lucrări de tip renewal și dublare pe anumite segmente, la care se adaugă și achiziția a două drezine - pantograf pentru asigurarea stării de viabilitate a liniei de contact.
3. **Proiecte de reînnoire (renewal)** reprezentând lucrări de înlocuire șină, traversă, piatră spartă, astfel aducându-se linia la viteza constructivă. Aceasta nu include ERTMS, reînnoire poduri, electrificare.
4. **Proiecte de tip Quick Wins** ce vizează lucrări punctuale de eliminare a restricțiilor de viteză, creșterea vitezei de circulație a trenurilor respectiv creșterea siguranței pe calea ferată. Proiectele de tip Quick Wins asigură viabilitatea transportului pe calea ferată în lungul coridoarelor TEN-T până la momentul modernizării acestora. Având în vedere că proiectele Quick Wins vor fi urmate de proiecte de modernizare completă, inclusiv ERTMS, costul modernizării va fi mai mic ca urmare a investițiilor din Quick Wins.

Intervențiile de tip Quick Wins au rol important pentru căile ferate intens circulate, în special de către trenuri de marfă, linii pe care starea de degradare este accelerată. Astfel, intervențiile punctuale de tip Quick Wins au rolul de a permite circulația trenurilor în condiții de siguranță și viabilitate până la momentul implementării proiectelor de modernizare.

Intervențiile de tip Quick Wins prevăd eliminarea restricțiilor de viteză prin lucrări de mică anvergură care constau în îmbunătățirea suprastructurii căii ferate (șina, traversele, aparate de cale, piatră spartă) sau orice alt element care va conduce la creșterea vitezei de circulație pentru trenurile de călători și marfă, cu impact direct și imediat asupra duratei călătoriei și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor.

Prioritare vor fi acele intervenții în care câștigul în minute este cel mai mare (ex: repararea sau schimbarea unui macaz pe care viteza restricționată de circulație este de 30 km/h, localizat pe un sector de cale ferată pe care viteza constructivă este de 120 sau 140 km/h). Sporirea vitezei până la cea stabilită se poate face pentru un sector cu viteză restricționată și prin lucrări de refacție a căii ferate (conform MPGT, 2016).

5. **Proiecte de centralizări electronice (CE) și electro-dinamice (CED)** care prevăd modernizarea instalațiilor aferente căilor ferate (atât a celor din stații, cât și a celor din intersecții) cu rolul de a crește siguranța traficului feroviar, dar și de a crește capacitatea sectoarelor feroviare utilizând echipamente moderne.

Cele mai importante beneficii care rezidă din înlocuirea unei instalații CEM sau necentralizate cu una modernă de tip CE, vizează creșterea siguranței transportului pe calea ferată, reducerea personalului de deservire, creșterea capacității de transport pe calea ferată, eliminarea bottleneck-urilor/zonelor cu blocaje feroviare și rutiere și pregătirea sectorului de cale ferată pentru o îmbunătățire prin instalare ERTMS/ETCS.

Tabelul 2.2.17. Proiecte feroviare din PNRR

Nr. Crt.	Proiecte feroviare PNRR	Tip intervenție	Lungime (km)	Nr. stații / Nr. trenuri	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	București - Pitești	Reînnoire	198	n/a	223.0	265.4
2	Reșița - Voiteni	Reînnoire	65	n/a	53.0	63.1
3	București - Craiova	Quick wins	416	n/a	120.0	142.8
4	Arad - Oradea	Quick wins	121	n/a	8.4	10.0
5	Sibiu - Copșa Mică	Quick wins	45	n/a	5.4	6.4
6	Oradea - Satu Mare - Halmeu	Quick wins	156	n/a	2.6	3.1
7	Apahida - Dej - Baia Mare - Satu Mare	Quick wins	321	n/a	89.7	106.7
8	Dej - Beclean - Ilva Mica	Quick wins	96	n/a	1.8	2.1
9	Adjud - Siculeni	Quick wins	174	n/a	2.4	2.9
10	Filiași - Tg.Jiu - Petroșani - Simeria	Quick wins	292	n/a	14.4	17.1
11	Pitești - Slatina - Craiova	Quick wins	142	n/a	17.1	20.3
12	Coșlariu - Teiuș - Cluj-Napoca	Quick wins	211	n/a	139.4	165.9
13	Mărășești - Tecuci - Bârlad - Vaslui - Iași	Quick wins	189	n/a	50.9	60.6

14	Sărățel – Dej	Centralizare El.	49	7.0	13.0	15.4
15	Timișoara Sud - Voiteni - Stamora Moravița frontieră	Centralizare El.	56	6.0	11.1	13.2
16	Centura București	Centralizare El.	33	6.0	11.1	13.2
17	Războieni - Târgu Mureș	Centralizare El.	47	6.0	11.1	13.2
18	București – Pitești	Centralizare El.	108	13	24.1	28.6
19	Sibiu - Vințu de Jos	Centralizare El.	82	7	13.0	15.4
20	Făurei – Galați	Centralizare El.	91	11	20.4	24.2
21	București – Urziceni	Centralizare El.	71	8	14.8	17.6
22	Vaslui – Iași	Centralizare El.	67	9	16.7	19.8
23	Bârlad – Vaslui	Centralizare El.	53	6	11.1	13.2
24	Tecuci – Bârlad	Centralizare El.	50	8	14.8	17.6
25	Reșița Sud – Caransebeș	Centralizare El.	43	4	7.4	8.8
26	Verești – Botoșani	Centralizare El.	44	3	5.6	6.6
27	Bacău - Piatra Neamț	Centralizare El.	60	5	9.3	11.0
28	Urziceni - Faurei	Centralizare El.	68	5	9.3	11.0
29	Complex feroviar București Basarab - Grivița	Centralizare El.	4	2	6.3	7.4
30	Deda - Sărățel	Centralizare El.	47	5	9.3	11.0
31	stația Amaradia	Centralizare El.	n/a	1	0.5	0.6
32	stația Bușag	Centralizare El.	n/a	1	0.5	0.6
33	stația Banca	Centralizare El.	n/a	1	0.5	0.6
34	stația Târgoviște	Centralizare El.	n/a	1	1.6	1.9
35	stația Nucet	Centralizare El.	n/a	1		
36	stația Bascov	Centralizare El.	n/a	1		
37	stația Acăț	Centralizare El.	n/a	1	1.1	1.3
38	stația Vișeu de Jos	Centralizare El.	n/a	1		
39	stația Diosig	Centralizare El.	n/a	1	1.1	1.3
40	stația Biharia	Centralizare El.	n/a	1		
41	Trenuri cu hidrogen (H-EMU)	Achiziție	n/a	12	150	178.5
42	Trenuri cu 6 unități RE-IR (EMU)	Achiziție	n/a	20	183	217.8
43	Locomotive electrice noi pe 4 osii cu sistem ETCS	Achiziție	n/a	16	46	54.7
44	Locomotive electrice	Modernizare	n/a	55	66	78.5
45	Reînnoirea vagoanelor	Modernizare	n/a	139	100	119.0
46	Conversia de locomotive diesel	Modernizare	n/a	20	10	11.9
Total					1496.4	1780.8

Lista proiectelor detaliate în tabelul 2.2.17 se poate vizualiza grafic în cadrul figurii 2.2.10. Astfel, se pot observa proiectele feroviare propuse cu finanțare din PNRR în raport cu proiectele feroviare din rețeaua primară cu finanțare din POT sau din alte surse.

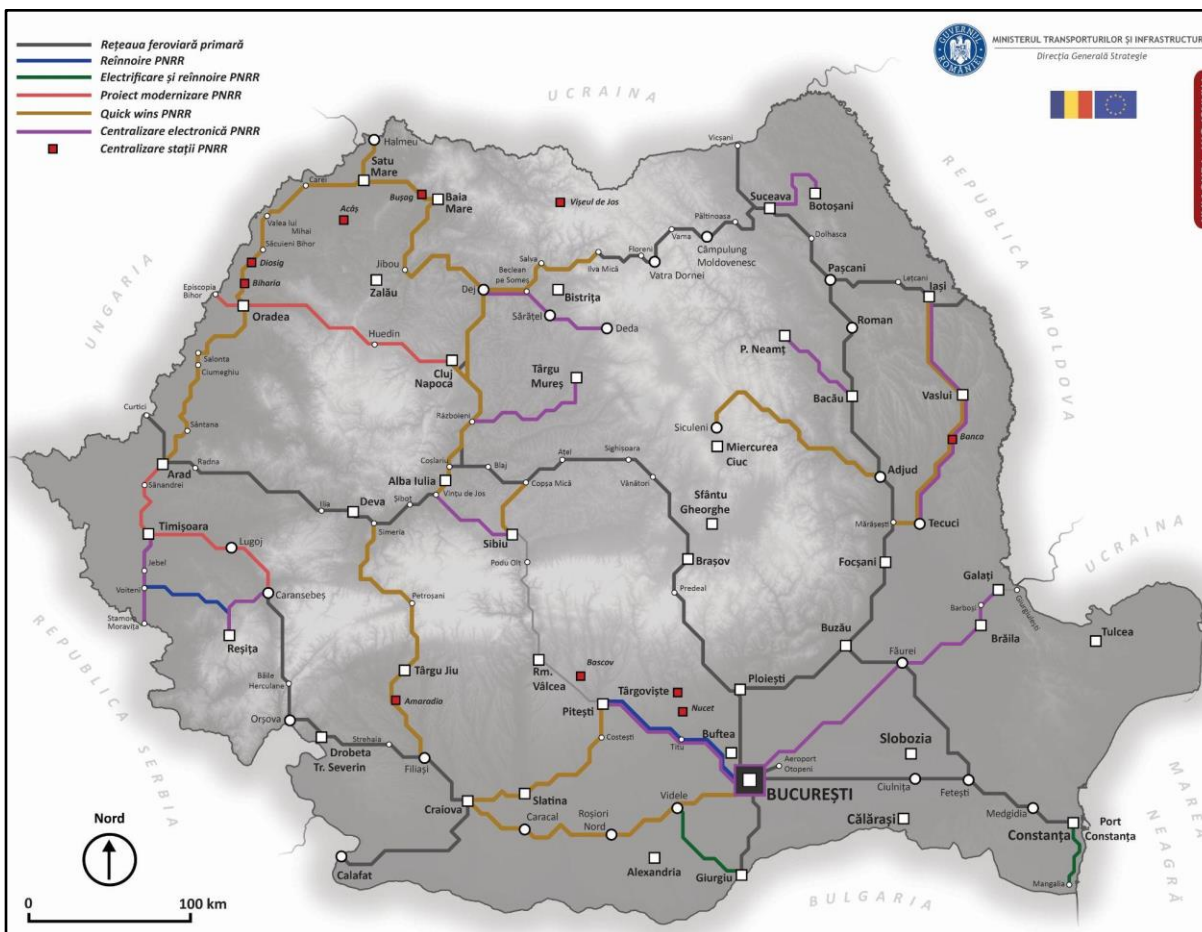


Figura 2.2.10. Proiectele feroviare din PNRR în relație cu rețeaua primară

Lista proiectelor feroviare

Lista proiectelor feroviare a fost definită, în concordanță cu necesitățile de conectivitate la nivel național și european, cu coridoarele de conectivitate și cu cele TEN-T, dar și în funcție de rețeaua feroviară primară și secundară.

Așa cum au fost definite mai sus, coridoarele feroviare sunt formate din mai multe proiecte care necesită diferite tipuri de intervenții și care se află în diverse faze de dezvoltare (în operare, în construcție sau în proiectare). În acest plan investițional, realizat în baza analizei detaliate dezvoltate la nivelul MPGT, se face referire doar la proiectele aflate în fazele de construcție și la cele în fazele de pregătire / proiectare, cele aflate în operare fiind excluse din analiză, având rol doar de definire a rețelei în integralitatea ei.

Așadar, proiectele care sunt în operare sunt tratate ca fiind proiecte aflate în scenariul de referință și însumează un număr de șapte proiecte care fac parte din rețeaua primară. Lungimea totală este de 678.8 km și un cost estimativ de 6.7 mld. EUR fără TVA.

Tabelul 2.2.18. Lista proiectelor aflate în scenariul de referință, localizate pe rețeaua primară
(M – Modernizare, E – Electrificare, D - dublare, R - Reînnoire, C - Centralizare)

Nr. Crt.	Proiecte din scenariul de referință	Rețea TEN-T	Tip Intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără (mil.EUR/ km)
1	Constanța - București	Core	M	0.0	64.8	77.1	n/a
2	Brașov - Sighișoara	Core	C	112.6	1535.0	1826.7	13.6
3	Simeria - Gurasada - Km. 614	Core	C	141.2	1888.0	2246.7	13.4
4	Cluj-Napoca - Ep. Bihor Frontieră	Comprehensive	M+E	160.0	1493.4	1777.1	9.3
5	Caransebeș - Timișoara - Arad	Core	M+D	155.0	1499.9	1784.9	9.7
6	Videle - Giurgiu	Comprehensive	R+E	67.0	113.0	134.5	1.7
7	Constanța - Mangalia	Propunere Comprehensive	R+E+D parțial	43.0	123.0	146.4	2.9
Total				678.8	6717.1	7993.3	

Astfel, a fost stabilită o primă listă de proiecte care aparțin rețelei primare și care va fi analizată multicriterial în cadrul procesului de prioritizare, formată din proiectele aflate în faza de execuție și cele aflate în faza de proiectare. Lista cuprinde 20 de proiecte feroviare care aparțin rețelei TEN-T Core și Comprehensive a căror lungime însumează aproximativ 2586 km și necesită diferite tipuri de intervenții: modernizare, electrificare, dublare sau reînnoire. Costul estimativ pentru cele 20 de proiecte este de 12.8 mld.EUR fără TVA (tabelul 2.2.19).

Tabelul 2.2.19. Lista proiectelor pentru prioritizare localizate pe rețeaua primară
(M – Modernizare, E – Electrificare, D - dublare, R - Reînnoire)

Nr. Crt.	Proiect rețea primară (proiecte pentru prioritizate)	Rețea TEN-T	Tip Intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR/ km)
1	Port Constanța - Palas	Core	M+D	180.0	727.4	865.6	4.0
2	Complex feroviar București	Core	M+E+D	600.0	1000.0	1190.0	1.7
3	Predeal - Brașov	Core	M	27.0	630.0	749.7	23.3
4	Giurgiu Frontieră - București	Core	M+E	99.0	577.7	687.4	5.8
5	Ploiești Triaj - Focșani	Core	M	143.0	572.0	680.7	4.0
6	Focșani - Roman	Core	M	147.0	588.0	699.7	4.0
7	Roman - Pașcani	Core	M	41.0	164.0	195.2	4.0
8	Pașcani - Suceava - Dărmănești	Core	M	71.0	284.0	338.0	4.0
9	Dărmănești - Vicșani Frontieră	Core	M+E	34.0	57.0	67.8	1.7
10	București - Craiova	Core	M	209.0	1254.0	1492.3	6.0
11	Craiova - Dr.Tr.Severin - Caransebeș	Core	M+D parțial	234.0	2110.1	2511.0	9.0
12	Suceava - Ilva Mică	Core	M	191.0	1807.5	2150.9	9.5
13	Ilva Mică - Apahida	Core	M	119.0	714.0	849.7	6.0
14	Teiuș - Cp. Turzii	Core	M	51.0	306.0	364.1	6.0
15	Cp. Turzii - Cluj Napoca	Core	M	51.0	484.5	576.6	9.5
16	Buzău - Făurei	Comprehensive	R	40.0	160.0	190.4	4.0
17	Făurei - Fetești	Comprehensive	R	89.0	356.0	423.6	4.0
18	Pașcani - Iași - Ungheni	Core	M+E parțial	97.0	388.0	461.7	4.0
19	Timișoara - Stamora Moravița	Core	M+E	56.0	120.0	142.8	2.1

	frontieră						
20	Craiova - Calafat	Core	M+E	107.8	561.3	667.9	5.2
	Total			2586.8	12861.4	15305.1	

A fost stabilită o primă listă de proiecte care aparțin rețelei secundare. Lista cuprinde șase proiecte feroviare care aparțin rețelei TEN-T Comprehensive a căror lungime însumează aproximativ 1228 km și necesită tipuri de intervenții reînnoire. Costul estimativ pentru cele șase proiecte este de 32 mld.EUR fără TVA (tabelul 2.2.20).

Tabelul 2.2.20. Lista proiectelor pentru prioritizare localizate pe rețeaua secundară

Nr. Crt.	Proiect rețea secundară	Rețea TEN-T	Tip Intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu (mil.EUR/ km)
1	Arad - Oradea	Comprehensive	R	121.0	217.6	258.9	1.8
2	Oradea - Satu Mare - Baia Mare - Dej	Comprehensive	R	326.0	567.8	675.7	1.7
3	Făurei - Brăila - Galați	Comprehensive	R	91.0	364.0	433.2	4.0
4	București - Pitești - Sibiu - Vințu de Jos	Comprehensive	R	340.0	1048.0	1247.1	3.1
5	Filiași - Tg.Jiu - Petroșani - Simeria	Comprehensive	R	208.0	853.3	1015.4	4.1
6	Pitești - Slatina - Craiova	Altă rețea	R	142.0	227.2	270.4	1.6
	Total			1228.0	3277.9	3900.7	

Având în vedere faptul că ca nevoile de modernizare ale rețelei feroviare depășesc alocările financiare disponibile, mai jos este prezentată metodologia utilizată pentru definirea proiectelor prioritare.

Prioritizarea proiectelor aflate pe rețeaua feroviară primară

Prioritizarea proiectelor reprezintă un pas foarte important în definirea programului de investiții, dată fiind situația în care investițiile identificate ca fiind necesare depășesc semnificativ bugetul disponibil. Aceasta implică necesitatea ierarhizării proiectelor potrivit unui set de criterii de evaluare predefinite, care să asigure un proces de prioritizare corect și neutru, elaborat pe baze independente și științifice. Adăugarea limitărilor de finanțare la lista de proiecte ierarhizate va avea ca rezultat obținerea strategiei de implementare.

Prin urmare, metodologia analizei multicriteriale (AMC) pentru proiectele rețelei primare se bazează pe următoarele criterii (tabelul 2.2.21):

1. **Eficiență economică** – 35%
2. **Reducerea emisiilor de carbon** – 20%

3. **Conectivitate strategică** – 25%
4. **Utilizarea duală a infrastructurii** – 15%;
5. **Maturitatea pregătirii proiectului** – 5%

Tabelul 2.2.21. Metodologia de evaluare pentru fiecare criteriu este sintetizată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Obiectiv	Pondere	Criteriu de evaluare	Modul de punctare
1	Eficiență economică	35%	Pe baza Ratei interne de rentabilitate economică (RIRE) a proiectului	Au fost alocate 35 puncte pentru proiectul cu valoarea RIRE cea mai mare (București - Craiova – RIRE 35). Pentru valorile intermediare între 0 și 35, punctajul a fost alocat proporțional.
2	Reducerea emisiilor de carbon	20%	Pe baza contribuției proiectului la ținta națională de reducere a emisiilor	Intervalul 0-100 puncte. Proiectul cu cea mai mare cantitate de tone echivalent CO2 redusă primește 20 puncte (București - Craiova), iar punctajul pentru celelalte proiecte este redus proporțional
3	Conectivitatea strategică	25%	În funcție de apartenența la rețeaua națională primară/secundară, TEN-T sau alte rețele	100 puncte pentru proiectele TEN-T aflate pe rețeaua primară, 80 puncte pentru proiectele TEN-T care nu sunt pe rețeaua primară, 50 puncte pentru proiectele de pe rețeaua secundară, 20 puncte pentru proiectele de pe alte rețele.
4	Utilizarea duală a infrastructurii	15%	Pe baza importanței pentru mobilitatea militară pe teritoriul României	0-100 puncte împărțite pe 3 intervale: 100-66, 65-33, 32-1. Proiectele de categoria A, conform clasificăției date de către Ministerul Apărării Naționale, primesc maxim 100 puncte și minim 66 puncte, în funcție de ordinea de pe listă (reducerea proporțională până la minimul intervalului), similar pentru proiectele de categoria B și C. Pentru proiectele în afara celor 3 categorii (liste) 0 puncte.
5	Maturitatea pregătirii proiectului	5%	Pe baza stadiului de pregătire a proiectului	Studiu de fezabilitate (cu acord de mediu emis) finalizat – 100 puncte. Studiu de fezabilitate (cu acord de mediu emis) cu nevoie de actualizare – 85 puncte. Studiu de fezabilitate (fără acord de mediu) în elaborare – 50 puncte. Studiu de fezabilitate (fără acord de mediu) în faza de licitație – 20 puncte. Fără studiu de fezabilitate – 0 puncte.

Strategia de prioritizare a proiectelor s-a realizat în concordanță cu metodologia agreată cu Comisia Europeană, similară cu cea din Master Planul General de Transport. În fapt, considerăm astfel, că se realizează o actualizare a strategiei de implementare în baza aceluiași priorități de conectivitate identificate în documentul strategic de programare a investițiilor în transport.

Lista de proiecte, după aplicarea criteriilor prezentate, este structurată în funcție de stadiul proiectelor. Astfel, investițiile care fac parte din strategia de implementare sunt reprezentate de:

- **Proiecte aflate în faza de execuție** (lucrări care vor fi finalizate și finalizate în următorul cadru financiar) și fac parte din scenariul de referință;
- **Proiecte lansate spre a fi implementate** (achiziție publică demarată pentru realizarea documentației tehnico-economice sau pentru execuție) și fac parte din scenariul de referință;
- **Proiecte din lista prioritizată.**

Pentru identificarea proiectelor care se află în fază de execuție / lansate spre implementare, precum și a impactului asupra necesarului de finanțare în perioada 2020-2030, s-a utilizat modulul de predicție aferent programului ITtool, folosit de către Direcția Generală Organismul

Intermediar pentru Transport, pentru managementul fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Astfel, metodologia de evaluare a criteriilor, respectiv prioritizarea a fost realizată pentru 20 de proiecte care însumează un total de 2586.8 km și un cost total estimat de 12.8 mld.EUR (tabel 2.2.22).

CONFIDENTIAL

Tabelul 2.2.22. Metodologie prioritizare rețea feroviară (M – Modernizare, E – Electrificare, D - dublare, R - Reînnoire)

Nr. Crt.	Proiect	Rețea TEN-T	Tip Intervenție	L (km)	Cost estimat fără TVA (mil.EUR)	Cost estimat cu TVA (mil.EU)	Eficiența economică		Reducerea emisiilor de carbon		Conectivitatea strategică		Utilizarea duală		Maturitatea pregătirii proiectului		Punctaj
							Scor EIRR (%)	Punctaj EIRR	Valoare emisii de carbon (kt)	Punctaj emisii de carbon	Apartenență rețea	Punctaj rețea	Prioritate NATO - MAPN	Punctaj prioritate NATO - MAPN	Stadiu pregătire proiect	Punctaj pregătire proiect	
							35%		20%		25%		15%		5%		
1	Port Constanța - Palas*	Core	M+D	180.0	727.4	865.6	2.71	19.37	12,454,241	5.16	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	69.53
2	Complex feroviar București *	Core	M+E+D	600.0	1000.0	1190.0	2.71	19.37	12,454,241	5.16	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	64.53
3	Predeal - Brașov	Core	M	27.0	630.0	749.7	6.86	28.56	18,276,015	7.57	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	81.13
4	Giurgiu Frontieră - București **	Core	M+E	99.0	577.7	687.4	1.65	17.03	10,250,451	4.25	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	66.28
5	Ploiești Triaj - Focșani	Core	M	143.0	572.0	680.7	9.14	33.61	33,407,371	13.84	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	92.44
6	Focșani - Roman	Core	M	147.0	588.0	699.7	2.95	19.90	12,734,742	5.28	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	Contract	5.00	60.18
7	Roman - Pașcani	Core	M	41.0	164.0	195.2	0.23	13.88	2,176,903	0.90	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	Contract	5.00	49.78
8	Pașcani - Suceava - Dărmănești	Core	M	71.0	284.0	338.0	1.14	15.90	4,711,528	1.95	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	Contract	5.00	52.85
9	Dărmănești - Vicșani Frontieră	Core	M+E	34.0	57.0	67.8	-6.04	0.00	192,311	0.08	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	Contract	5.00	35.08
10	București - Craiova	Core	M	209.0	1254.0	1492.3	9.77	35.00	48,281,132	20.00	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	95.00
11	Craiova - Dr.Tr.Severin - Caransebeș	Core	M+D partial	234.0	2110.1	2511.0	0.54	14.57	13,872,206	5.75	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	65.31
12	Suceava - Ilva Mică	Core	M	191.0	1807.5	2150.9	-0.95	11.27	8,479,162	3.51	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	MPGT	0.00	44.78
13	Ilva Mică - Apahida	Core	M	119.0	714.0	849.7	5.02	24.48	15,792,005	6.54	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	71.03
14	Teiuș - Cp. Turzii	Core	M	51.0	306.0	364.1	6.26	27.23	9,805,898	4.06	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	71.29
15	Cp. Turzii - Cluj	Core	M	51.0	484.5	576.6	3.70	21.56	6,631,048	2.75	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	64.31

	Napoca												1				
16	Buzău - Făurei	<i>Comprehensive</i>	R	40.0	160.0	190.4	0.99	15.56	1,818,795	0.75	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	56.32
17	Făurei - Fetești	<i>Comprehensive</i>	R	89.0	356.0	423.6	-1.44	10.18	2,354,655	0.98	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	MPGT	0.00	41.16
18	Pașcani - Iași - Ungheni	<i>Core</i>	M+E partial	97.0	388.0	461.7	2.50	18.91	8,279,850	3.43	Primara	25.00	Prioritatea 3	5.00	Contract	5.00	57.34
19	Timișoara - Stamora Moravița Fr. ***	<i>Core</i>	M+E	56.0	120.0	142.8	-1.77	9.45	4,236,081	1.75	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	MPGT	0.00	51.21
20	Craiova - Calafat ***	<i>Core</i>	M+E	107.8	561.3	667.9	-1.77	9.45	4,236,081	1.75	Primara	25.00	Prioritatea 1	15.00	Contract	5.00	56.21
	Total			2586.8	12861.4	15305.1											

CONFIDENTIAL

Așadar, în urma prioritizării pe baza criteriilor stabilite s-a realizat o ierarhizare a celor 20 de proiecte în funcție de punctajul obținut (tabel 2.2.23). Ecartul punctajelor este de la 30.98 puncte (proiectul Făurei - Fetești) la 95.00 puncte (proiectul București - Craiova).

Tabelul 2.2.23. Lista proiectelor feroviare prioritizate și ierarhizate, localizate pe rețeaua primară
(M – Modernizare, E – Electrificare, D - dublare, R - Reînnoire)

Nr. Crt.	Proiect	Tip Intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil. EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Punctaj
1	București - Craiova	M	209.0	1254.0	1492.3	95.00
2	Ploiești Triaj - Focșani	M	143.0	572.0	680.7	92.44
3	Predeal - Brașov	M	27.0	630.0	749.7	81.13
4	Teiuș - Cp. Turzii	M	51.0	306.0	364.1	71.29
5	Ilva Mică - Apahida	M	119.0	714.0	849.7	71.03
6	Port Constanța - Palas*	M+D	180.0	727.4	865.6	69.53
7	Giurgiu Frontieră - București **	M+E	99.0	577.7	687.4	66.28
8	Craiova - Dr.Tr.Severin - Caransebeș	M+D parțial	234.0	2110.1	2511.0	65.31
9	Complex feroviar București *	M+E+D	600.0	1000.0	1190.0	64.53
10	Cp. Turzii - Cluj Napoca	M	51.0	484.5	576.6	64.31
11	Focșani - Roman	M	147.0	588.0	699.7	60.18
12	Pașcani - Iași - Ungheni	M+E parțial	97.0	388.0	461.7	57.34
13	Buzău - Făurei	R	40.0	160.0	190.4	56.32
14	Craiova - Calafat ***	M+E	107.8	561.3	667.9	56.21
15	Pașcani - Suceava - Dărmănești	M	71.0	284.0	338.0	52.85
16	Timișoara - Stamora Moravița Fr.***	M+E	56.0	120.0	142.8	51.21
17	Roman - Pașcani	M	41.0	164.0	195.2	49.78
18	Suceava - Ilva Mică	M	191.0	1807.5	2150.9	44.78
19	Făurei - Fetești	R	89.0	356.0	423.6	41.16
20	Dărmănești - Vicșani Frontieră	M+E	34.0	57.0	67.8	35.08
	Total		2586.8	12861.4	15305.1	

Nevoile de finanțare pentru sectorul feroviar, alături de intervențiile de modernizare/reînnoire și/sau electrificare și dublare, sunt constituite și din alte proiecte feroviare așa cum sunt prezentate și în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.2.24. Sinteza proiecte feroviare

Nr. Crt.	Sinteză proiecte feroviare	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	Proiect rețea primară	3222.6	19455.5	23152.1
2	Proiect rețea secundară	1271.0	3400.9	4047.1
3	Alte proiecte feroviare	n/a	1272.0	1513.7
4	Material rulant (mai puțin POIM și PNRR)	n/a	750.0	892.5
5	Proiecte feroviare din PNRR (mai puțin Caransebeș - Arad, Cluj Napoca - Ep. Bihor, Constanța - Mangalia și Videle - Giurgiu	n/a	1496.4	1780.8

	cuprinse în rețelele primară sau secundară)			
	Total	4493.6	26374.9	31386.1

Lista proiectelor feroviare desfășurate după tipul de finanțare se pot vizualiza grafic în figura 2.2.11. Astfel se identifică proiecte feroviare finanțate din PNRR, POT și CEF, studii HSR și proiecte pentru stațiile feroviare finanțate din PNRR și POT.

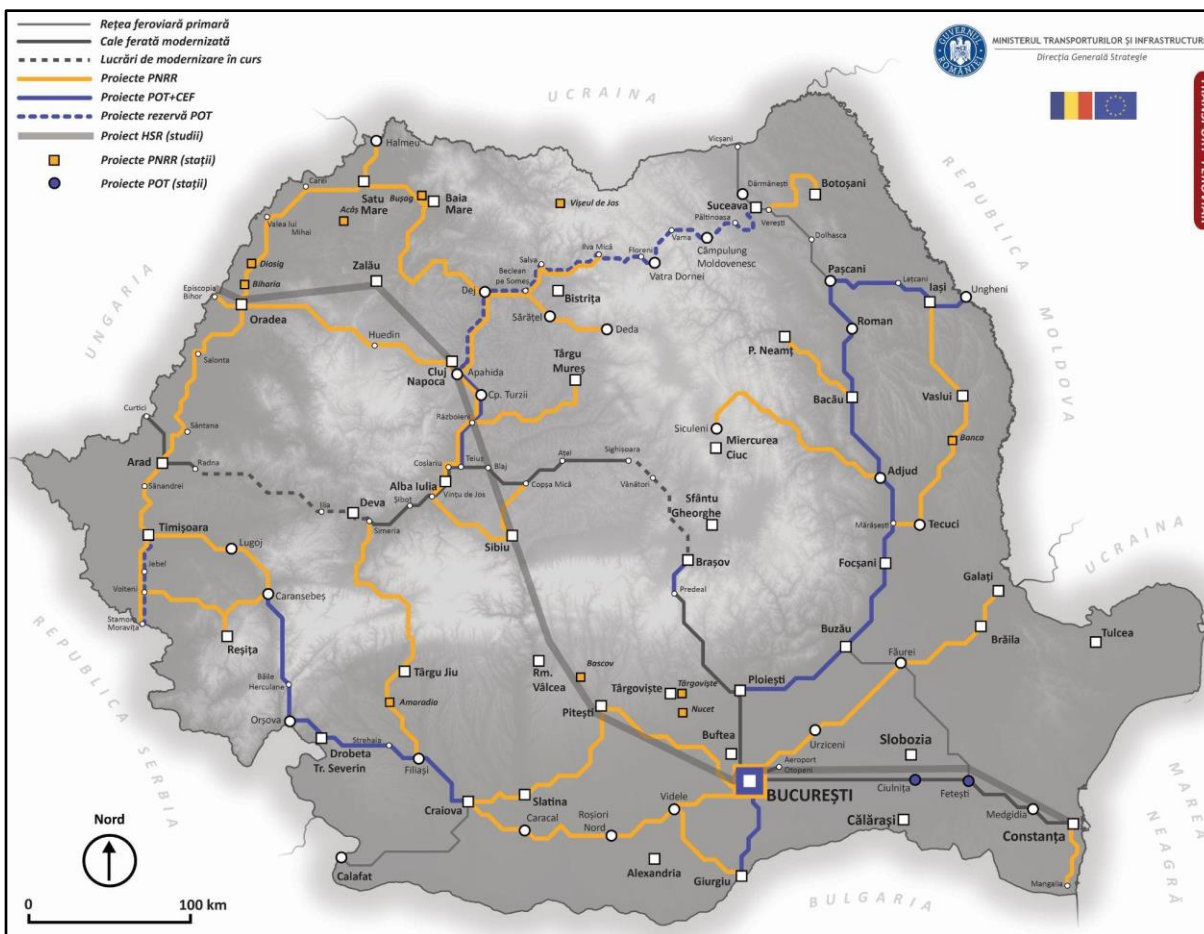


Figura 2.2.11. Proiectele feroviare și tipul finanțării

Proiecte solicitate pentru finanțare din PNRR

Modul de transport feroviar prezintă proiecte finanțate din PNRR prin Investiția 1 - Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare și prin Investiția 2 - Material rulant feroviar (figura 2.2.12).

În ceea ce privește modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare, intervențiile pot fi clasificate, în general, în patru categorii majore:

1. refacerea liniei de cale ferată (șine, macaze, înlocuirea stratului de piatră);
2. electrificarea;
3. lucrări de structuri (poduri, lucrări de stabilizare, fundație sub calea de rulare);

4. sisteme de gestionare a traficului (ERTMS).

Până în prezent, lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare au implicat o refacere completă a căii ferate, incluzând toate cele patru tipuri de intervenții menționate mai sus. Deși această abordare este cea mai completă, ea s-a dovedit greu de implementat din cauza costurilor și a calendarului de execuție de durată. Astfel, în prezent, România are doar părți ale coridorului Constanța - Nădlac complet modernizate, secțiuni din acesta fiind încă în curs de execuție. Restul rețelei TEN-T se află în faza studiilor de fezabilitate, Arad - Timișoara - Caransebeș și Cluj Napoca - Episcopia Bihor fiind singurele secțiuni majore pregătite pentru licitația de execuție a lucrărilor.

Îndeplinirea condițiilor feroviare de coridor conform ITS:

- Viteza medie va fi de peste 100 km/h (condiție îndeplinită în faza I);
- Lungimea utilă a liniilor peste 740 m (condiție îndeplinită parțial în faza I și total în faza a II-a);
- Sarcina pe osie de 22.5t (condiție îndeplinită în faza I după finalizarea lucrărilor de renewal și după implementarea pachetului de modernizare poduri și podețe);
- Modernizarea peroarelor și realizarea gabaritelor (condiție îndeplinită în faza a II-a);
- Introducerea și operaționalizarea ERTMS, nivel 2 (condiție îndeplinită în faza a II-a).

Proiectele propuse pentru investiția de modernizare și reînnoire a infrastructurii feroviare din PNRR sunt următoarele:

a) **Modernizare**

- modernizare și instalare sistem ERTMS Arad - Timișoara - Caransebeș - lungime 155 km;
- modernizare, electrificare și instalare sistem ERTMS Cluj-Napoca - Episcopia Bihor - lungime 160 km;

b) **Electrificare**

- Constanța - Mangalia (43 km) – Non TEN-T – propunerea României de a intra pe TEN-T Comprehensive ca prelungire a coridorului TEN-T Core. În prezent această cale ferată este un feeder pentru coridorul TEN-T Core.
- Videle - Giurgiu (67 km) – TEN-T Comprehensive – missing link de electrificare pentru coridor transfrontalier.

c) **Renewal/Reînnoiri**

- București – Pitești (198 km lungime desfășurată) - TEN-T Comprehensive;
- Reșița - Voiteni (65 km) - legătură la coridor TEN-T Core.

d) **Quick Wins**

- București - Craiova (TEN-T Core - Coridorul Rin - Dunăre (ramura sudică))
- Arad - Oradea (TEN-T Comprehensive)
- Sibiu - Copșa Mică (TEN-T Comprehensive)

- Oradea - Satu Mare - Halmeu (TEN-T Comprehensive)
- Apahida - Dej - Baia Mare - Satu Mare (TEN-T Comprehensive)
- Dej - Beclean - Ilva Mica (TEN-T Core)
- Adjud - Siculeni (TEN-T Comprehensive)
- Filiași - Tg.Jiu - Petroșani - Simeria (TEN-T Comprehensive)
- Pitești - Slatina - Craiova (rută economică, propunere TEN-T Comprehensive)
- Coșlariu - Teiuș - Cluj-Napoca (TEN-T Core)
- Mărășești - Tecuci - Bârlad - Vaslui - Iași Magistrala (propunere TEN-T Comprehensive)

e) Centralizări electronice și electro-dinamice

- 315 km de cale ferată modernizată;
- 315 km de cale ferată cu sistem ERTMS 2;
- 110 km de cale ferată electrificată și reînnoită;
- 2426 km de cale ferată pe care viteza comercială crește cu 15% prin lucrări de reînnoire (263 km) și Quick Wins (2163 km);
- 973 km de cale ferată și 121 de stații de cale ferată cu sistem modern de centralizare.

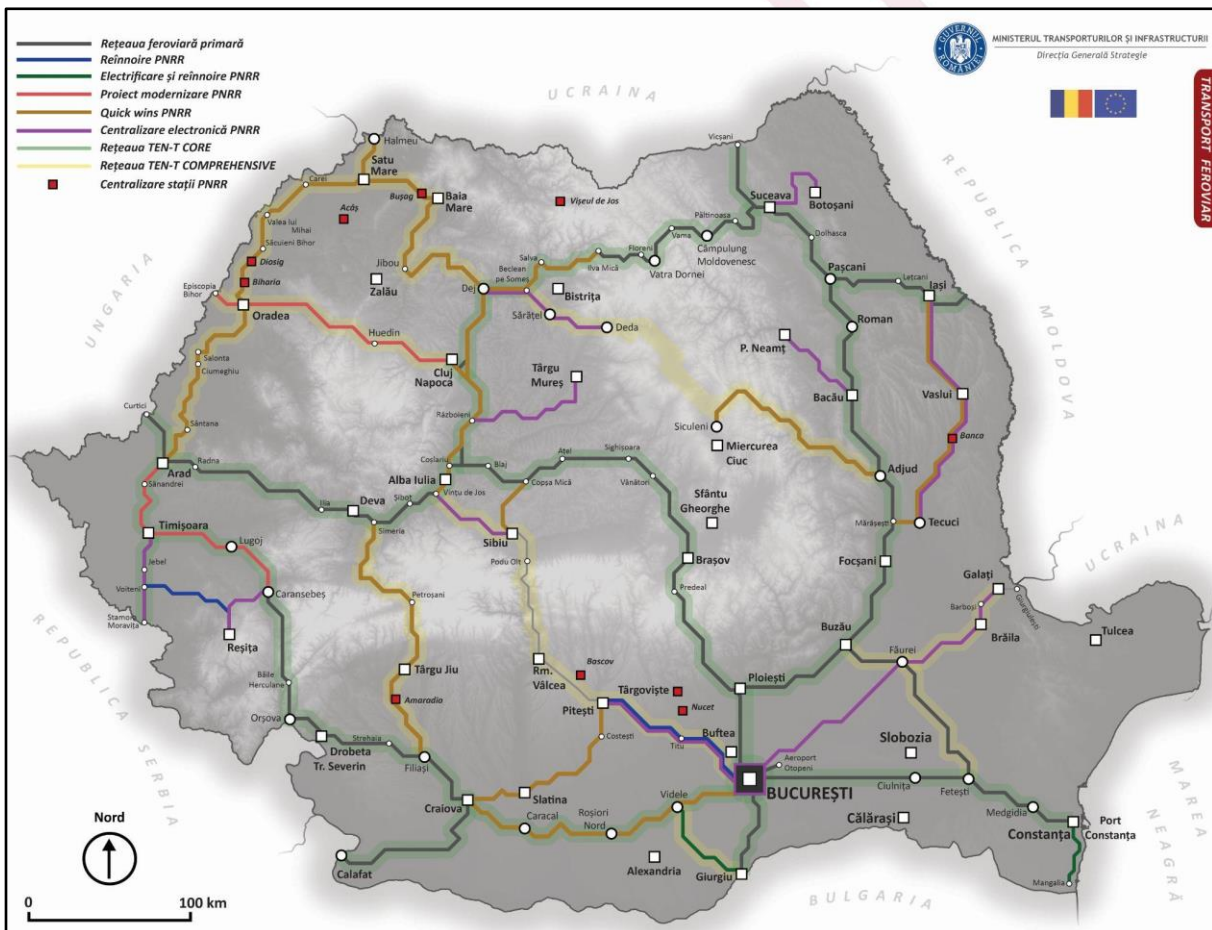


Figura 2.2.12. Proiecte propuse pentru finanțare din PNRR

Propuneri cu caracter aplicativ

Prezentul Plan Investițional propune și o serie de intervenții și măsuri de mai mică anvergură, însă cu un impact și cu beneficii semnificative atât pentru gestionarul infrastructurii feroviare, cât și pentru operatorii feroviari sau alți beneficiari cu activitate conexă sectorului feroviar.

■ **Dotarea locomotivelor cu dispozitive și sistem ERTMS**

În intervenția complexă de modernizarea a sectoarelor de cale ferată sunt prevăzute și lucrări pentru realizarea de instalații de semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și control, moderne, în conformitatea cu cerințele europene. Astfel, sectoarele de cale ferată modernizate sau în curs de modernizare dispun de astfel de instalații care, în relație cu dispozitivele și echipamentele cu care materialul rulant este echipat, pot crește cu până la 30% capacitatea de transport al sectorului de cale ferată (printr-un management modern al traficului), creșterea siguranței (se reduce la minimum eroarea umană) și se poate circula în regim de interoperabilitate (trenuri internaționale directe pentru care nu este nevoie de schimbarea mijlocului de remorcă la frontieră).

Pentru a putea beneficia de aceste avantaje și pentru a valorifica la maxim infrastructura modernizată sau în curs de modernizare, se propune, complementar cu înnoirea parcului de material rulant și echiparea și compatibilizarea locomotivelor existente cu sisteme ERTMS. În această manieră, investiția de modernizare a infrastructurii cu sistem ERTMS este operaționalizată, iar beneficiile vor fi generate atât pentru gestionarul infrastructurii (prin TUI - taxa de utilizare a infrastructurii - dar și prin managementul modern al traficului), cât și pentru operatori (costuri de exploatare reduse, siguranța circulației).

■ **Dezvoltarea și promovarea conceptului Smart Transit – oferta de tranzit a României**

Pe măsura dezvoltării infrastructurii de transport a României pentru toate sectoarele, țara noastră poate deveni o veritabilă placă turnantă în relația transportului de mărfuri pe relația Asia – Europa. Astfel, investițiile în dezvoltarea infrastructurii portuare din Constanța, îmbunătățirea condițiilor de navigabilitate pe Dunăre și pe canale, dar și extinderea rețelei de căi ferate moderne și autostrăzi pot avea o valoare adăugată majoră dacă sunt propuse măsuri eficiente pentru transportatori sau operatori. Din punct de vedere feroviar, sunt identificate câteva rute de tranzit care pot să devină veritabile artere internaționale de mărfuri (figura 2.2.12). În aceste condiții, stimularea operatorilor și a gestionarului infrastructurii pentru dezvoltarea activității de tranzit constituie o inițiativă care va avea beneficii majore prin preluarea și atragerea fluxurilor de mărfuri pentru a fi transportate pe calea ferată în regim multimodal sau combinat. Aceste

măsurile se aliniază cu alte inițiative asemănătoare din Europa Centrală și de Vest, dar și cu politicile și acțiunile Comisiei Europene.

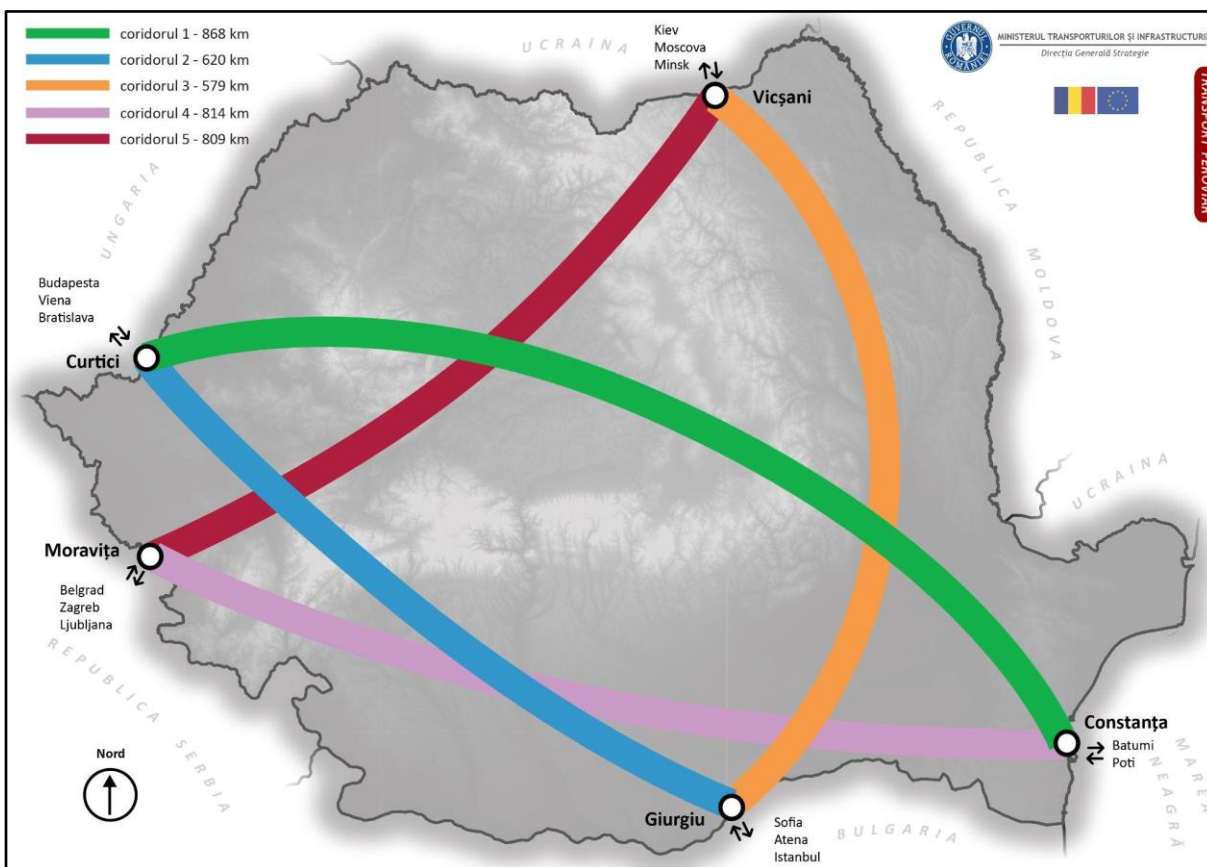


Figura 2.2.13. Conceptul Smart Transit - Coridoarele feroviare de tranzit

Astfel, coridoarele de tranzit care să facă parte dintr-o ofertă de tranzit a României (și care să conțină elemente legate de potențialul de transport în raport de costuri și timp) și care să fie promovată internațional sunt (figura 2.2.13):

- **Coridorul feroviar de tranzit 1 (868 km)** – Europa Centrală (Cehia, Austria, Slovacia, Polonia, Ungaria) – Marea Neagră: traseul va putea fi parcurs de trenurile de marfă în 10 ore, după finalizarea lucrărilor propuse;
- **Coridorul feroviar de tranzit 2 (620 km)** – Europa Centrală (Cehia, Austria, Slovacia, Polonia, Ungaria) – Europa de Sud-Est (Grecia, Bulgaria, Turcia): traseul va putea fi parcurs de trenurile de marfă în 8 – 9 ore, după finalizarea lucrărilor propuse;
- **Coridorul feroviar de tranzit 3 (579 km)** – Europa de Sud-Est (Grecia, Bulgaria, Turcia) – Ucraina, Belarus, Rusia: traseul va putea fi parcurs de trenurile de marfă în 8 ore, după finalizarea lucrărilor propuse;

- **Coridorul feroviar de tranzit 4 (814 km)** – Europa Central Sudică (Italia de Nord, Slovenia, Croația, Muntenegru, Serbia) – Marea Neagră: traseul va putea fi parcurs de trenurile de marfă în 9-10 ore, după finalizarea lucrărilor propuse;
- **Coridorul feroviar de tranzit 5 (809 km)** – Europa Central Sudică (Italia de Nord, Slovenia, Croația, Muntenegru, Serbia) – Ucraina, Belarus, Rusia: traseul va putea fi parcurs de trenurile de marfă în 11 ore, după finalizarea lucrărilor propuse.

■ **Trenurile de lucru – soluție eficientă pentru modernizarea coridoarelor feroviare**

În ultimii 30 de ani, România a reușit să modernizeze mai puțin de 700 km din cei peste 10.000 km de căi ferate, acțiune realizată în principal cu fonduri europene nerambursabile. Astfel, din anul 2007 până în prezent au fost investiți aproximativ 5 mld. EUR pentru modernizarea a 500 km de cale ferată dintr-un total de aprox. 2400 km pe cale ferată care aparțin rețelei TEN-T Core.

În afară de finanțarea UE, lucrările de reînnoire efectuate cu resurse naționale sunt extrem de limitate, cu o medie de aproximativ 12 km de cale ferată unică/an (comparativ cu o rată de aproximativ 800 km/an înainte de 1990). Acest lucru a dus în timp la acumularea unui backlog uriaș (restanța la reparații), estimat în prezent la 9800 km (pe o singură cale) pe întreaga rețea feroviară - cu consecințe în numărul mare de restricții de viteză care afectează performanța sistemului feroviar.

Motivele acestor întârzieri sunt multiple și provin din toate segmentele ciclului de viață al activului construit, începând cu actul decizional, pregătirea slabă a proiectului, achiziții ineficiente și terminând cu managementul contractual slab. Complexitatea ridicată a fost o cauză importantă, prezentă în toate aceste etape.

Pornind de la lecțiile învățate, compania care gestionează infrastructura feroviară, Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - SA, a considerat necesară schimbarea paradigmei către o abordare mai practică prin care, în loc de modernizări costisitoare, orientate către viteze mai mari - ceea ce înseamnă, în cele mai multe cazuri, reconstruirea liniilor pe alinieri noi, noul concept se va baza pe reabilitarea liniilor existente pe aliniamentul actual folosind trenuri de modernizare a căilor ferate cu înaltă productivitate. Astfel, rata de productivitate preconizată este de 300 km de cale ferată (cale unică)/an/tren. Dacă vor fi folosite două astfel de trenuri putem estima că se vor putea moderniza aproximativ 600 km de cale ferată (cale unică)/an. De asemenea, prin această metodă se vor satisface și cerințele de interoperabilitate cu privire la sarcina pe osie de 22,5 t aplicabilă pentru liniile TEN-T.

Totuși, o serie de alte lucrări complementare (pe care aceste trenuri de lucru nu le pot realiza) vor face obiectul unor intervenții separate de mai mică anvergură, sub formă de pachete de lucrări (reabilitare poduri, podețe, tuneluri, semnalizare/ERTMS, alte lucrări pentru creșterea atractivității transportului feroviar: ex. stații CF, puncte de oprire).

Utilizând noul concept, se poate estima faptul că modernizarea rețelei feroviare TEN-T Core din România și a unor segmente din rețeaua TEN-T Comprehensive s-ar putea realiza în aproximativ șapte ani cu un cost de 2.1 mld.EUR (180 mil.EUR pentru achiziția a două trenuri de lucru din POIM 2014-2020, respectiv 1.9 mld.EUR pentru materiale și forță de muncă din POT 2021-2027).

■ **TRENUL METROPOLITAN**

În contextul noilor politici ale UE cu privire la reducere emisiilor (CO₂, NO_x, PM) pentru toate modurile de transport, pentru a atinge acest obiectiv, se recomandă impunerea unor standarde mai stricte în ceea ce privește poluarea rezultată din transportul rutier, digitalizarea transportului prin creșterea mobilității automate, stimularea transportului multimodal, îmbunătățirea transportului public (inclusiv prin implementarea conceptului de tren metropolitan și park & ride), implementarea unui sistem automatizat de gestionare a traficului pentru a facilita descongestionarea traficului urban, reducerea poluării în porturi, implementarea aplicațiilor inteligente și a mobilității ca serviciu. Transportul feroviar de navetă reprezintă un important segment din piața transportului feroviar general în statele Uniunii Europene. Reprezintă, de asemenea, o provocare a pieței transportului public în ansamblul ei, contribuind semnificativ la creșterea mobilității urbane și periurbane durabile a persoanelor, dar și la încurajarea modalității, prin trecerea de la mașina privată la transportul de pasageri de masă, oferind astfel acces la marile orașe cu beneficii majore asupra descongestionării arterelor rutiere.

Orașele din România au o tradiție îndelungată în furnizarea serviciilor de transport public pe teritoriul lor administrativ. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și primele din secolul al XX-lea, principalele centre economice din România au introdus diferite forme de servicii de transport public. În perioada comunistă, rețelele de transport public au fost dezvoltate în întreaga țară în contextul unor investiții majore în fabricile din industria grea. Criza petrolieră din anii 1970 a antrenat impulsul de a investi în surse de energie electrică pentru transport. Orașele industriale, precum Ploiești, Galați, Suceava, Sibiu sau Târgoviște, au introdus rețele de troleibuze pentru a conecta zonele rezidențiale la cele industriale. Decizii similare au fost luate de către autoritățile locale și centrale în rețelele de tramvai. Rețelele de tramvai din București, Brașov, Sibiu, Botoșani și Oradea au fost extinse sau reorganizate pentru a deservi marile fabrici de producție.

Trecerea la economia de piață, care a început în anii 1990, a afectat negativ unele dintre rețelele de transport public din țară. Unele rețele de transport public au fost privatizate (de exemplu, Alba Iulia, Bistrița, Slobozia, Târgoviște, Bacău), în timp ce unele municipii mari au încercat să reducă costurile de exploatare prin eliminarea tramvaielor și / sau a infrastructurilor de troleibuz (de exemplu Brașov, Constanța, Suceava, Sibiu).

Centrele urbane din România au început, în principal în 2017-2018, un proces important de aliniere a procedurilor de contractare a obligațiilor de serviciu public (OSP) la cele europene. În contextul fondurilor UE nerambursabile alocate centrelor urbane în cadrul cadrului financiar multianual UE 2014-2020 pentru a reduce amprenta de carbon și alte obiective politice, există o cerere instituțională de contractare a serviciilor de transport de călători, în conformitate cu dispozițiile legislației și reglementărilor UE cadru în domeniu.

Începând cu anul 2020, Guvernul României, a creat posibilitatea implicării autorităților publice locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară constituite de acestea în dezvoltarea de proiecte de tren metropolitan, în colaborare cu administratorul național de infrastructură, CFR S.A.

Cadrul legislativ privind contractarea serviciilor este încă unul cu caracter național – centralizat, dar este în lucru un pachet legislativ pentru actualizarea acestuia în sensul desemnării autorităților publice locale drept Autorități Competente, în sensul Regulamentului 1370/2007 pentru transport feroviar urban / metropolitan.

Transportul feroviar joacă un rol semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul transporturilor, fiind unul dintre cele mai ecologice și mai eficiente, din punct de vedere energetic, moduri de transport. Transportul feroviar este în mare măsură electrificat și emite mult mai puțin CO₂ decât o călătorie echivalentă rutieră sau aeriană.

Definirea conceptului

Trenul metropolitan reprezintă un sistem feroviar local sau regional de interes economic general în domeniul transportului public de călători care oferă un serviciu de transport în interiorul și în jurul marilor aglomerări urbane, utilizând linii de cale ferată convențională, linii de cale ferată dedicată, o combinație a acestora sau o combinație între linii de cale ferată și cele destinate vehiculelor de tramvai sau metrou.

Principala caracteristică a acestuia este legată de independența față de rețeaua de străzi, drumuri naționale sau autostrăzi însă poate prezenta o complementaritate sporită cu acestea. Transportul feroviar metropolitan diferă ca intensitate și este condiționat de extinderea rețelei, de densitatea populației din bazinul de captare, dar și de alte elemente precum orarul cadenciat sau relația cu alte moduri de transport.

Trenul metropolitan, așa cum este consacrat în Europa Centrală și de Vest, circulă în interiorul orașului într-un regim de distanțe scurte, cu stații și puncte de oprire dese (în special la intersecția cu marile bulevarde sau la convergența cu alte mijloace de transport public urban – stații de metrou, autobuz, troleibuz, tramvai), iar în afara orașului în regim de tren distanțe medii, cu stații sau puncte oprire mai rare (la intersecția cu drumurile naționale sau județene importante – în care se pot amenaja parări de tip "park and ride" sau în apropierea dezvoltărilor rezidențiale, comerciale, de agrement sau logistice). În exemplele europene de tren metropolitan de tip S-Bahn sau RER (Viena, Zurich, Paris, Munchen, Berlin), acestea leagă de cele mai multe ori zonele centrale sau gara principală a marilor orașe (circulând uneori pe rețeaua urbană de metrou), cu localitățile din zona metropolitană, chiar și până la 40 km distanță.

Trenurile metropolitane transportă zilnic între 42 mii pasageri în aria orașului Innsbruck (spre Arlberg, Inn-ul Inferior sau Brenner) și până la 1.5 mil pasageri în aria metropolitană a Berlinului (din nodul central Berlin Friedrichstrasse spre Potsdam, Spandau sau aeroportul Schönefeld). Una dintre cele mai dezvoltate rețele de transport de tip metropolitan (S-Bahn) este reprezentată de cea din Zürich, care este deservită de 26 de linii feroviare metropolitane radiale (având ca nod modal central gara Zürich, pe care îl conectează cu aeroportul sau cu orașele satelit Aarau, Brugg, Zug, Winterthur, Schaffhausen sau Uster). Chiar dacă populația orașului Zürich este de doar 402.762 mii locuitori (în 2017), traficul zilnic de pasageri este de peste 564 mii pasageri ceea ce

evidențiază eficiența acestui tip de transport. Lista exemplurilor de trenuri metropolitane se poate vizualiza în tabelul 2.2.25.

Tabelul 2.2.25. Exemple de arii populate deservite de trenuri metropolitane

Nr. Crt.	Oraș european	Populație oraș (mil.loc)	Număr de călători transportați zilnic (mii)
1	Budapesta	1.75	200
2	Viena	1.88	300
3	Zurich	0.40	564
4	Frankfurt	0.75	400
5	Berlin	3.74	1500
6	Munchen	1.45	840
7	Innsbruck	0.31	42

Principalele caracteristici ale infrastructurii și ale serviciului de tren metropolitan sunt:

- orar cadențat, adaptat fluxurilor de călători, corelat multimodal;
- utilizează infrastructura feroviară existentă sau liniile suburbane dedicate;
- are peroane simple, în linie curentă, legate între ele sau cu rețelele de transport complementare prin subtraversări sau supratraversări;
- stațiile sau punctele de oprire sunt fără personal (achiziția de bilete sau informarea călătorilor se face prin sisteme informatice integrate);
- călătoria (navetismul) durează în general sub o oră, cu o viteză comercială de 40 – 60 km/h

Conform unei analize realizate de către UITP și UIC prezentate în raportul *Regional And Suburban Railways - Market Analysis Update (Căile ferate regionale și suburbane - Actualizarea analizei pieței)*, numărul total de pasageri transportați în serviciu public de transport metropolitan reprezintă aproximativ 90% din numărul total de pasageri feroviari și 50% din numărul total de pasageri – km/an.

Tipurile de rețele feroviare metropolitane pot fi de mai multe feluri: de tip linie, de tip cruce, radială și diferă în funcție de dispunerea bazinelor de captare de pasageri (figura 2.2.14).

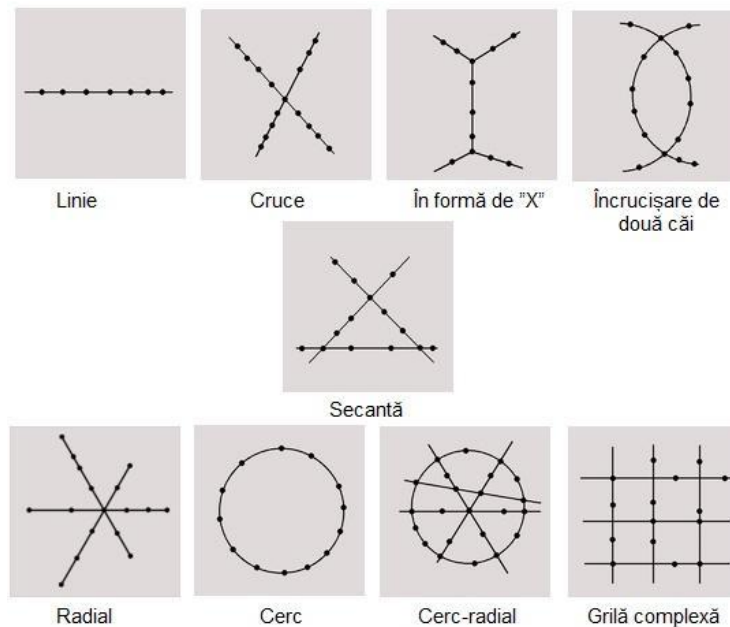


Figura 2.2.14. Tipuri de rețele feroviare metropolitane

Așadar, trenul metropolitan combină beneficiile majore ale transportului urban cu metroul, cu avantajele trenului regional în zona suburbiilor, conducând evident la reducerea numărului de autoturisme și a mijloacelor de transport publice urbane și suburbane, contribuind la reducerea cantităților de gaze cu efect de seră produse în domeniul transporturilor.

Astfel, prin investițiile în dezvoltarea conceptului de transport cu trenul metropolitan în țara noastră, România se alătură viziunilor și noilor concepte promovate de către Comisia Europeană prin noua politică *Green Deal*.

Trenul metropolitan reprezintă un exemplu de bună practică în ceea ce privește multimodalitatea transportului de pasageri, în care se utilizează un transport de masă prietenos cu mediul înconjurător, la care transportul rutier constituie complementaritatea în sistemul de transport de navetă (figura 2.2.15). Studiarea, adaptarea și implementarea modelului de tren metropolitan european evidențiază introducerea unor rute în care frecvența trenurilor să fie mare, astfel încât transportul public rutier pe aceeași rută, să se reducă spre minim. Transportul public rutier se va concentra însă pe relațiile nedeservite de trenurile metropolitane, prin complementaritatea cu acesta, asigurându-se noi rute de transport integrat, conducând astfel la o mobilitate mai mare a pasagerilor și de calitate superioară.

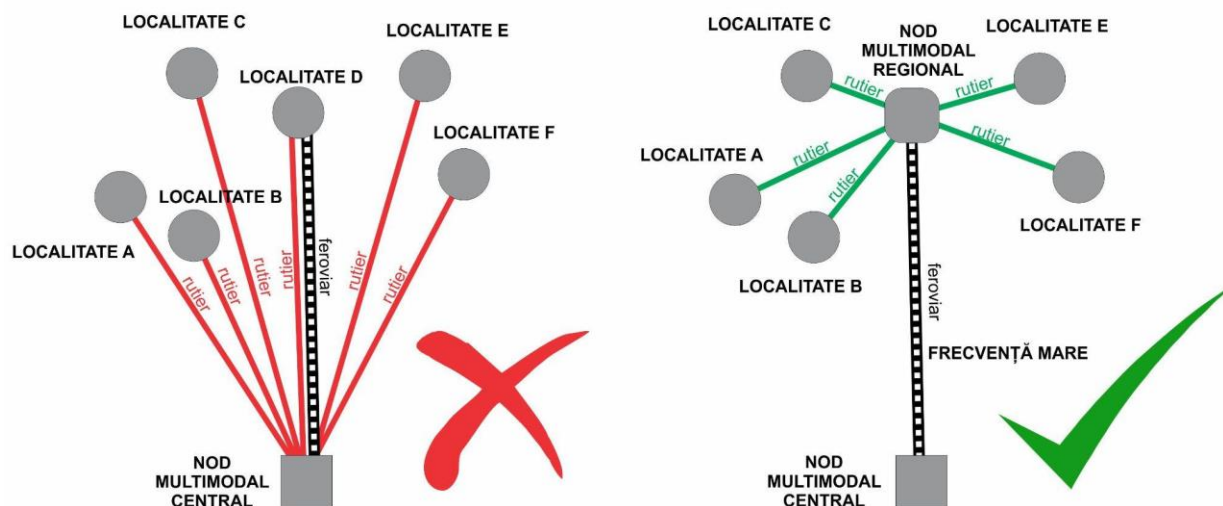


Figura 2.2.15. Model de complementaritate tren metropolitan – transport public rutier (situația actuală cu numeroase legături de transport public rutier vs. situația propusă în care o stație de cale ferată devine nod multimodal de pasageri)

Obiectivele și funcțiile proiectelor

Serviciile de tren metropolitan corespund următoarelor obiective privind asigurarea unei mobilități urbane durabile:

- Regenerare urbană și dezvoltare favorizată de transportul public
- Incluziunea socială și accesul la principalele puncte de interes
- Coeziune teritorială
- Predictibilitate și punctualitate
- Accesibilitate
- Calitatea și continuitatea serviciilor
- Siguranță și securitate
- Protecția mediului
- Întreținerea materialului rulant
- Responsabilitatea financiară
- Colectarea datelor pentru monitorizare
- Protecția vieții private

Proiectele de investiții care prevăd introducerea și dezvoltarea serviciilor de tren metropolitan au următoarele destinații și funcțiuni:

1. Pentru autoritățile publice locale:

- Furnizarea unor servicii publice de transport călători moderne
- Control asupra dimensiunii serviciului oferit cetățenilor proprii
- Stații și zona stațiilor integrate în arhitectura urbană locală

- Reducerea segregării urban / rural
- Eliberarea de capacitate de transport pe trasa stradală
- 2. *Pentru utilizatori și non-utilizatori:*
 - Integrarea cu oferta de transport public local
 - Creșterea gradului de incluziune socială, economică, culturală a locuitorilor din teritoriul zonelor urbane funcționale ale municipiilor
 - Vehicule feroviare moderne și confortabile integrate cu stații cu peroane ce permit îmbarcarea/debarcarea fără traptă
 - Stații și zona adiacentă a stațiilor sigure, confortabile
 - Eliminarea conflictelor de trafic la trecerile la nivel
 - Creșterea siguranței în trafic
- 3. *Pentru protecția mediului:*
 - Oferte de mobilitate prietenoase cu mediul
 - Diminuarea călătoriilor cu vehicule individuale motorizate
- 4. *Pentru digitalizarea serviciilor de interes public:*
 - Integrarea în sistemul ITS al municipiilor
 - Implementare de soluții informatice de monitorizare a lucrărilor de construcții, de monitorizare a calității infrastructurii, de monitorizare a calității materialului rulant
- 5. *Pentru bugetul de stat:*
 - Diminuarea costurilor de exploatare a serviciilor de transport feroviar călători prin atragerea fondurilor de la bugetele locale
 - Diminuarea costurilor cu întreținerea infrastructurii feroviare prin creșterea productivității liniei
 - Creșterea capacității administrative de implementare proiecte majore prin implicarea echipelor de proiect ale autorităților publice locale și structurilor asociative
 - Scăderea costurilor cu accidentele rutiere

Principalele orașe în care trenul metropolitan se poate implementa utilizând infrastructura feroviară existentă sau racorduri nou create sunt: București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara, Sibiu, Constanța. În măsura în care expansiunea altor orașe va crea cerere și nevoia de conexiune feroviară periurbană pentru pasageri, acestea pot fi incluse în lista orașelor care pot beneficia de servicii feroviare metropolitane.

Măsuri și intervenții pentru implementarea proiectelor de tren metropolitan

Implementarea conceptului de tren metropolitan reprezintă un demers important și anevoios din cauza numeroaselor entități cu atribuții directe sau indirecte în etapele de proiectare, implementare și mai ales operare.

Tipurile de intervenție pot fi clasificate după cum urmează:

- amplasarea peroanelor în linie curentă pentru stațiile noi de cale ferată și realizarea conexiunilor pietonale între acestea și rețeaua rutieră;

- construcția pasajelor de trecere la nivel pentru pasageri (cu semnale acustice și luminoase) subterane sau supraterane în stațiile noi de cale ferată;
- igienizarea permanentă a spațiilor pentru călători în stațiile existente;
- asigurarea accesului călătorilor în zona noilor stații;
- achiziția de rame moderne de scurt parcurs, dedicate transportului metropolitan de tip DMU, EMU, B-EMU sau H-EMU, cu capacități între 120 și 400 pasageri;
- asigurarea unor contracte de servicii publice atractive pentru operatorii de transport feroviar de călători;
- asigurarea unor compensații necesare funcționării serviciului feroviar metropolitan, adaptate nevoilor de operare în sistem cadențat, în corelație cu orele de vârf și fluxul de pasageri;
- promovarea serviciului feroviar metropolitan;
- introducerea de facilități pentru transportul de pasageri (promoții, oferte etc.);
- introducerea taxării urbane unice (tichet urban unic) și pe zone kilometrice;
- construcția de adăposturi și digitalizarea serviciului prin montarea unor panouri informative în timp real pentru pasageri;
- construcția de parcuri de tip Park and Ride, gratuite pentru utilizatorii serviciilor feroviare metropolitane;
- asigurarea complementarității sectoarelor rutier – feroviar prin noi conexiuni între traseele mijloacelor de transport public urban și stațiile trenului metropolitan.

Principalele entități publice centrale și locale cu atribuții în implementarea și operarea trenurilor metropolitane sunt:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- CFR Infrastructură;
- Operatorul național de transport feroviar de călători și operatorii feroviari privați de călători din România;
- Autoritatea pentru Reforma Feroviară;
- Administrațiile și societăți de transport locale;
- Asociațiile de dezvoltare Intercomunitare;
- Agenții economici;

Pe teritoriul României, autoritatea competentă pentru toate categoriile de servicii de transport public feroviar, în sensul Regulamentului UE 1370/2007, modificat și actualizat, este Autoritatea pentru Reformă Feroviară din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În condițiile viitoarei adoptări de către Guvernul și Parlamentul României a propunerii de modificare a OUG 12/1998, autoritățile locale competente, în sensul Regulamentului UE 1370/2007, vor fi unitățile administrativ teritoriale pentru serviciile de transport feroviar furnizate exclusiv pe teritoriul administrativ al acestora și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru serviciile ce exced teritoriul unei UAT individuală.

Metodologia de prioritizare în vederea implementării conceptului de tren metropolitan în România

În vederea identificării necesității naționale și a ierarhizării obiective a nevoilor privind implementarea trenului metropolitan, s-a aplicat o metodologie unitară pentru toate municipiile reședință de județ care a avut în vedere o analiză multicriterială bazată pe informații complexe care alcătuiesc o bază de date GIS (Sisteme Informatic Geografice) complexă și comprehensivă (extras tabelar reprezentat în tabel 2.2.27) care a permis aplicarea unei funcții scor în mod comprehensiv, coerent și echidistant față de toate cele 42 de municipii reședință de județ analizate.

Analiza care are ca scop ierarhizarea priorităților în ceea ce privește investiția pentru implementarea conceptului de tren metropolitan din România a vizat analiza tuturor celor 41 de municipii reședință de județ și municipiul București (figura 2.2.16).



Figura 2.2.16. Identificarea rutelor trenului metropolitan la nivelul țării

Etape de analiză:

1. *Identificarea stațiilor de cale ferată principale/centrale din fiecare reședință de județ, identificarea liniilor de cale ferată și a stațiilor de cale ferată pe o rază de 30 km.*

Rețeaua feroviară este foarte diversificată și dezechilibrat dezvoltată sau reabilitată. Acest aspect se va reflecta în costurile de implementare ale trenului metropolitan. Cele 42 municipii reședință de județ din România se caracterizează prin prezența unor rute radiale care pleacă în principal de la stația centrală și se conectează cu zone dens populate din apropiere.

După identificarea rutelor care ar putea avea cea mai mare atracție pentru traficul de navetă, s-au calculat mai mulți indicatori semnificativi pentru fiecare traseu: populația deservită, cifra de afaceri, numărul de angajați, numărul agenților economici de-a lungul traseului, indicatorul universității, conexiunea cu aeroportul, deservirea cu potențial turistic, congestia traficului, indicator de timp și viteză.

2. *Extragerea caracteristicilor rutelor identificate:*

- apartenența la rețeaua TEN-T Core, TEN-T Comprehensive, linie magistrală, secundară;
- linie simplă/linie dublă;
- linie electrificată/linie neelectrificată;
- status modernizare: linie modernizată, parțial modernizată, SF în curs, SF în proiect, în plan pentru modernizare, nemodernizată;

3. *Identificarea ariilor de influență aflate la o distanță de 5 km de-o parte și de alta a rutelor selectate.*

4. *Identificarea unităților administrativ teritoriale (UAT) aflate în zona buffer, calcularea numărului total al UAT-urilor pentru fiecare rută feroviară identificată.*

5. *Extragerea informațiilor relevante, în funcție de UAT-urile intersectate, pentru fiecare rută identificată: numărul populației (anul 2015 - INS), cifra de afaceri (anul 2019 - topfirme.ro), numărul de agenți economici (anul 2019 - topfirme.ro), numărul de angajați (anul 2019 - topfirme.ro), numărul de centre universitare și a studenților înmatriculați la nivel de reședință de județ (anul 2018 - INS), numărul de pasageri pentru fiecare aeroport (2019 - INS, pentru aeroportul din Brașov s-a utilizat prognoza din Studiul de Fezabilitate), numărul de înnoptări (2019 - INS).*

6. *Calcularea diferenței de timp de parcurgere a distanțelor acoperite de rutele identificate, atât pe șosea cât și pe calea ferată (pentru detalii vezi tabelul sinteză 2.2.26).*

7. *Calcularea vitezei comerciale feroviare (pentru detalii vezi tabelul sinteză 2.2.26).*

8. *Ponderarea, folosind o funcție scor, a criteriilor identificate și ierarhizarea municipiilor reședință de județ în funcție de justificarea relevanței implementării conceptului de tren metropolitan.*

Având în vedere limitările alocării financiare pentru intervențiile care presupun introducerea conceptului de tren metropolitan (investiții privind modernizarea / reînnoirea / refacția liniei de cale ferată și achiziția de material rulant), pentru o identificare obiectivă a nevoilor specifice ale

țării, dar și pentru o prioritizare clară, în analiză s-au luat în considerare toate cele 42 de orașe cu reședință de județ din România și cei mai relevanți factori care generează trafic de pasageri. Astfel, au fost identificate 144 de rute de tren metropolitan posibile, cu o lungime totală de 1440 km. Din analiză reiese faptul că aceste rute ar putea deservi 1280 de localități unice, însumând 14.77 milioane de locuitori (Figura 2.2.17).



Figura 2.2.17. Identificare dimensiunii nevoilor privind implementarea conceptului de tren metropolitan în România

Tabelul 2.2.26. Baza de date utilizată pentru prioritizarea trenului metropolitan

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
1	Alba Iulia	63536	1000	11772	18577	370750	S1: Alba Iulia - Virtute de Jos - Sibot - Orăștie/Cugir	200A 200 206	Core/Sec	37	DE	Da	15	116286	3330.95	9213	24416	Nu	17982	4330.95	20985	42993	4860.05	45	9	45.5	-0.5	48.8	60561	431311
							S2: Alba Iulia - Teius - Alud	200A 300	Core/Con	32	DE	Partial	13	75358	911.09	6099	11153	138894	1911.09	17871	29730	4340.44	50	7	37	13	51.9	20020	406707	
							S3: Alba Iulia - Cristuru - Blaj	200A 300	Core	35	DE	Da	14	64385	1475.29	5086	13059	Nu	127921	2475.29	16938	31636	3654.89	50	9	44.5	5.5	47.2	38757	409507
							S4: Alba Iulia - Virtute de Jos - Sebes - Miercurea Sibiu	200A 200	Core/Con	42	DE/SN	Partial	12	66139	2395.69	5386	12334	Nu	129695	3395.69	30911	30873	3087.98	40	8	46.31	-6.31	53.7	59698	430488
							S5: Alba Iulia - Zlatna	210	Secundar	41	SN	Nu	12	38093	672.50	3394	6896	Nu	101629	1672.50	15166	FALSE	2478.76	60	13	61.36	-1.36	40.1	18150	18150
TOTAL ALBA IULIA									187			66	360281	8985.53	29178	67858	Nu	135592	17607.6	27054	42677.2	49.00	9.20	47.05	1.95	48.34	42677.20	339272.00		

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
3	Arad	159074	4500	27967	57024	250070	S1: Arad - Arad Vest - Sagu - Vinga - Ortisoara	330	Core	31	SE	In curs	8	44901	393.10	3271	4080	Nu	203975	4893.10	31238	61106	6579.84	45	6	33.5	11.5	55.5	6944	257014
							S2: Arad - Glogovet - Radna (Iipova)	210	Core	35	DE	Da	10	49769	425.22	4974	Nu	208843	4925.22	32941	61363	5966.94	50	6	35.5	14.5	59.2	12219	262289	
							S3: Arad - Sofronia - Curtici	200	Core	17	DE	Da	8	35339	747.50	2898	7074	Nu	194413	5247.50	30865	64098	11436.06	24	2	14.5	9.5	70.3	13373	251443
							S4: Arad - Arad Vest - Pecica	215	Secundara	21	SN	Nu	6	31532	357.20	2409	4163	Da	190066	4857.20	61076	61187	9076.48	35	4	23.5	11.5	53.7	3525	253595
							S5: Arad - Săpăteu German	236	Secundara	30	SN	Nu	9	40879	330.30	2929	4668	Nu	199953	4830.30	30886	61692	6665.10	40	5	31.4	8.6	57.4	2708	252778
							S6: Arad - Zimand - Santana	330	Comprehe	23	DN	In plan	9	58768	758.90	3721	6946	Nu	217842	5258.90	31688	63970	9471.39	40	4	24.5	15.5	56.2	8395	258465
							TOTAL ARAD									257			48	261388	3012.22	20202	33072	Da	202605.3	5002.06	31334	62536	8199.30	40

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
4	Bacău	144307	4200	17494	47936	154472	S1: Bacău - Buhuși S2: Bacău - Secuiei Roman S3: Bacău - Racăciuni	509 500 500	Secundari Core Core	24 32 28	SN DE DE	Nu SF in cur SF in cur	24 19 15	104696 113071 84880	685.60 620.06 231.30	5416 5341 3440	9110 8228 4253	Nu Nu Da	249003 257378 229187	4883.60 4820.06 4431.30	22910 22835 20934	57046 56164 52189	10375.13 8043.06 8185.25	40 45 40	5 4 5	28.1 28.0 29.0	11.9 17.0 11.0	51.3 68.6 57.9	46559 56622 31228	201031 211094 185700	
TOTAL BACAU																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr.agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.euro)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total				
5	Baia Mare	123738	2500	21046	41283	196289	S1: Baia Mare - Tautii Magherus - Apa S2: Baia Mare - Ulmeni Salaj	400 400	Comprehe Comprehe	33 31	SN SN	In plan In plan	15 18	63401 82981	599.20 604.00	5098 7187	9854 9946	Da Nu	187139 206719	3099.20 3104.00	26144 28233	51137 51229	5670.88 6668.35	50 60	6 4	36.0 28.9	14.0 31.1	55.0 64.3	24875 47944	221164 244233				
TOTAL BAI A MARE																																		
									Secundara	64																								

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
6	Bistrita	75076	1800	12013	28926	119857	S1: Bistrita Nord - Saratel - Beclean S2: Bistrita Nord - Bistrita Bargaului S3: Bistrita Nord - Saratel - Sieu S4: Bistrita Nord - Saratel - Sieu Magherus - Lechința	406 400 406 406 400 406	Secundari Secundari Secundari Secundari	36 29 29 28	SE SN SN SE/SN	In plan Nu In plan Nu	9 9 9 10	64664 48198 39890 33550	432.23 139.40 234.30 229.33	4510 3122 2519 2072	5338 2751 2183 1981	Nu Nu Nu Nu	139740 123274 109056 108626	2232.23 1939.40 2034.30 2029.33	16523 15135 14532 14085	34264 31677 31109 30907	3881.67 4250.83 3760.55 3879.50	45 50 45 40	10 11 10 10	48.0 48.8 44.5 45.3	-3.0 1.2 0.5 -5.3	45.0 35.6 39.1 37.1	10216 28537 5017 4528	130073 148394 124874 124385	
TOTAL BISTRITA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
7	Botosani	106847	1100	11452	20290	70003	S1: Botosani - Veresti S2: Botosani - Dorohoi	511 511 512	Secundară Secundară	44 38	SN SN	Nu Nu	18 14	101761 80172	256.70 263.66	4229 4507	4702 5275	Nu Nu	208608 187019	1356.70 1363.66	15681 15959	24992 25565	4741.09 4921.55	40 45	4 4	36.0 32.7	4.0 12.3	73.3 69.7	13094 16734	83097 86737	
TOTAL BOTOSANI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modernizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
8	Braila	180302	1500	12725	31873	103696	S1: Braila - Barboși - Galati S2: Braila - Ianca (Plopu)	700 700	Comprehe Comprehe	31 40	DE DE	In plan In plan	10 14	335958 268315	5135.86 330.16	29307 2836	63533 3614	Nu Nu	516260 448617	663.86 1830.16	46582 20111	95406 35487	16653.55 11215.43	45 50	6 5	33.5 35.0	11.5 15.0	55.5 68.6	169695.0 135337.0	273391.0 239033.0	
TOTAL BRAILA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afaceri reședința de județ (mil.euro)	Nr.agenți economici reședința de județ	Nr. angajați reședința de județ	Nr. înnoptări reședința de județ	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur.o)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aeroport	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
9	Brasov	253200	7400	39859	93025	1305468	S1: Brasov - Darste (Sacele) - Timișul de Sus - Predeal	300	Core	26	DE	SF în curs	7	97094	880.90	10080	15231	Nu	350294	8280.30	49939	108256	13472.85	45	4	25.0	20.0	62.4	1674206	2979674
							S2: Brasov - Bod - Feldioara - Apate	300	Core	37	DE	in curs	14	94268	1104.89	8178	14853	Nu	347468	8504.89	48037	107878	9391.03	50	7	39.5	10.5	56.2	141295	1446763
							S3: Brasov - Ghimbav - Codlea - Vladeni	200	Magistral	27	SN	Nu	9	70434	2908.33	6303	26831	Nu	323624	10308.33	46162	119856	11986.07	45	5	29.7	15.3	54.5	103339	140886
							S4: Brasov - Fieșmer - Chichis - Sf. Gheorghe	400	Magistral	32	SE	Nu	11	367597	8447.90	47533	26881	Nu	620797	15847.90	87392	200942	19399.91	40	7	38.5	1.5	49.9	1461276	2766744
							S5: Brasov - Budlia - Intorsura Buzului	403	Secundar	36	SN	Nu	13	103446	1113.70	8938	16657	Nu	35646	8513.70	48797	109682	8906.83	55	7	40.6	14.4	53.2	161004	1466472
							S6: Brasov - Ghimbav (Aeroport Brasov)	200B	Secundar	8	SE	in proiect	5	105478	3523.70	10602	35738	Da	358678	10923.70	50461	128763	44834.75	34	7	16.0	18.0	30.0	235689	1541157
							S7: Brasov - Cristian - Rasnov - Tohan - Zarnesti	203	Secundar	27	SN	Nu	8	73413	2738.70	6686	25471	Nu	326613	10138.70	46545	118496	12096.38	55	8	37.5	17.5	43.2	617463	1922931
							TOTAL BRASOV													67	911720	10359.73	89320.00	#####	Da	353445.7	10359.73	53904.71	127696	12798.32

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afaceri reședința de județ (mil.euro)	Nr.agenți economici reședința de județ	Nr. angajați reședința de județ	Nr. înnoptări reședința de județ	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur.o)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total			
10	București	1883425	136200	402446	1101429	3549708	S1: Bucuresti Nord - Chisina - Domnesti - Gradinari	900	Core	26	DE	in proiect	12	91733	4871.20	18019	39523	Nu	1975158	141071.20	420465	1140952	75967.62	65	7	34.0	31.0	45.9	20837	3570545			
							S2: Bucuresti Nord - Pipera - Branesti - Fundulea	800	Core	42	DE	Da	16	159386	15269.40	30776	94135	Nu	2042811	151469.40	433222	1195564	48638.36	80	10	51.0	29.0	49.4	29421	3759129			
							S3: Bucuresti Nord - Snagov/Moara Vlasei - Fierbinti	700	Magistral	33	DN/SN	Partial	21	153958	12151.60	28451	84103	Nu	2037383	149351.60	430897	1185532	61738.88	80	11	51.0	29.0	38.0	209759	3759467			
							S4: Bucuresti Progresu - Ilava - Comana - Mihai Bravu	904	Core	32	SN	in proiect	13	87166	1922.04	13574	20794	Nu	1970591	138122.04	416020	1122233	61580.97	60	7	38.5	21.5	45.9	4370	3554078			
							S5: Bucuresti Nord - Ghargani (Centrul Tehnic Titu)	902	Compreh	36	DN	in proiect	29	215415	10617.70	32559	78045	Nu	2098840	146811.70	435005	1179474	58301.11	60	11	52.6	27.4	41.0	224958	3774666			
							S6: Bucuresti Titan - Targanu - Plataresti - Budesti	801	Secundara	34	SN	Nu	11	54863	559.20	3956	4772	Nu	1938286	136759.20	406402	1106201	57008.47	90	8	42.5	47.5	47.9	0	3549708			
							S7: Bucuresti Nord - Chisina - Buftea - Darza - Paris	300	Core	30	DE	Da	10	95599	4258.30	14126	28196	Nu	1983024	140458.30	416572	1129625	66100.80	80	8	39.0	51.0	46.2	5177	3554885			
							S8: Bucuresti Nord - Mogosoaia - Aeroport H.C.	700 700A	Core	21	DE/SN	Partial	8	122903	14879.40	25889	85439	Nu	2006328	151079.40	428335	1186868	95539.43	60	8	35.5	24.5	35.5	221224	3770932			
							S9: Bucuresti Nord - Pipera - Bucuresti Obor	800	Core	20	SN/CN	Partial	3	19184	2778.10	4292	16522	Da	1902609	138978.10	406738	1117951	55130.45	30	3	19.9	20.1	60.3	395	3550101			
							S10 Vest: Bucuresti Nord - Chisina - B. Progresu	900	Core	32	DE/CN	in proiect	29	92520	44496.70	20282	44496	Nu	2117200	141126.70	422728	1145925	61748.28	110	7	38.5	71.5	49.6	14756	3564464			
							S11 Est: Bucuresti Nord - Berceni - B. Progresu	902A	Core	64	E/SE/DN/SN	in proiect	18	233775	21945.10	49555	143504	Nu	2117200	150145.10	452001	1244933	33081.25	140	7	55.9	84.1	69.7	219749	3769456			
							TOTAL BUCURESTI														150	1389502	141671.7	424958.5	1195568	60851.26	81.26	7.91	41.67	38.69	45.81	86412.09	3636130.09

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afaceri reședința de județ (mil.euro)	Nr.agenți economici reședința de județ	Nr. angajați reședința de județ	Nr. înnoptări reședința de județ	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur.o)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
11	Buzau	115494	2.9	13874	34552	78738	S1: Buzau - Sarata Monteoru - Ulmeni - Mizil S2: Buzau - Boboc - Rm. Sarat S3: Buzau - Ca Rosetti S4: Buzau - Berca - Magura - Pârsco	500	Core	35	DE	SF in cur	19	69588	431.10	4057	7136	Nu	185082	434.00	17931	41688	5288.06	45	5	32.5	12.5	64.6	69526	148264
								500	Core	33	DE	SF in cur	13	100620	585.25	6762	8590	Nu	216114	588.15	20636	43142	6548.91	45	3	25.5	19.5	77.6	18701	97439
								702	Compreh	30	DE	in proiect	9	33446	149.98	1771	2518	Nu	148940	152.88	15645	37070	4964.67	35	7	36.0	1.0	50.0	4288	83026
								504	Secundar	33	SN	Nu	15	73762	358.37	4131	5620	Nu	189256	361.27	18005	40172	5735.03	50	8	40.5	9.5	48.9	92518	171256
								TOTAL BUZAU										131	56	277416	1524.71	16721.00	23864.00	Nu	184848	384.074	18054.25	40518	5634.17	43.75

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afaceri reședința de județ (mil.euro)	Nr.agenți economici reședința de județ	Nr. angajați reședința de județ	Nr. înnoptări reședința de județ	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur.o)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
12	Calarasi	65181	978.3	7760	12712	61294	S1: Calarasi Sud - Ciulnita	802	Secundara	27	DE	Nu	5	28744	116.00	1357	1437	Nu	93925	1094.30	9117	14149	3478.70	39	4	25.5	13.5	63.5	61940	123234	
TOTAL CALARASI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afaceri reședința de județ (mil.euro)	Nr agenți economici reședința de județ	Nr. angajați reședința de județ	Nr. înnoptări reședința de județ	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur.o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
13	Cluj Napoca	324576	11700	69625	137191	905210	S1: Cluj Napoca - Baciu - Nadaselu - Agihies S2: Cluj Napoca - Apahida - Jucu - Bontida S3: Cluj Napoca - Apahida - Cojocna - Boju	300 401 300	Comprehe Core Core	28 28 28	DN DE DE	SF in cur in proiect in proiect	10 12 6	65108 45888 2542	1007.50 600.10 63.48	13163 5207 3167	13733 11119 5729	Nu Da Nu	389684 370464 349818	12707.50 12300.10 11763.48	82788 74832 72792	150924 148310 142920	13917.29 13230.86 12493.50	40 55 60	9 8 7	42.3 38.0 35.0	-2.3 17.0 25.0	39.7 44.2 48.0	83052 20433 16339	988262 925643 921549	
TOTAL CLUJ NAPOCA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afaceri reședința de județ (mil.euro)	Nr.agenți economici reședința de județ	Nr. angajați reședința de județ	Nr. înnoptări reședința de județ	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur.o)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
14	Constanța	283872	6600	44398	81404	1888250	S1: Constanța - Valul lui Traian - Murfatlar - Medgidia S2: Constanța - Eforie N. - Costinesti - Mangalia S3: Constanța - Agiza E. - Constanta Ferry Boat S4: Constanța - Ovidiu - Navodari	800 800 800 813 818	Core Magistral Secundar Secundar	35 43 13 24	DE DE/SN DE/SE SN	Da in proiect SF in curs Nu	12 11 3 4	135363 112825 32638 77578	756.20 770.90 284.10 4039.40	10023 12701 4238 7239	13168 18945 316510 11213	Nu Nu Nu Da	419235 396697 316510 361450	7356.20 7370.90 6884.10 10630.40	54421 57099 48636 51637	94572 100349 24346.92 92617	11978.14 9225.51 24346.92 15060.42	55 50 34 45	8 11 16 4	41.5 56.5 16.1 25.1	13.5 -6.5 7.9 19.9	50.6 45.7 100048 57.4	29978 296963 100048 311024	1918228 4858213 2888298 2199274	
TOTAL CONSTANTA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr.agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.euro)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
15	Craiova	269506	6300	32242	69197	175438	S1: Craiova - Carcea - Pielești - Băls S2: Craiova - Banu M. - V. Carcea - Icu - Ianca S3: Craiova - Isalnita - Bebarca - Racari - Filiași S4: Craiova - Podari - Sălcuța	901 900 900 912	Secundar Core Core Core	31 31 36 27	SN DE DE SN	In proiect In proiect SF în curs SF realizat	15 15 15 10	57883 45534 66264 49296	889.57 612.60 156.54 997.10	5447 4240 3793 5224	11330 9102 3260 13040	Da Nu Nu Nu	327387 334660 335770 318802	7189.57 6912.60 6456.54 7297.10	37689 36482 36035 37466	82527 78299 72457 82237	10560.82 10150.32 9326.94 11807.48	50 50 50 55	8 8 10 5	40.9 39.5 48.0 29.7	9.1 10.5 2.0 25.3	45.5 47.1 45.0 54.5	16975 12588 11462 15787	192411 188026 186000 191225	
TOTAL CRAIOVA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.euro)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
16	Deva	61123	1000	9056	19917	62440	S1: Deva - Mintia - Ila	200	Core	33	DE	In curs	10	23587	153.56	1996	2344	Nu	84710	1153.56	11052	22261	2566.97	30	6	34.5	-4.5	57.4	7099	69539
							S2: Deva - Simeria - Orastie	200	Core	26	DE	Da	10	53378	562.74	4823	8765	Nu	114501	156.74	13879	28682	4403.88	40	6	32.2	7.8	48.5	19271	81661
							S3: Deva - Simeria - Hunedoara	207	Core/Sec	24	DE	Partial/It	7	98728	575.60	6852	10343	Nu	159851	1575.60	15908	30260	6660.46	30	3	21.0	9.0	68.6	45070	107460
							S4: Deva - Simeria - Calan	202	Core/Con	24	DE	Da/Inch	11	45903	238.14	3868	4605	Nu	106626	1238.14	12934	24522	4443.75	40	5	27.0	13.0	53.3	4786	67226
							TOTAL DEVA									83		38	221196	1538.03	17539.00	26057.00	Nu	116422	1382.509	13440.75	26431.3	35.00	5.00	28.67

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
17	Dr. Tr. Severin	92617	500.5	9800	11398	96383	S1: Dr.Tr.Severin - Balota - Prunisor S2: Dr.Tr.Severin - Orsova - Baile Herculane	900 900	Core Core	29 41	SE SE	SF in curs SF in curs	9 8	30584 101.00	71.97 2346	1539 2219	1343 601.50	Nu Nu	123201 126457	572.47 601.50	11339 12146	12736 13612	4248.31 3084.32	40 45	7 10	35.5 50.5	-4.5 -5.5	49.0 48.7	8981 646894	105564 743277	
TOTAL DR.TR.SEVERIN																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
18	Focsani	79315	1100	9655	20791	34883	S1: Focsani - Gugesti - Rm. Sarat S2: Focsani - Marasesti - Panciu	500 500 / 507	Core Core/Sec	38 38	DE DE/SN	SF in curs SF in curs	20 13 33	139570 48511 78815	880.80 324.20 1205.00	8829 4312 13025	11364 6108 17692.00	Nu Nu Nu	218685 158130 188407.5	1980.80 1424.20 1702.5	18484 13967 26225.5	32375 26899 29637	5754.87 4161.32 4958.09	50 45 47.5	5 6 5.50	34.0 37.0 35.50	16.0 16.0 12.00	67.1 61.6 63.64	15898 11129 13513.50	50781 46012.5 48396.50	
TOTAL FOCSANI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință a de județ (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată fara reședința a de județ	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km²	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
20	Giurgiu	61353	488.2	7686	8594	22305	S1: Giurgiu - Giurgiu Nord - Daia - Comana S2: Giurgiu - Giurgiu Nord - Toporu	902 903	Core Comprehe	38 34	DN SN	SF în curs în plan.	14 7	57772 20453	403.64 72.50	3530 1210	3442 1137	Nu Nu	119125 81806	891.84 560.70	11216.00 8896.00	12036 9731	3134.87 2406.06	55 55	8 7	44.7 39.5	10.3 15.5	51.0 51.6	3376 0	25681 22305	
TOTAL GIURGIU																															
															21	78225	72.14	4740.00	4579.00	Nu	100465.5	726.2712	10085.5	2770.46	55.00	7.50	42.14	12.86	51.28	1688.00	23993.00

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
19	Galati	249432	5000	27463	60814	167193	S1: Galati - Barboși - Braila S2: Galati - Barboși - Independența S3: Galati - Tulucești - Foltesti	700 704 703	Comprehe Comprehe Secundar	31 33 34	DE DE SN	In plan In plan/It Nu	10 12 10	243139 48511 44247	1635.86 203.30 147.69	19119 2468 2044	34592 3190 2898	Nu Nu Nu	492571 297943 293679	6635.86 5203.30 5147.69	46582.00 29931.00 29507.00	95406 64004 63712	15889.39 9028.88 8637.62	55 50 55	6 8 6	33.5 40.5 36.5	21.5 9.5 18.5	55.5 48.9 55.8	106198 11755 429	273391 168948 167622	
TOTAL GALATI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr.agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Modulizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
21	Iasi	460256	4800	42930	80078	522094	S1: Iasi - Letcani - Podul Iloaiei - Tg. Frumos S2: Iasi - Nicolina - Căurea - Barnova - Scanteia S3: Iasi - Nicolina - Socola - Holboca - Ungheni Prut	606 600 600	Core Magistral Magistral	45 29 21	DE DN SN	SF in curs Nu Nu	21 13 10	135784 99210 85141	1312.91 963.70 1150.90	9105 6536 8280	14500 9183 11918	Nu Nu Da	596040 559466 545397	6112.91 5763.70 5950.90	52035.00 49466.00 51210.00	94578 89261 91996	13245.33 19291.93 25971.29	60 60 60	5 6 6	37.5 33.8 29.5	22.5 26.2 30.5	72.0 51.5 42.8	27995 20901 10163	550089 542995 532257	
TOTAL IASI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economic i	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comer ciala(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
22	Miercurea Ciuc	38966	609.2	6162	10786	85137	S1: Miercurea Ciuc - Sâncraieni - B.Tusnad - Bicazd S2: Miercurea Ciuc - Siculeni - Iz.Oltului - Iz. Mures S3: Miercurea Ciuc - Siculeni - Livezi Ciuc	400 400 501	Magistral Comprehe Comprehe	35 36 26	SE SE SE	Nu Nu Nu	12 13 13	32531 37618 36803	151.50 110.40 108.00	1958 2518 2255	2878 2339 2212	Nu Nu Nu	71497 76584 75769	760.70 719.60 717.20	8120.00 8680.00 8417.00	13664 13125 12998	2042.77 2127.33 2914.19	45 45 40	9 45.0 31.0	7 9.0 0.0	38.5 45.0 0.0	11.5 48.0 50.3	54.5 48.0 50.3	141760 16919 26905	226897 102056 110042
TOTAL MIERCUREA CIUC																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economic i	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerciala(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
23	Oradea	196367	5000	36853	71196	394784	S1: Oradea - Osorhei - Sacadat - Tileagd - Aleud	300	Comprehe	35	SN	SF in cur	15	69208	625.80	7541	11124	Nu	265575	5625.80	44394.00	82320	7587.86	60	9	46.1	13.9	45.6	997301	1392085
							S2: Oradea - Ep. Bihor - Biharia - Rosiori Bih. - Diosig	402	Comprehe	34	SN	In plan	10	44904	1125.60	4354	9667	241271	6125.60	41207.00	80863	7096.21	40	5	33.5	6.5	60.8	44904	439688	
							S3: Oradea - Les - Cefa - Salonta	310	Comprehe	40	SN	In plan	9	67267	1811.90	9076	21453	263634	6811.90	45979.00	92649	6590.85	55	6	39.8	15.2	60.3	67267	462051	
							S4: Oradea - Santandrei - Chersig	312	Secundar	23	SN in bna	Nu	7	25623	1083.20	3858	11294	221990	6083.20	40711.00	82490	9651.74	45	5	27.5	17.5	50.1	25623	420407	
							S5: Oradea - Baile Felix - Cordau - Tasad	314	Secundar	30	SN in bna	Nu	8	39905	364.70	5464	7669	23677	71.4	78865	7161	482	39905	434689						
TOTAL ORADEA								162	49	246907	102120	302930	61207.00	DE 24574.84	6002.24	83437.4	7760.48	49.0	6.40	36.87	12.13	52.98	235000.00	629794.00						

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr.agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerciala(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
24	Piatra Neamț	95055	962.5	10764	17316	105025	S1: P. Neamț - Savinesti - Roznov - Podoleni - Buhusi S2: P. Neamț - Pangrati - Tarcau - Bicaz	509 509	Secundară Secundară	30 26	SN SN	Nu Nu	18 9	122380 43843	862.00 171.60	5208 3052	10081 3559	Nu Nu	217865 138898	1824.50 1134.10	15972.00 13816.00	27397 20875	7262.17 5342.23	50 35	7 6	37.4 32.2	12.6 2.8	48.2 48.5	17017 75540	122042 180655	
TOTAL PIATRA NEAMT																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economic i	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comer ciala(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
25	Pitești	155282	4900	24987	52804	142118	S1: Pitești - Golesti - Calinesti - Patroala - Gaesti S2: Pitești - Bradu - Parvu - Costesti S3: Pitești - Bascov - Merisani - Bailestii - Curtea Ag. S4: Pitești - Golesti - Ciurteni (Mioveni) - Stalpeni	901 901 906 905	Comprehe Secundar Secundar Secundar	38 22 38 38	DN SN SN SN	In plan In plan Nu Nu	17 18 19 17	122190 65975 124648 126158	2187.30 3622.20 2699.50 8623.20	9639 6121 10998 10417	26955 6121 36546 50318	Nu Nu Nu Nu	277472 221257 279930 281440	7087.30 6522.20 7599.50 13523.20	34626.00 31108.00 35985.00 35404.00	79759 74522 89350 103122	7301.89 10057.14 7366.58 7406.32	60 49 55 45	7 6 7 9	41.7 30.0 41.7 47.7	18.3 19.0 13.3 -2.7	54.6 44.0 54.6 47.8	37968 34187 79349 57854	180086 176305 221467 199972	
TOTAL PITESTI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr.agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr.agenți economic i	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comer ciala(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
26	Ploiești	209945	5700	28787	62646	125040	S1: Ploiești Sud - Brad - Crivina - Scovitea - Peris	500	Core	29	DE	Da	15	95009	1027.80	7533	14804	Nu	304954	6727.80	36320.00	77460	10515.46	40	6	32.5	7.5	53.5	23571	148611	
							S2: Ploiești Sud - V. Calugareasa - Crifov - Mlati	500	Core	34	DE	SF in cur	15	86061	864.60	4977	11167	Nu	296006	6564.60	33764.00	73813	8706.06	50	7	38.0	12.0	53.7	15436	140476	
							S3: Ploiești Sud - Floresti Ph - Campina	300	Core	36	DE	In plan	23	205969	2540.96	16029	46696	Nu	415913	8240.96	44816.00	109342	11553.14	55	5	33.0	22.0	65.5	96444	221484	
							S4: Ploiești Sud - Ploiesti - Stanic	306	Secundar	44	SN	Nu	23	148181	1342.19	10236	31393	Nu	358126	7042.19	39023.00	94039	8139.23	70	13	63.0	7.0	41.9	122316	247356	
							S5: Ploiești Sud - Targusoru - Il. Caragiale - Mija	302	Secundar	30	SN	Nu	14	106246	1034.20	7378	28046	Nu	316191	6734.20	36165.00	90692	10539.70	55	9	43.4	11.6	41.5	49334	174374	
							S6: Ploiești Sud - Blejoi - Scalan - Boldesti - V.de Munte	304	Secundar	21	SN	Nu	21	141853	1654.47	10211	25357	Nu	351798	7354.47	38998.00	88003	10660.55	65	12	54.0	11.0	36.7	78211	203251	
							S7: Ploiești Sud - Zancoaga - Draganești Ph. - Clorani	701	Secundar	33	SN	Nu	15	83237	482.71	4228	4228	Nu	293182	6182.71	33015.00	69207	8884.30	65	9	45.0	10.0	44.0	10588	135628	
																	229		126	866585	8546.49	60592.90	888888	Nu	3337384	67873.12	37544	86676.98	55.71	8.71	44.12
TOTAL PLOIESTI																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economic i	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comer ciala(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
27	Rm. Valcea	98776	1900	12492	30059	120988	S1: Rm. Valcea - Ostroveni - Baureni - Govora - Ionesți S2: Rm. Valcea - Bujoreni - Calimnesti - Lotru (Brezo)	201 201	Secundară Secundară	30 32	SN DN	Nu Nu	16 11	66725 39800	520.70 300.73	3359 2586	6332 4604	Nu Nu	165501 138576	2420.70 2200.73	16021.00 15078.00	36391 34663	5516.70 4930.50	45 55	9 9	43.4 44.5	1.6 10.5	41.5 43.2	19550 747503	140538 864891	
TOTAL RM. VALCEA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședința a de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur o)	Nr agenți economic i	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerciala(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
28	Resita	73282	523.7	7993	9184	35835	S1: (Resita Sud) Resita Nord - Caransebes S2: (Resita Sud) Resita Nord - Vasiova - Bocsa M. - Berzovia	915 926	Secundar Secundar	39 27	SE SN	Nu Nu	13 9	55011 36801	488.08 163.09	4365 1564	11698 2297	Nu Nu	128293 110083	1011.78 686.79	12358.00 9557.00	20882 11481	3289.56 4077.15	55 45	7 7	42.3 35.7	12.7 9.3	55.4 45.3	60661 3722	96496 39557	
TOTAL RESITA																															

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur. a)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț al(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
29	Satu Mare	102411	2200	13524	32802	67489	S1: Satu Mare - Botiz - Odoreu - Medieșu Auril - Apa S2: Satu Mare - General Ghe. Avramescu - Carei S3: Satu Mare - Micula - Halmeu S4: Satu Mare - Botiz - Livada Noua	400 402 402 417	Compreh Compreh Secundara Secundara	27 33 23 21	SN SN Nu SN inchia	In plan In plan Nu Nu	14 16 9 8	70764 78893 40198 42196	497.00 1232.20 240.90 360.40	4334 5221 2192 2411	6953 15023 3038 4415	Nu Da Nu Da	1731.75 1813.04 1426.09 1446.07	2697.00 3432.20 2420.90 2560.40	17858.00 18745.00 15716.00 15935.00	39753 47825 35840 37217	6413.89 5494.06 6200.39 6886.05	40 50 55 40	4 6 30 4	26.7 36.0 24.5 23.5	13.3 14.0 10.5 16.5	60.6 55.0 56.2 53.7	11342 27798 6444 9719	80631 95387 73933 77208
TOTAL SATU MARE										104			47	232051	2330.50	14158.00	29427.00		160423.8	2782.625	17063.5	40158.8	6248.60	46.25	4.50	27.68	18.57	56.39	14275.75	81764.75

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur. a)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț al(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
30	Sf. Gheorghe	56006	828.8	7213	13894	31569	S1: Sf. Gheorghe - Chichis - Prejmer - Brasov S2: Sf. Gheorghe - Bodoș - Malnas - Baile Tusnad S3: Sf. Gheorghe - Moacșă - Covasna - Catalina - Tg. Securis	400 400 404	Magistral Magistral Secundara	32 34 45	SE SE SE	Nu Nu Nu	16 14 21	358017 35917 90943	8447.90 122.20 454.59	47533 2224 5482	107917 2298 9324	Nu Nu Nu	414023 91923 146949	9276.70 951.00 1283.39	54746.00 9437.00 12695.00	121811 16192 32118	12938.22 2703.62 3265.33	45 45 40	7 6 11	37.0 35.0 55.5	8.0 10.0 -15.5	51.9 58.3 48.6	1461276 161746 552505	1492845 193515 594074
TOTAL SF. GHEORGHE										66			30	399394	8024.69	55239.00	107917		217631.7	3837.031	25626	53740.3	6302.46	43.39	8.00	42.50	0.83	52.94	725175.67	756744.67

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur. a)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț al(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
31	Sibiu	147245	4700	26842	59860	670498	S1: Sibiu - Mohu - Vestem - Talmacuș - Podu Olt - Avrig S2: Sibiu - Cristian - Orlat - Sacel - Saliste S3: Sibiu - Ocna Sibiu - Ioannes - Hasag - Seica Mare S4: Sibiu - Mohu - Vestem - Talmacuș - Podu Olt - V. Marușă	200 200 301 200 201	Compreh Compreh Secundara Compreh	33 30 34 31	DN/SN SN/DN SN DN/SN	Nu In plan Nu In plan	11 13 12 17	72203 71601 66872 72203	1299.20 1429.80 1215.20 1299.20	7323 7916 6917 7323	16783 17938 15209 16783	Nu Da Nu Nu	219448 218846 214117 219448	5999.20 6129.80 33759.00 5999.20	34165.00 34758.00 75069 34165.00	76643 77798 75069 76643	6649.94 7294.87 6297.56 7078.97	40 40 50 40	11 7 8 11	53.0 37.4 42.5 49.9	-11.0 2.6 7.5 -9.9	38.8 48.2 47.9 37.3	82499 87423 69169 82499	752997 757921 739667 752997
TOTAL SATU MARE										128			47	282879	5243.40	29479.00	66713.00	Da	217964.8	6010.85	34211.75	76538.3	6830.33	42.50	9.25	45.20	-2.70	43.05	80397.50	750895.50

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur. a)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț al(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
32	Slatina	70293	2800	7772	26322	52810	S1: Slatina - Potocava - Corbu S2: Slatina - Piața Olt - Băls S3: Slatina - Piața Olt - Ganeasa - Colibasi S4: Slatina - Piața Olt - Vladuleni	901 901 901 201 910	Secundara Secundara Secundara Secundara	33 30 33 31	SN SN SN SN	In plan In plan In plan Nu	16 14 13 15	53721 57842 39108 39854	135.30 251.87 153.05 128.90	2696 3285 2235 1807	3511 4080 2369 2003	Nu Nu Nu Nu	124014 128135 109401 110147	2935.30 3051.87 2953.05 2928.90	10468.00 11057.00 10007.00 9579.00	29833 30402 28691 28325	3758.00 4271.17 3315.18 3553.13	65 55 30 40	5 7 8 7	33.0 37.4 42.0 37.9	32.0 17.6 -12.0 -2.1	60.0 48.2 47.1 49.1	8612 3981 335 2635	61422 56791 53145 55445
TOTAL SLATINA										96			58	190525	669.12	10023.00	11963.00	Nu	117924.3	2967.28	10277.25	29312.8	3724.37	47.50	6.75	37.57	9.99	51.10	3890.75	56700.75

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur. a)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț al(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
33	Slobozia	45891	1100	5500	10725	21228	S1: Slobozia Vechi - Slobozia Sud - Ciulința S2: Slobozia - Andrașesti - Cazanesti S3: Slobozia - Bucu - Ograda - Tandarei	802 701 701	Secundara Secundara Secundara	17 30 29	SN SN SN inchia	Nu Nu Nu	7 13 13	30291 38283 51354	249.30 157.30 254.60	1655 2045 2361	2524 2301 2965	Nu Nu Nu	76182 84174 97245	1349.30 1257.30 1354.60	7155.00 7545.00 7861.00	13249 13026 13690	4481.29 2805.80 3353.28	28 35 35	3 5 4	18.3 31.4 27.8	9.7 3.6 7.2	55.8 57.4 62.5	143967 143275 144691	165195 164503 165919
TOTAL SLOBOZIA										76			33	129928	661.20	6061.00	7790.00	Nu	85867	1320.4	7520.333	13221.7	3546.79	32.67	4.00	25.82	6.85	58.59	343977.67	365206.67

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația la reședința de județ	Cifra afacerii reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Modul nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur. a)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț al(km/ h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total
34	Suceava	92121	1300	12512	24103	155174	S1: Suceava - Veresti - Iiteni S2: Suceava - Darmanesti - Dornesti - Radauti S3: Suceava - Stroiesti - Lucaceti - Gura Humorului	500 500 515 502	Core Core / Sec Core	29 41 42	DE SN SE	SF in cur SF in cur In plan	16 27 23	111188 180930 136593	868.46 1847.03 1044.89	5515 9979 7542	10799 18043 13709	Nu Nu Nu	203309 273051 228714	2168.46 3147.03 2344.89	18027.00 22491.00 20054.00	34902 42146 37812	7010.66 6659.78 5445.57	50 55 65	5 6 8	29.5 40.4 45.0	20.5 14.6 20.0	59.0 60.9 56.0	48793 89573 269890	203967 244747 425064
TOTAL SUCEAVA										112			66	428711	3760.38	23036.00	42551.00	Nu	235024.7	2553.48	20190.67	38286.7	6372.00	56.67	6.33	38.29	18.38	58.64	136085.33	291259.33

Nr. art.	Resedința de județ	Populația la resedința a de județ	Cifra afaceri resedință (mil.euro)	Nr. agenți economici resedință	Nr. angajați resedință	Nr. innoptări resedință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara resedința a de județ)	Populația cumulată (fara resedința de județ)	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr. agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populația totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr. agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	temp rutier (min)	nr. stații	temp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț ală(km/h)	Nr. innoptări	Nr. innoptări total	
35	Târgoviște	79610	1200	10637	21226	86845	S1.Târgoviște - Nucet - Titu S2.Târgoviște - Doicești - Pucioasa - Fieni - Pietrosita S3.Târgoviște - Rasnau - Bucșani - Mija	904 904 302	Secundară Secundară Secundară	32 35 22	DN SN SN închisă	Nu Nu Nu	22 25 10	116699 133440 78363	706.40 634.97 567.50	6365 6939 4413	8085 8767 8225	Nu Nu Nu	196309 213050 157973	1906.40 1834.97 1747.50	17002.00 29993 15050.00	29311 6087.14 29451	6134.66 271048 7180.59	45 60 35	8 14 4	41.5 61.1 24.0	3.5 -1.1 11.0	46.3 34.4 55.0	9604 186203 15362	96449 271048 102207	
TOTAL SLOBOZIA																															

Nr. art.	Resedința de județ	Populația la resedința a de județ	Cifra afaceri resedință (mil.euro)	Nr.agenți economici resedință	Nr. angajați resedință	Nr. imnoplări resedință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara resedința a de județ)	Populație cumulată (fara resedința de județ)	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comerț ală(km/h)	Nr. imnoplări	Nr. imnoplări total	
36	Târgu Jiu	82504	1500	10048	30566	90279	S1.Tg.Jiu - Valea Sadului - Lainici S2.Tg.Jiu - Carbonești S3.Tg.Jiu - Rovinari	202 202 221	Comprehe Comprehe Comprehe	31 25 31	SE SE/DE SE	In plan In plan In plan	6 7 11	20409 59.31 56226	75.90 59.31 117.20	1259 1553 2834	14954 1457 3356	Nu Nu Nu	102913 110955 138730	1575.90 1559.31 1617.70	11307.00 11601.00 12882.00	45520 32023 33922	3319.77 4438.20 6031.74	45 35 35	8 6 7	39.5 30.5 32.5	5.5 4.5 2.5	47.1 49.2 42.5	10462 6762 1023	100741 97041 91302	
TOTAL TARGU JIU																															

Nr. art.	Resedința de județ	Populația resedinței a de județ	Cifra afaceri resedință (mil.euro)	Nr agenți economici resedință	Nr. angajați resedință	Nr. înnoptări resedință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT-uri (fara resedința a de județ)	Populație cumulată (fara resedința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur a)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totală	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
37	Tg. Mures	134290	4400	20540	42227	311708	S1: Tg. Mures - Dumbravioara - Gornesti - Reghin S2: Tg. Mures - Sânpaul - Iernut - Cuci - Bogata - Ludus	405 405	Secundară Secundară	32 40	SN SN	Nu Nu	21 21	129606 1622.59	1775.80 2622.59	11791 9405	24002 18514	Nu Da	263896 243622	6175.80 6022.59	32331.00 29945.00	66229 60741	8246.75 6090.55	70 65	6 12	35.5 57.8	34.5 7.2	54.2 41.5	129781 160909	441489 472617	
TOTAL TG. MURES																															

Nr. crt.	Resedinta de judet	Populat a resedinta a de judet	Cfra afaceri resedință (mil.euro)	Nr.agenți economici resedință	Nr. angajati resedință	Nr. innoptări resedință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotari	Moder nizat	Nr. UAT- uri (fara resedinta a de judet)	Populatie cumulata (fara resedinta a de judet)	Cfra afaceri (mil.eur a)	Nr.agenți economici	Nr. angajati	Aero port	Populatie totala	Cfra afaceri totală (mil.euro)	Nr.agenți economici total	Nr. angajati total	Indicator pop./km	temp rutier (min)	nr. statii	temp feroviar (min)	diferenta (min)	viteza medie comercia la(km/h)	Nr. innoptări	Nr. innoptări total
38	Timisoara	319279	11000	57165	139692	709626	S1: Timisoara Nord - Ortisoara - Baile Calacea - Virje	310	Core	32	SE	SF realizat	6	34821	684.40	3532	7493	Nu	354100	11684.40	60697.00	141175	11065.63	50	7	37.0	13.0	51.9	2953	712579
							S2: Timisoara Nord - Ghirada - Remetea - Recas	900	Core	23	SE	SF realizat	7	41790	2459.20	8760	22253	Nu	41790	13459.30	65925.00	155935	1814.35	50	5	26.5	23.5	52.1	22876	732502
							S3: Timisoara Nord - Timisoara Est (Aeroport) - Giarmata	213	Secundara	24	SN	Nu	6	33463	2263.80	7275	20564	Da	33463	13283.80	64440.00	154248	1394.29	50	3	22.1	27.9	65.2	17511	727137
							S4: Timisoara Nord - Uluc - Gros - Sacosu - Buzas	918	Secundara	38	SN	Nu	7	35973	793.30	6345	12738	Nu	35973	11795.30	63510.00	146426	946.66	60	9	47.7	12.3	47.8	117474	827100
							S5: Timisoara Nord - Jebel - Voiviera	922	Core	33	SN	In plan	10	40071	864.40	5546	12684	Nu	40071	11864.40	62711.00	146366	1214.27	50	6	36.0	14.0	55.0	21151	730777
							S6: Timisoara Nord - Ubin - Pedu Nou	926	Secundara	25	SN	Nu	7	38694	921.30	5987	13086	Nu	38694	11921.30	63152.00	146768	1547.76	45	5	28.6	16.4	52.4	16933	726559
							S7: Timisoara Nord - Sacalaz - Carpinis - Jimbolia	919	Secundara	39	SN	Nu	11	45043	945.40	4845	10743	Nu	45043	13459.30	61763.00	146768	1557.51	60	3	36.9	23.7	64.5	10327	719953
							S7: Timisoara Nord - Sarandrei - Chinez - Gelu	217	Secundara	35	SN	Nu	8	42140	590.90	3938	6597	Nu	42140	11921.30	60503.00	140279	1204.00	55	8	43.1	11.9	48.7	9948	719474
							S8: Timisoara Nord - Ronet - Biled - Sandra	217	Secundara	34	SE/SN	Nu	14	50391	669.70	3727	6716	Nu	50391	11669.70	60892.00	140598	1480.32	55	5	39.5	21.5	62.8	174	709800
TOTAL TIMISOARA										283		76	377966	1346.48	70449.19	164389		87155.69	1346.48	60399.88	164389	12778.10	59.38	6.63	38.36	20.52	60.30	27405.98	825793.19	

Nr. crt.	Resedința de județ	Populația reședinței a de județ	Cifra afaceri economice reședință (mil.euro)	Nr. agenți economici reședință	Nr. angajați reședință	Nr. înnoptări reședință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT-uri (fara reședința a de județ)	Populație cumulată (fara reședința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur o)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comer cială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
39	Tulcea	73707	1300.00	8352	19424	143704	S1:Tulcea - Cataloi - Zebil - Babadag	804	Secundara	39	SN	Nu	9	38815	281.45	2717	2766	Da	112522	1581.45	11069.00	22190	2885.18	24	5	34.5	-10.5	67.8	6356	150060	
TOTAL TULCEA																															

Nr. art.	Resedința de județ	Populația resedinței a de județ	Cifra afacerii resedinței (mil.euro)	Nr agenți economici resedinței	Nr. angajați resedinței	Nr. înnoptări resedinței	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT-uri (fara resedința a de județ)	Populația cumulată (fara resedința de județ)	Cifra afacerii (mil.eur a)	Nr agenți economici i	Nr. angajați	Aero port	Populația totala	Cifra afacerii totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	timp rutier (min)	nr. stații	timp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială(km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
40	Vaslui	55407	670.7	5774	11337	28870	S1: Vaslui - Buhărești - Rebricea - Scanteia S2: Vaslui - Crasna - Banca	600 600	Magistrală Magistrală	38 36	DN DN	Nu Nu	20 14	76365 59254	106.26 206.09	2441 2056	2073 114661	Nu Nu	131772 57741.8	776.96 1539.80	8215.00 12848.00	13410 19496	3467.68 2510.51	50 35	7 5	40.0 26.5	10.0 8.5	57.0 52.1	5108 3393	33978 50901	
TOTAL VASLUI																															

Nr. art.	Resedința de județ	Populația resedinței a de județ	Cifra afaceri resedință (mil.euro)	Nr agenți economici resedință	Nr. angajați resedință	Nr. înnoptări resedință	Ruta	Tabela	Rețea	Lungime (km)	Dotări	Moder nizat	Nr. UAT-uri (fara resedința de județ)	Populație cumulată (fara resedința de județ)	Cifra afaceri (mil.eur a)	Nr agenți economici	Nr. angajați	Aero port	Populație totala	Cifra afaceri totală (mil.euro)	Nr agenți economici total	Nr. angajați i total	Indicator pop./km	țimp rutier (min)	nr. stații	țimp feroviar (min)	diferența (min)	viteza medie comercială (km/h)	Nr. înnoptări	Nr. înnoptări total	
41	Zalău	56202	1300	9869	15349	47308	S1: (Zalău) Zalău Nord - Mîrșid - Poștelec - Cuceu Sălb - Jibou S2: Zalău Zalău Nord - Gurulau - Borla - Bocșa SJ - Sarmăș	412 412	Secundară Secundară	23 23	SN SN	Nu Nu	12 12	1503.8 1539.8	203.8 239.8	3571 2979	4190 4147	Nu Nu	57705.8 57723.8	1503.80 1521.8	13440.00 13144	19539 19517.5	2508.95 2509.73	28 31	4 50	23.5 26.5	4.5 8.5	58.7 55.40	11269 743.00	58577 54739.00	
TOTAL ZALĂU																															

CONFIDENTIAL

Metodologia analizei multicriteriale (AMC) se bazează pe următoarele criterii:

1. **Populație/km rute – 20%**
2. **Cifra de afaceri – 10%**
3. **Numărul agenților economici – 10%**
4. **Numărul angajaților – 10%**
5. **Potențialul universitar – 10%**
6. **Potențial de deservire aeroport – 10%**
7. **Potențial de deservire turistică – 10%**
8. **Potențial de descongestie/câștig de timp – 10%**
9. **Viteza comercială feroviară – 10%**

Tabelul 2.2.27. Metodologia de evaluare pentru fiecare criteriu este sintetizată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Criteriu	Pondere	Criteriu de evaluare	Modul de punctare*
1	Populație/km rute (pop/km)	20%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a calculat valoarea populației UAT-urilor intersectate de rutele identificate și s-a raportat la numărul de km al rutelor. Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
2	Cifra de afaceri (ca)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a calculat valoarea totală a cifrei de afaceri a UAT-urilor intersectate de fiecare rută identificată. Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
3	Numărul agenților economici (ae)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a calculat numărul total al agenților economici din fiecare UAT intersectat de rutele identificate. Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
4	Numărul angajaților (a)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a calculat numărul total al persoanelor angajate din fiecare UAT intersectat de rutele identificate. Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
5	Potențial universitar (pu)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a calculat valoarea potențialului universitar al tuturor UAT-urilor intersectate de rutele identificate. Valoarea finală reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută. Potențialul universitar a fost calculat acordându-se ponderea de 5% numărului de universități și 50% numărului de studenți înmatriculați.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
6	Potențial de deservire aeroport (aer)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a identificat existența sau lipsa deservirii unui aeroport și s-a calculat numărul total al pasagerilor din aeroporturile deservite.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj

				proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
7	Potențial de deservire turistică (tur)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a calculat valoarea potențialului de deservire turistică a tuturor UAT-urilor intersectate de rutele identificate pentru care s-a contorizat numărul de înnopțări declarate. Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
8	Potențial de descongestie / câștig de timp (timp)	10%	Pentru fiecare municipiu reședință de județ s-a analizat timpul de parcurgere a distanțelor în funcție de rutele identificate, atât pe rutier cât și feroviar. Pentru calcularea timpului feroviar s-a utilizat lungimea rutelor raportată la viteza de mers a trenului în funcție de tipul de șină (electrificată - 120 km/h sau neelectrificată - 110 km/h) la care s-a adăugat timpul necesar opririi trenului în toate stațiile rutei (3 minute ori numărul de stații de pe fiecare rută) iar pentru timpul rutier s-a utilizat platforma GoogleMaps și s-a extras timpul parcurs la ora de vârf pentru fiecare rută. Ora de vârf a fost considerată 07.00-08.00 AM, în ziua de marți, luna aprilie 2021. Valoarea finală reprezintă diferența între timpul parcurs pe rutier și cel parcurs pe calea ferată. Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
9	Viteza comercială feroviară (vit)	10%	Viteza comercială a fost calculată prin raportarea lungimii rutei la timpul calculat pentru feroviar considerat într-o oră. Pentru calcularea timpului feroviar s-a utilizat lungimea rutelor raportată la viteza de mers a trenului în funcție de tipul de șină (electrificată - 120 km/h sau neelectrificată - 110 km/h) la care s-a adăugat timpul necesar opririi trenului în toate stațiile rutei (3 minute ori numărul de stații de pe fiecare rută). Valoarea finală a municipiului reședință de județ reprezintă media aritmetică a valorilor obținute pentru fiecare rută.	Intervalul 100-0 puncte. Normalizarea valorilor s-a realizat prin acordarea a 100 puncte pentru municipiul cu valoarea ce mai mare, iar pentru celelalte municipii, s-a acordat un punctaj proporțional până la valoarea 0, valoare primită pentru municipiul cu cea mai mică valoare.
	TOTAL	100 %		

**deoarece Municipiul București înregistrează cele mai mari valori pentru toate criteriile (mai puțin pentru viteza comercială), pentru a nu distorsiona proporțiile, acesta a fost scos la normalizarea datelor în cazul primelor 8 criterii, pentru care a primit 100 de puncte.*

Funcția scor aplicată pentru prioritizarea proiectelor de tren metropolitan din România:

$$F_p = 20\% \cdot \text{pop/km} + 10\% \cdot \text{ca} + 10\% \cdot \text{ae} + 10\% \cdot \text{a} + 10\% \cdot \text{pu} + 10\% \cdot \text{aer} + 10\% \cdot \text{tu} + 10\% \cdot \text{timp} + 10\% \cdot \text{vit}$$

unde:

$$\text{pop/km} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{pop totală rută}}{\text{km}} \right)_i$$

ca = cifra de afaceri

ae = numărul total al agenților economici

a = numărul total de angajați

pu = potențialul universitar ($0,5 * \text{număr universități} + 0,5 * \text{număr studenți}$)

aer = potențialul de deservire aeroport (numărul total al pasagerilor din aeroporturile deservite)

tu = numărul total de înnoptări

timp = câștigul de timp în minute

vit = viteza comercială feroviară

În urma aplicării funcției scor, municipiul București a obținut cel mai mare punctaj, respectiv 04.9 puncte urmat de municipiul Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Constanța și Timișoara cu 50.6 puncte iar punctajul cel mai mic, de 7.9 punct a fost obținut pentru municipiul Tulcea (tabelul 2.2.28). Peste 50 de puncte au fost acordate primelor 6 municipii reședință de județ, ce cele mai mari beneficii la implementarea trenului metropolitan. Finanțarea investițiilor pentru implementarea trenului metropolitan se va face în funcție de punctajul obținut la prioritizare în ordinea „*primul venit, primul servit*”, în funcție de disponibilul financiar.

Tabelul 2.2.28. Prioritizarea trenurilor metropolitane

Nr.	Reședință de județ	Populație	Cifra afaceri	Agenți economici	Angajați	Potențial universitar	Pasageri aeroport	Înnoptări	Timp /congestie	Viteza comercială	Prioritizare (%)
1	București, Buftea	100	100	100	100	100	100	100	100	49	94.9
2	Cluj-Napoca	63	19	100	89	100	100	32	64	44	67.5
3	Iași	100	9	64	53	77	45	18	100	55	62.0
4	Brașov	87	16	68	76	31	18	65	66	50	56.5
5	Constanța	75	12	67	54	32	4	100	52	51	52.1
6	Timișoara	2	21	91	100	60	55	28	84	62	50.6
7	Arad	34	100	36	34	13	1	8	61	59	37.9
8	Craiova	47	11	44	44	32	18	6	60	48	35.8
9	Brăila	68	6	39	36	0	0	8	64	62	35.0
10	Galați	51	8	42	41	22	0	7	73	53	35.0
11	Oradea	31	9	52	47	24	3	21	61	53	33.4
12	Ploiești	44	11	45	49	8	0	6	60	48	31.4
13	Târgu Mureș	28	9	36	34	17	6	15	85	48	30.7
14	Pitești	33	13	40	49	13	0	6	61	50	29.9
15	Bacău	38	7	23	29	8	16	6	64	59	29.0
16	Sibiu	26	9	40	43	23	25	25	21	43	28.1
17	Baia Mare	22	4	30	26	0	1	8	90	60	26.4
18	Suceava	23	3	21	18	12	15	9	78	59	26.2
19	Satu Mare	23	4	16	19	0	3	2	79	56	22.5
20	Sfântu Gheorghe	23	6	28	28	0	0	25	31	53	21.7
21	Buzău	19	0	18	19	0	0	4	56	60	19.5
22	Focșani	15	2	15	12	0	0	1	61	64	18.6
23	Botoșani	14	2	14	9	0	0	3	50	72	17.9
24	Târgoviște	24	2	15	12	7	0	5	41	45	17.6
25	Piatra Neamț	23	2	13	9	0	0	5	49	48	17.2
26	Râmnicu Vâlcea	15	3	14	16	0	0	17	45	42	16.7
27	Alba Iulia	8	4	17	11	8	0	11	34	62	16.2
28	Călărași	7	1	5	2	0	0	4	65	64	15.4
29	Deva	13	2	11	10	0	0	2	46	57	15.3
30	Alexandria	4	29	9	5	0	0	0	44	55	15.0
31	Târgu Jiu	13	2	9	17	4	0	3	40	46	14.7
32	Slatina	8	4	7	12	0	0	2	55	51	14.7
33	Reșița	8	1	8	3	2	0	2	58	50	14.0
34	Vaslui	6	1	3	2	0	0	1	54	59	13.1

35	Slobozia	7	2	3	2	0	0	5	47	59	13.1
36	Giurgiu	2	1	6	0	0	0	0	63	51	12.7
37	Zalău	1	2	11	6	0	0	1	46	55	12.3
38	Drobeta-Turnu Severin	8	0	9	1	0	0	14	27	49	11.6
39	Bistrița	9	3	13	14	0	0	4	24	39	11.6
40	Miercurea Ciuc	0	1	4	2	0	0	5	47	51	10.9
41	Tulcea	3	1	0	0	0	0	5	0	68	7.9

Strategia de implementare a proiectelor de tren metropolitan din România

Impactul pandemiei COVID-19 asupra tuturor sectoarelor activităților umane, inclusiv a transporturilor, este imens. În același timp, anul 2021, declarat *Anul european al căilor ferate*, este dedicat explorării celor mai durabile, inovatoare și mai sigure moduri de transport. În conformitate cu provocările globale ale secolului al XXI-lea, avem contextul potrivit pentru dezvoltarea politicilor privind mobilitatea pe fondul *Pactului Verde European* și pentru contribuția eficientă la realizarea Strategiei UE privind mobilitatea adecvată și inteligentă.

Considerând faptul că *Inrix 2020 Global Traffic Scorecard* a confirmat faptul că Bucureștiul este cel mai aglomerat oraș la nivel global, trenul metropolitan poate aborda direct problema persistentă a congestionărilor de trafic, care nu s-a îmbunătățit în contextul pandemiei COVID-19. De asemenea, conform Clasamentului Mondial al Congestiei de Trafic, Bucureștiul este situat pe poziția a 3-a cu un scor pentru *indicele mediu de congestie al traficului* (TCI-42.51) și pe primul loc în lume cu TCI-135.81 *indicele maxim de congestie al traficului*. Congestia de trafic este o problemă semnificativă pentru alte orașe mari din România precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov etc., justificând o abordare națională privind implementarea conceptului de tren metropolitan.

Având în vedere congestia în creștere a traficului în orașele populate, cauzată în principal de mobilitatea individuală, trecerea la soluția feroviară pentru traficul de navetă este susținută de exemple europene în care implementarea trenului metropolitan a condus la o schimbare de paradigmă, cu accent pe serviciile moderne de transport de călători și conexiuni integrate: metrou, tramvai, autobuze, troleibuze și chiar transport individual.

Etape de implementare:

- 1. Introducerea conceptului de tren metropolitan în strategia de transport a României în vederea asigurării cadrului strategic necesar pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile;**
- 2. Crearea unei baze de date complexe care să asigure cadrul pentru aplicarea criteriilor, realizată în contextul realizării acestui Plan;**
- 3. Prioritizarea proiectelor de tren metropolitan pentru toate municipiile reședință de județ folosind o analiză multicriterială complexă, realizată în cadrul acestui Plan;**
- 4. Acordarea de sprijin beneficiarilor pentru implementarea conceptului de tren metropolitan în România;**

5. Implementarea proiectelor de tren metropolitan se va face în două etape după cum urmează:

- **Faza I:** Implementarea proiectelor pe rutele feroviare existente care prevăd lucrări de complexitate redusă cu timpi mici de implementare, nu modernizări semnificative ale liniei de cale ferată. Aici pot fi incluse reînnoiri CF, proiecte de tip Quick Wins, modernizare peroane existente și stații, asigurarea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă în zona stațiilor și în vehicule, accesul nediscriminatoriu ca punctele de interes economic, social și cultural, protejarea mediului, creșterea siguranței și securității călătorilor și locuitorilor din arealul feroviar, etc. Tot în această etapă va fi eligibilă achiziția de material rulant.
- **Faza a II-a:** Implementarea proiectelor cu intervenții semnificative (modernizare, electrificare, reparație capitală, reconstrucție linii desființate, construcția unor noi linii pentru deservirea echilibrată a întreg teritoriului vizat) + achiziție de material rulant.

Lucrările necesare introducerii trenului metropolitan vor trebui să respecte și cadrul normativ general privind calitatea în construcții.

Exemple de tren metropolitan:

1. Trenul Metropolitan București (S-București)

Nodul feroviar București este cel mai complex sistem feroviar din România, care asigură radial atât legătura dintre Gara de Nord și toate localitățile importante din aria metropolitană, dar și circular, legătura dintre acestea. Practic, având ca nod modal Gara de Nord, se pot realiza conexiuni rapide între București și zonele funcționale și rezidențiale ale acestuia, utilizând exclusiv infrastructură feroviară existentă (tabel 2.2.27).

Trenul metropolitan în aria metropolitană București va circula pe coridoarele reabilitate sau care urmează să fie reabilitate, dar și pe liniile secundare, precum și pe calea ferată de centură.

Principalele trasee vizate pentru introducerea trenului metropolitan sunt:

Linia metropolitană S1 București (cale ferată dublă electrificată): Grădinari (P&R) – Domnești – Chiajna (P&R) – Giulești – București Nord (P&R) – Pajura – Băneasa (P&R) – Pipera – Petricani (P&R) – Andronache – Voluntari (P&R) – Pantelimon – Brănești (P&R) (tabelul 2.2.29, figura 2.2.18);

Tabelul 2.2.29. Exemplu privind beneficiile în timp pentru legătura feroviară metropolitană spre Brănești, atât în trafic urban cât și în cel periurban
(sursa duratei rutiere de parcurs: Google Maps)

Nr. Crt.	Origine - Destinație	Timp de parcurgere fără trafic (min)	Timp maxim de parcurgere (ora 7:30) (min)	Timp maxim de parcurgere (ora 12:00) (min)	Timp maxim de parcurgere (ora 17:30) (min)
1	Brănești - Centru București (rutier)	30	100	65	90
2	Brănești - Gara de Nord (feroviar)	35			

3	Pantelimon - Centru București (rutier)	20	70	60	70
4	Pantelimon - Gara de Nord (feroviar)	25			
5	Voluntari - Centru București (rutier)	20	60	50	75
6	Voluntari - Gara de Nord (feroviar)	20			
7	Andronache - Centru București (rutier)	14	60	50	65
8	Andronache - Gara de Nord (feroviar)	20			
9	Pipera - Centru București (rutier)	22	65	55	75
10	Pipera - Gara de Nord (feroviar)	12			

Linia metropolitană S2 București (cale ferată neelectrificată): Moara Vlăsiei (P&R) /Snagov (P&R) – Dimieni – Balotești (P&R) – Mogoșoaia (P&R) – Giulești – Chiajna (P&R) – Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R) – Vidra – Grădiștea – Comana (P&R);

Linia metropolitană S3 București (cale ferată neelectrificată): Ghergani (P&R) – Tărtășești – Săbăreni – Chitila – Pajura – Băneasa (P&R) – Pipera – Petricani (P&R) – Andronache – Voluntari (P&R) – Pantelimon – Cernica – Tânganu (P&R) – Fundeni – Plătărești (P&R);

Linia metropolitană S4 București Henri Coandă Expres (cale ferată neelectrificată): București Nord (P&R) – Mogoșoaia (P&R) – Aeroport Henri Coandă (P&R);

Linia metropolitană S5 București (cale ferată dublă electrificată): București Nord (P&R) – Chitila – Buftea (P&R) – Periș (P&R);

Linia metropolitană S6 București (cale ferată electrificată): București Nord (P&R) – Pajura – Băneasa (P&R) – Pipera – Petricani (P&R) – Andronache – Voluntari (P&R) – Pantelimon Sud – București Obor (P&R).

Linia metropolitană S0 București Linia Circulară (cale ferată parțial electrificată): Chiajna (P&R) – Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R) – Berceni – Popești Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R) – Splai – Cățelu – Cernica Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R) – Voluntari – Ștefănești – Tunari – Otopeni Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R) – Mogoșoaia Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R) – Buciumeni – Chitila – Chiajna Militari (P&R) – Prelungirea Ghencea (P&R) – Bragadiru (P&R) – Măgurele (P&R) – Laser Măgurele – Jilava (P&R).

Având în vedere complexitatea sistemului feroviar București, în funcție de solicitări, se pot identifica și alte rute de transport metropolitan (ex: Aeroport Internațional Henri Coandă București AIHCB– Laser Măgurele sau Periș – București Obor).

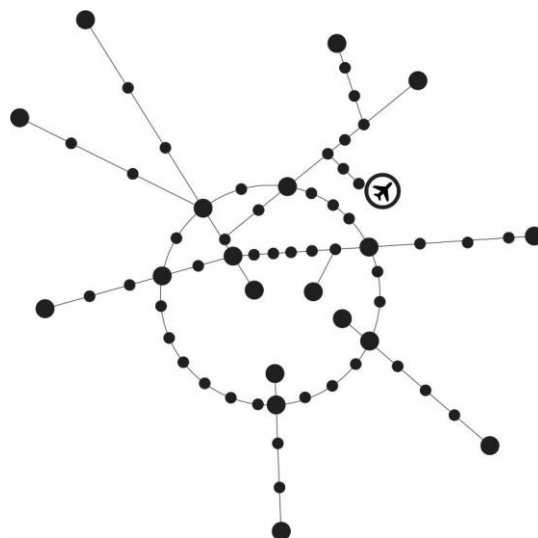


Figura 2.2.18. Schiță cu propunerea rețelei de tren metropolitan în aria municipiului București

Așadar trenul metropolitan București (S-București) se va implementa atât pe cele două coridoare modernizate (București – Constanța și București - Predeal), pe cele care urmează a se moderniza (București – Craiova și București – Giurgiu, București – Pitești), dar și pe rutele secundare (București – Urziceni, București – Oltenița), sau calea ferată de centură. Rețeaua trenurilor metropolitane din București se suprapune unor zone de aglomerări urbane, zone industriale, zone logistice sau de agrement care se pot conecta atât cu stațiile de cale ferată din București, cât și cu Aeroportul Internațional Henri Coandă (tabelul 2.2.27, figura 2.2.19). Trenul metropolitan poate juca rol și de tren urban în aria de interferență cu orașul, astfel stațiile Băneasa, Pipera, Petricani, Giulești, Andronache, Carpați, Domnești, Berceni, Obor vor putea să deservească zonele rezidențiale nou dezvoltate, scăzând astfel presiunea asupra transportului public urban sau chiar reducând numărul autovehiculelor private, cu consecințe benefice în ceea ce privește desconggestionarea traficului rutier și reducerea cantității de noxe.

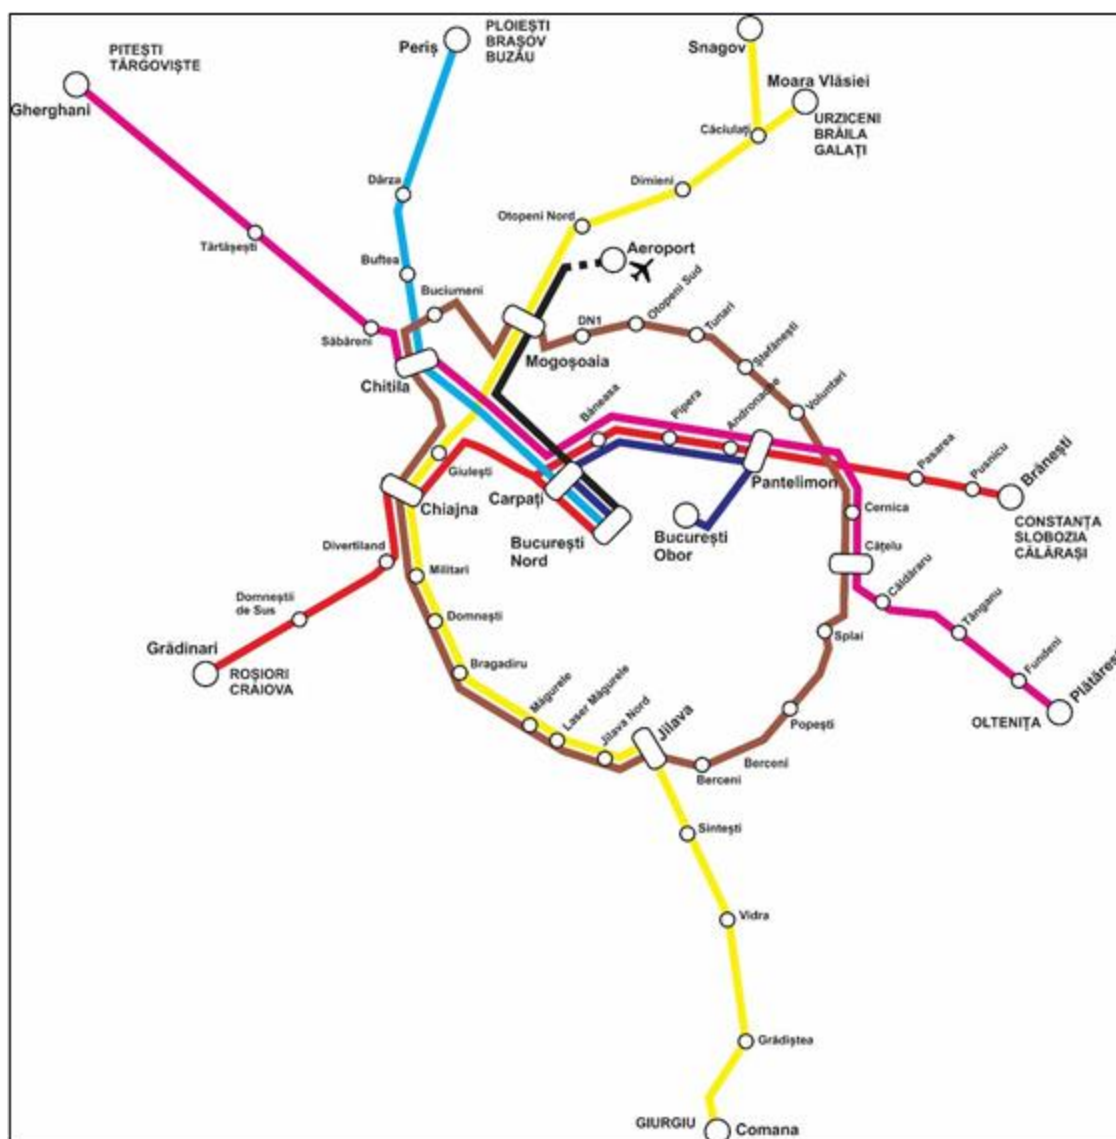


Figura 2.2.19. Nodul feroviar București și model de dezvoltare a liniilor de tren metropolitan

2. Trenul Metropolitan Cluj-Napoca (S-Cluj-Napoca)

Municipiul Cluj-Napoca și aria sa metropolitană se confruntă cu probleme majore de mobilitatea a populației și a mărfurilor, în special pe axa est-vest (între zonele rezidențiale noi și zonele logistice, industriale și de servicii aflate în plină expansiune) (tabel 2.2.27, figura 2.2.20). Implementarea soluției de tren metropolitan poate genera beneficii semnificative.

Schema rețelei trenului metropolitan este în forma de 'Y', cu un sector central comun (Amera (P&R)– Cluj-Napoca (P&R) – Aeroport (P&R) – Apahida (P&R)) și cu un racord de vest (Nădășelu(P&R) – Baciul – Amera(P&R)) și două racorduri de est (Apahida (P&R) – Jucu (P&R) – Bontida (P&R) respectiv Apahida (P&R) – Cojocna (P&R) – Câmpia Turzii (P&R)).

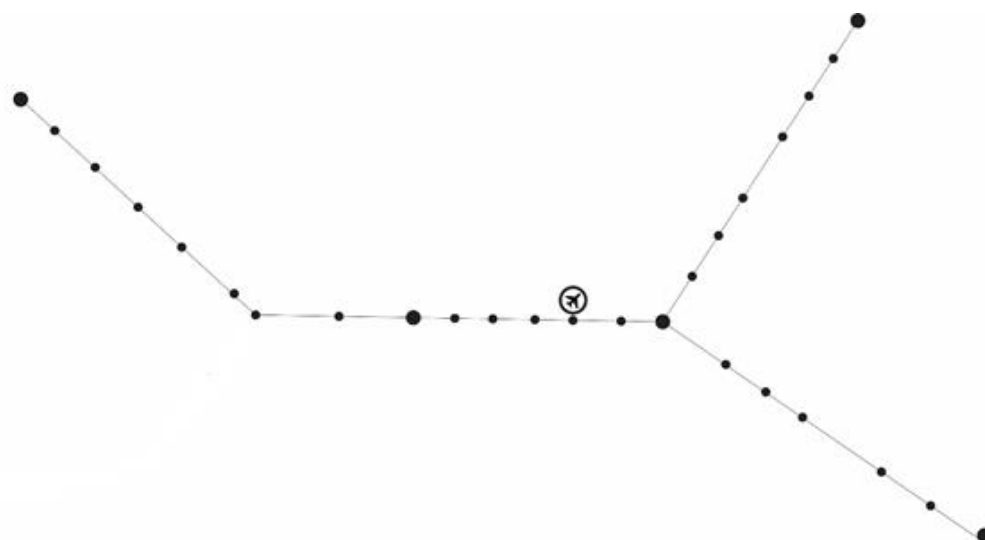


Figura 2.2.20. Schiță cu propunerea rețelei de tren metropolitan în aria municipiului Cluj Napoca

Astfel, propunerea pentru trenul metropolitan Cluj-Napoca este de a folosi magistrala 300 și ruta 401 de cale ferată pe direcția Nădășelu – Baci – Cluj-Napoca – Aeroport Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida cu un racord dinspre Apahida spre Cojocna – Câmpia Turzii. Aceste două aliniamente vor crește mobilitatea populației din ariile rezidențiale spre zonele logistice, de agrement sau spre aeroport (Tetarom, Jucu, Cojocna, Bonțida). O particularitate a propunerii pentru trenul metropolitan o reprezintă racordul spre Gilău, din zona Amera, care va putea conecta una dintre zonele cu densități foarte mari (localitatea Florești) dar și zonele comerciale din partea de vest a municipiului Cluj-Napoca (Figura 2.2.21). Pe de altă parte, printr-un sistem de tip *"park and ride"* în zona Gilău/Florești se poate asigura o conexiune multimodală (rutier – feroviar) atât dinspre autostrada A3 (Turda – Zalău), cât și dinspre DN1 (Oradea – Huedin). De remarcat însă faptul că cei aproximativ 15 km dintre ramificația Amera și Gilău reprezintă o legătură feroviară care trebuie construită, cu mai multe sectoare de constrângeri fizico-geografice sau socio-economice (dealul Hoia, Muzeul Apei Leonida Truță, zone cu presiune antropică ridicată).

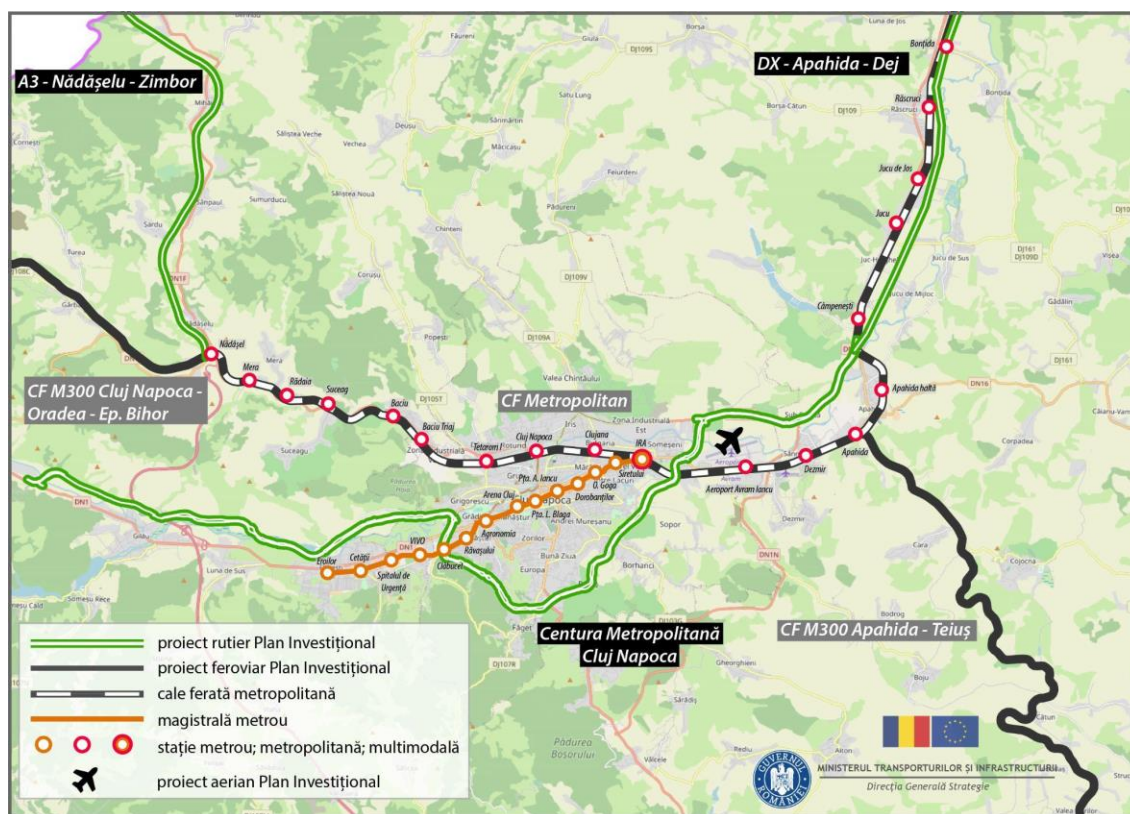


Figura 2.2.21. Model de dezvoltare a liniilor de tren metropolitan S - Cluj-Napoca

În proiectul pilot propus pentru trenul metropolitan S - Cluj-Napoca se evidențiază necesitatea construirii unor puncte de oprire în linie curentă pentru o mai bună conexiune cu rețeaua rutieră sau cu ariile de aglomerare urbană. Astfel, pe lângă stațiile de cale ferată existente sunt propuse noi puncte oprire în zonele Midarom, Penny Apahida, Aeroport Avram Iancu, Someșeni, Tetarom și Amara. Vitezele de circulație sunt cele ale liniei actuale (între 80 și 120 km/h) suficiente pentru un serviciu de transport urban și metropolitan, caracterizat prin opriri dese în stații aflate la distanțe scurte.

Implementarea serviciului de tren metropolitan se poate face etapizat astfel:

Etapă I: Nădășelu(P&R) – Baci – Amara (P&R) – Cluj-Napoca (P&R) – Aeroport (P&R) – Apahida (P&R) – Jucu (P&R) – Bonțida (P&R) – reprezintă o componentă a Contractului semnat și în curs de derulare pentru faza de elaborare a SF și a Documentației de atribuire pentru introducerea trenului metropolitan;

Etapă a II-a: Racordul Apahida (P&R) – Cojocna (P&R) – Câmpia Turzii (P&R), ce face obiectul unui Studiu de perspectivă privind extinderea serviciului de tren metropolitan implementat în faza I.

Tabelul 2.2.30. Propunere de puncte de oprire pentru trenul metropolitan S - Cluj-Napoca

Km. Cumulați	Km Gilau	Km Baci	Oprire	Tip stație	Nr. linii	Statut	Cale ferată	Viteza km/h
0			Bonțida	stație	2+1	existentă	CF existentă	100
2.8			Răscruci	punct oprire	2	existentă		
5.6			Jucu - Tetarom	punct oprire	2	existentă		
7.2			Jucu - Herghelie	stație	2	existentă		
8.5			Midarom	punct oprire	2	nouă		
14.4			Apahida h	punct oprire	2	existentă		
14.9			Apahida Penny	punct oprire	2	nouă		
16.1			Apahida	stație	8	existentă		
18.1			Dezmir	punct oprire	2	existentă		
20			Aeroport Avram Iancu	punct oprire	2+1	nouă	CF nouă	120
21.8			Cluj-Napoca Est	stație	13	existentă		
24.2			Someșeni	punct oprire	2	nouă		
26.4			Clujana	punct oprire	2	existentă		
28.4	0.0	0.0	Cluj-Napoca Central	stație	10	existentă		
30.4	2.0	2.0	Tetarom	punct oprire	2	nouă		
31.7	1.3	1.3	Amera	punct oprire	2	nouă		
		1.5	Baciu triaj	stație	4	existentă		
33.7	2.0		Miraslău Vest	punct oprire	2	nouă	CF nouă	140
			Vivo	legătura bandă	n/a	nouă		
36.4	2.7		Florești Est	punct oprire	2	nouă		
38.1	1.7		Florești Nord	punct oprire	2+1	nouă		
39.3	1.2		Florești Aqua Park	stație	2	nouă		
41.2	1.9		Luna de Sus	punct oprire	2	nouă		
44.4	3.2		Autostrada Transilvania	punct oprire	2	nouă		
46.7	2.3		Gilău	stație	3	nouă		
46.7	18.3							

3. Trenul Metropolitan Brașov (S-Brașov)

Nodul feroviar Brașov constituie un avantaj pentru introducerea și dezvoltarea trenului metropolitan, care poate să deservească importante arii rezidențiale și economice (tabel 2.2.27). Pe de altă parte, trenul metropolitan se poate constitui într-un veritabil vector de transport pentru activitățile turistice din zonă (figura 2.2.22).

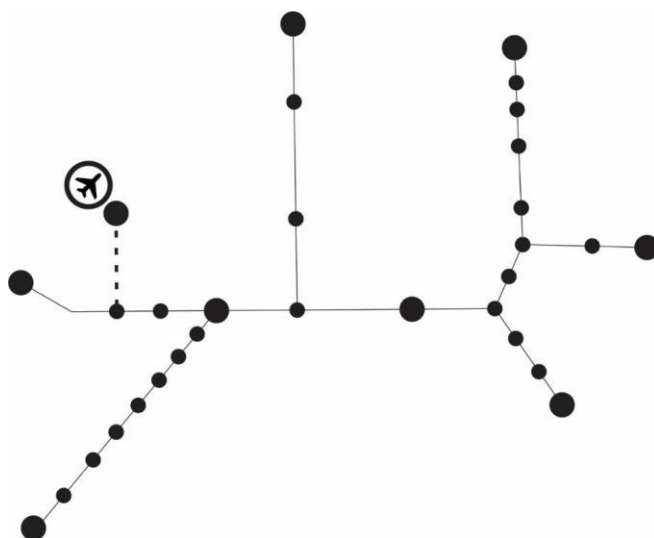


Figura 2.2.22. Schiță cu propunerea rețelei de tren metropolitan în aria municipiului Brașov

Rutele propuse pentru trenul metropolitan S-Brașov sunt următoarele:

Linia metropolitană S1 Brașov: (Predeal (P&R)) Dârste (P&R) – Minerva Business Park (P&R) – Calea Florilor – Brașov (P&R) – Independenței – Bartolomeu (P&R) – Cristian – Râșnov (P&R) - (Zărnești) (22 km) (tabelul 2.2.31);

Tabelul 2.2.31. Exemplu linia S1

Nr. Crt.	Tren metropolitan S1	Servicii	Viteza actuală (km/h)	Distanța (km)	Distanța cumulată (km)	Durata			
						S1 local		S1 Expres	
1	Dârste	CF dublă electrificată	100	0.0			0		0.00
2	Minerva Business Park			2.3	2.3	0.03	0.04		
3	Zizin			1.3	3.6	0.06	0.07		
4	Florilor			1.7	5.3	0.09	0.10		
5	Nod Brașov			0.9	6.2	0.12	0.15		
6	Nod Independenței	CF simplă neelectrificată	80	1.5	7.7	0.17	0.18	0.08	0.10
7	Nod Bartolomeu			1.6	9.3	0.20	0.22		
8	Brașovia			0.7	10.0	0.23	0.24	0.15	0.16
9	Cristian Nord			6.0	16.0	0.30	0.31		
10	Cristian Nord			2.6	18.6	0.34	0.35		
11	Râșnov			3.4	22.0	0.39		0.29	
Lungime totală				22					

Linia metropolitană S2 Brașov: (Întorsura Buzăului (P&R)) – Budila (P&R) – Hărman – Brașov (P&R) – Bartolomeu (P&R) – Ghimbav – Codlea (P&R) (31.6 km) (tabelul 2.2.32);

Tabelul 2.2.32. Exemplu linia S2

Nr. Crt.	Tren metropolitan S1	Servicii	Viteza actuală (km/h)	Distanța (km)	Distanța cumulată (km)	Durata			
						S1 local		S1 Expres	
1	Budila	CF simplă neelectrificată	100	0.0			0.00		0.00
2	Târlungeni Nord			3.3	3.3	0.04	0.05		
3	Hărman			7.2	10.5	0.12	0.13		
4	Centura Est	CF simplă electrificată	70	2.4	12.9	0.16	0.17		
5	Triaj			1.9	14.8	0.19	0.20		
6	Florilor			2.1	16.9	0.22	0.23		
7	Nod Brașov	CF simplă neelectrificată	80	0.9	17.8	0.24	0.27	0.18	0.20
8	Nod Independenței			1.5	19.3	0.29	0.30		
9	Nod Bartolomeu			1.6	20.9	0.32	0.34	0.25	0.27
10	Centura Vest			3.4	24.3	0.37	0.38		
11	Ghimbav			2.0	26.3	0.40	0.41		
12	Codlea			5.3	31.6	0.46			
Lungime totală				31.6					

Linia metropolitană S3 Brașov: Brașov (P&R) – Bartolomeu (P&R) – Ghimbav – Aeroport Brașov (P&R) (12.4 km) (tabelul 2.2.33);

Tabelul 2.2.33. Exemplu linia S3

Nr. Crt.	Tren metropolitan S1	Servicii	Viteza actuală (km/h)	Distanța (km)	Distanța cumulată (km)	Durata			
						S1 local		S1 Expres	
1	Nod Brașov	CF simplă neelectrificată	80	0.0					0.00
2	Nod Independenței			1.5	1.5	0.02	0.02		
3	Nod Bartolomeu			1.6	3.1	0.05	0.05	0.05	0.06
4	Centura Vest			3.4	6.5	0.10	0.10		
5	Ghimbav			2.0	8.5	0.13	0.13		
6	Aeroport Brașov	CF nouă	100	3.9	12.4	0.18	0.18	0.14	
Lungime totală				12.4					

Linia metropolitană S4 Brașov: (Sf. Gheorghe (P&R) - Ozun – Hărman) Brașov (P&R) – Stupini – Bod (P&R) - Feldioara (P&R)) (12 km) (tabelul 2.2.34);

Tabelul 2.2.34. Exemplu linia S4

Nr. Crt.	Tren metropolitan S1	Servicii	Viteza actuală (km/h)	Distanța (km)	Distanța cumulată (km)	Durata			
						S1 local		S1 Expres	
1	Nod Brașov	CF dublă electrificată	100	0.0			0.00		0.00
2	Nod Independenței			1.5	1.5	0.02	0.03		
3	Centura Nord			3.1	4.6	0.06	0.07		
4	Stupini			0.8	5.4	0.08	0.09		
5	Bod			6.6	12.0	0.14		0.10	
Lungime totală				12					

Trenul metropolitan S-Brașov prezintă un potențial de mobilitate major pentru populație, atât în zona administrativă a municipiului, cât și în zona periurbană: Râșnov - Zărnești, Codlea, Bod - Feldioara, Predeal, Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe (figura 2.2.23).

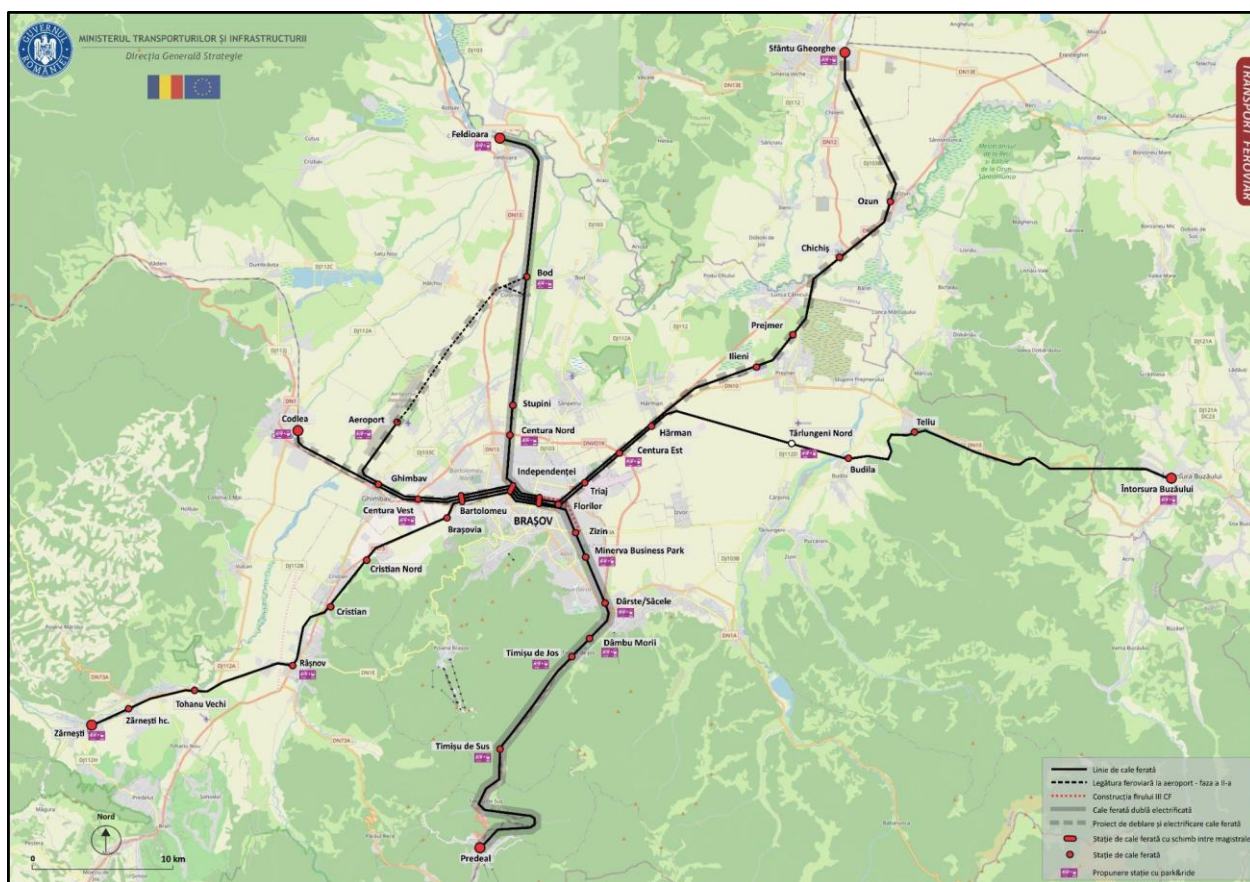


Figura 2.2.23. Model de dezvoltare a liniilor de tren metropolitan S-Brașov

4. Trenul Metropolitan Sibiu (S-Sibiu)

Trenul metropolitan S-Sibiu se poate dezvolta atât pe liniile existente (în special în lungul magistralei feroviare 200) cât și pe linii aflate în conservare dar care pot fi reactivate treptat, pe măsură ce se identifică o creștere a cererii de transport (tabel 2.2.27).

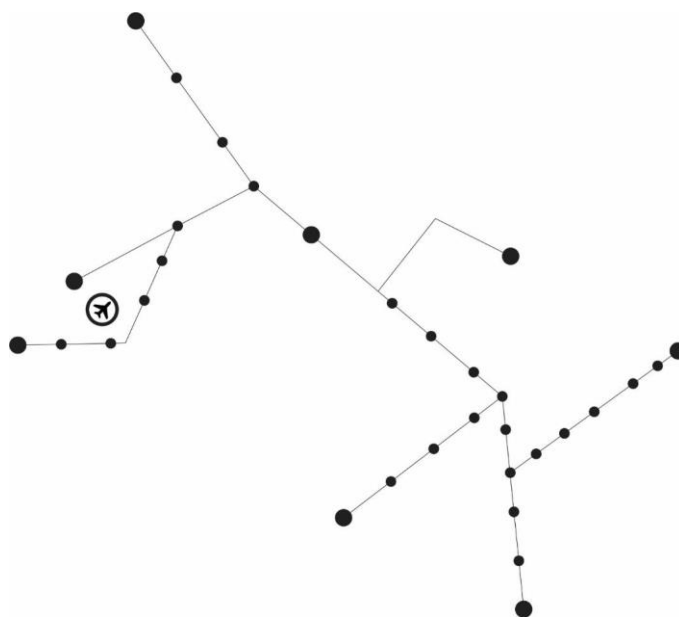


Figura 2.2.24. Schiță cu propunerea rețelei de tren metropolitan în aria municipiului Sibiu

Rutele de transport feroviar metropolitan propuse pentru municipiul Sibiu sunt următoarele (figura 2.2.24, 2.2.25):

Linia metropolitană S1 Sibiu: Avrig (P&R) - Tălmăciu (P&R) – Veștem – Șelimbăr – Vasile Aron/Broscărie – Sibiu Gara Centrală (P&R) – Turnișor – Cristian (P&R) – Orlat – Săcel – Săliște (P&R) (Sebeș (P&R));

Linia metropolitană S2 Sibiu: Cisnădie (P&R) - Șelimbăr – Vasile Aron/Broscărie – Sibiu Gara Centrală (P&R) – Băile Ocna Sibiului - Loamneș - Copșa Mică (P&R);

Linia metropolitană S3 Sibiu: Agnita (P&R) - Cornățel (P&R) – Mohu – Șelimbăr – Vasile Aron/Broscărie – Sibiu Gara Centrală (P&R);

Linia metropolitană S4 Sibiu: Zona industrială Gușterița (P&R) – Fabrica de cărămidă Wienerberger – Vasile Aron/Broscărie – Sibiu Gara Centrală (P&R) – Aeroport Sibiu (P&R) – Zona industrială Vest (P&R).

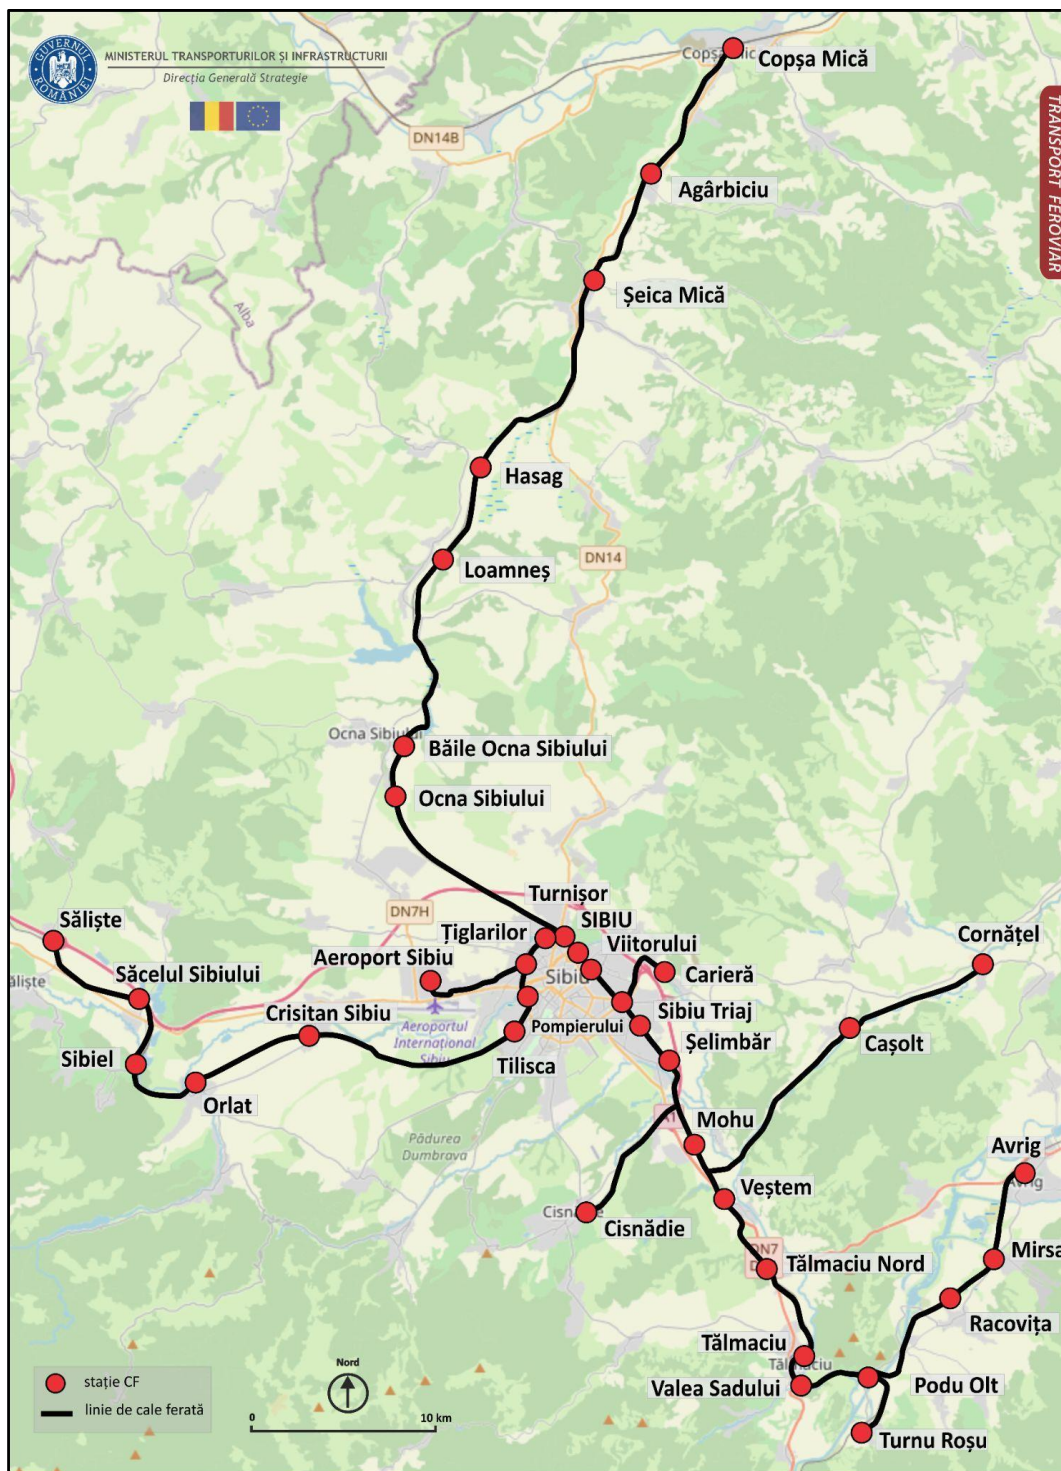


Figura 2.2.25. Model de dezvoltare a liniilor de tren metropolitan S-Sibiu

5. Trenul Metropolitan Timișoara (S-Timișoara)

Nodul feroviar Timișoara, unul dintre cele mai complexe din țară, poate asigura mobilitatea populației pe toate direcțiile în raport cu municipiul reședință de județ (tabel 2.2.26). Cele mai importante axe de transport pentru pasageri sunt în lungul magistralei feroviare 900 (spre Lugoj – Caransebeș) dar și în lungul rutei 310 spre Arad (figura 2.2.25). Deloc de neglijat sunt și rutele nemodernizate spre Buziaș, Stamora Moravița, Lovrin, Giarmata-Radna sau Jimbolia care traversează arii periurbane importante din punct de vedere al investițiilor recente în industrie, servicii, agricultură sau al dezvoltărilor imobiliare (tabel 2.2.27).

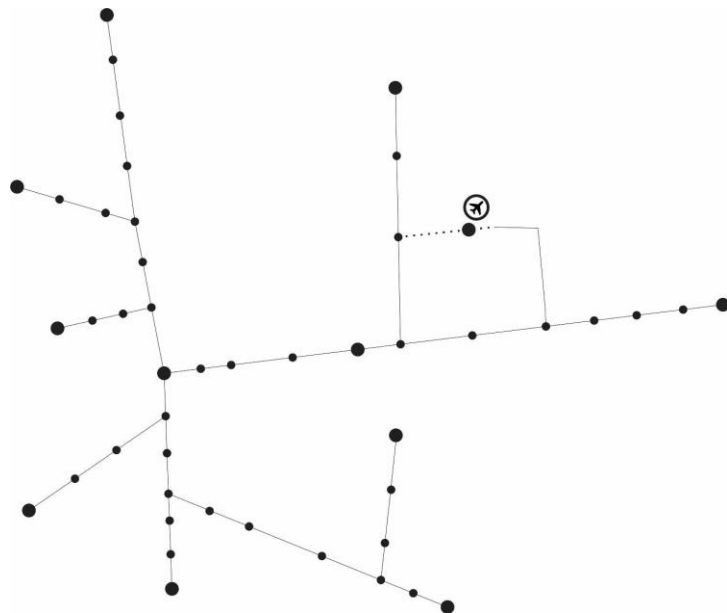


Figura 2.2.26. Schiță cu propunerea rețelei de tren metropolitan în aria municipiului Timișoara

Rutele de transport feroviar metropolitan propuse pentru municipiul Timișoara sunt următoarele:

Linia metropolitană S1 Timișoara: Lugoj (P&R) - Receaș (P&R) – Remetea Mare – Timișoara Est – Timișoara Nord (P&R) – Jimbolia (P&R);

Linia metropolitană S2 Timișoara: Radna (P&R) - Giarmata (P&R) / Aeroportul Traian Vuia Timișoara (P&R) – Timișoara Est – Timișoara Nord (P&R) – Timișoara Sud (P&R) – Jebel (P&R) (Deta (P&R) – Stamora Moravița (P&R).

Linia metropolitană S3 Timișoara: Lugoj (P&R) - Buziaș (P&R) – Giroc (P&R)– Timișoara Nord (P&R) – Sânandrei – Băile Călacea (P&R) – Orțișoara - Arad (P&R).

6. Trenul Metropolitan Iași (S-Iași)

Nodul feroviar Iași asigură legătura spre cinci direcții importante la nivel regional: spre Vaslui (magistrala 600), spre Ungheni, spre Tg. Frumos – Pașcani, spre Hârlău și spre Dorohoi (tabel 2.2.27). Expansiunea socio-economică a municipiului Iași s-a făcut atât pe axa vest-est, cât și pe axa nord – sud, ceea ce creează premisele unei valorificări a căilor ferate existente prin introducerea trenului metropolitan pe următoarele rute (figura 2.2.27):

Linia metropolitană S1 Iași: Bârnova (P&R) – Piciorul Lupului – Ciurea (P&R) – Poitiers – Zona comercială Nicolina – Nicolina (P&R) – Iași (P&R) – Canta – Păcurari – Antibiotice (P&R) – Lețcani (P&R) – Movileni – Larga Jijia (P&R).

Linia metropolitană S2 Iași: Cristești (P&R) – Holboca – Socola (P&R) – Nicolina (P&R) – Iași (P&R) – Canta – Păcurari – Antibiotice (P&R) – Lețcani (P&R) – Podul Iloaiei (P&R) (Tg. Frumos (P&R) – Pașcani).

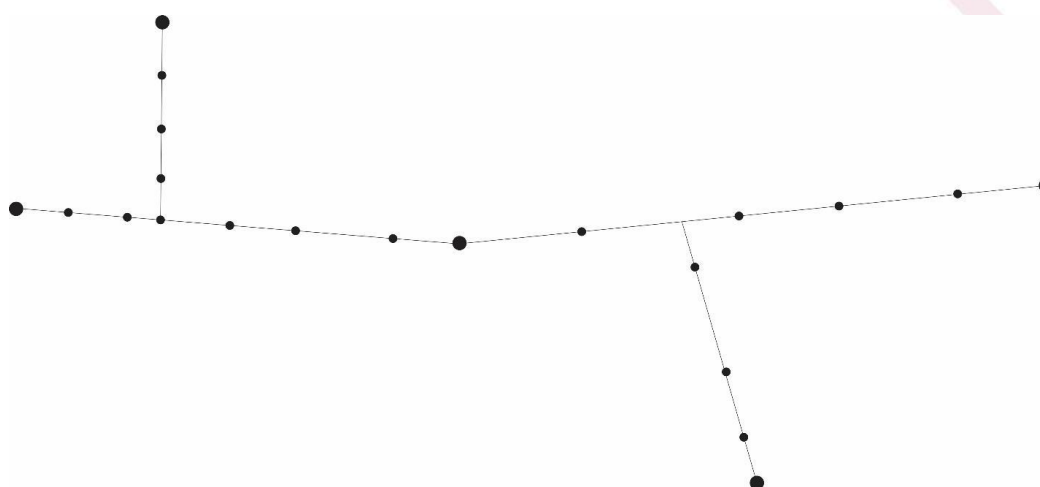


Figura 2.2.27. Schită cu propunerea rețelei de tren metropolitan în aria municipiului Iași

Cele 6 modele sunt prezentate cu titlu de exemplu, soluțiile finale privind caracteristicile proiectelor de tren metropolitan care vor implementa urmând a se stabili la nivel de studii de fezabilitate.

Concluzii

Promovarea transportului public ca alternativă rentabilă și durabilă la transportul individual sau motorizat este o abordare cu perspective multiple: sprijinirea mobilității oamenilor, reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră și a nivelului de emisii poluante, descongestionarea rețelei rutiere etc.

Prin realizarea obiectivului de investiții în vederea introducerii și, ulterior, dezvoltării serviciilor de tren metropolitan se urmărește:

- crearea unei alternative reale la transportul motorizat individual pe teritoriul zonelor urbane funcționale ale municipiilor;
- reducerea timpilor de călătorie necesari navetei;

- asigurarea unei legături de transport neutră din punct de vedere climatic între localitățile de pe teritoriul zonelor urbane funcționale ale municipiilor;
- implementarea unor proiecte de regenerare urbană în zona de siguranță a căii ferate;
- crearea unor legături de transport mai puțin poluante cu polii majori economici, educaționali, de cercetare și cu zonele turistice
- asigurarea accesibilității și dezvoltarea multimodalității cu transportul public local;
- creșterea productivității infrastructurii feroviare și a structurilor industriale feroviare de pe teritoriul zonelor urbane funcționale ale municipiilor;
- crearea de noi oportunități pe piața forței de muncă, inclusiv prin reducerea discriminării de gen sau culturale.

Transportul feroviar emite mult mai puțin CO₂ decât o călătorie echivalentă rutieră sau aeriană, fiind în același timp singurul mod de transport care și-a redus în mod constant emisiile de gaze cu efect de seră din 1990 până în prezent. Opțiunea de a promova transportul feroviar va genera beneficii considerabile în toate domeniile.

Pentru a îndeplini recomandările specifice fiecărei țări din *Semestrul European*, este necesar să se pună în aplicare inițiative menite să faciliteze tranziția verde, cu potențial de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Astfel, implementarea trenului metropolitan în România devine o necesitate și o modalitate inteligentă de reducere a decalajului dintre mobilitatea populației și desconggestionarea traficului.

■ **CĂI FERATE CU POTENȚIAL TURISTIC**

Conform MPGT au fost identificate un număr de linii care ar putea îndeplini o funcție de turism, dar care nu apar pe rețelele propuse. Spre exemplu Oravița – Anina, Caransebeș - Hațeg, Sibiu – Agnita, Turda – Abrud, Luduș - Măgheruș și Târgu Mureș - Sovata Băi. Aceste rute ar putea fi păstrate ca rute complementare, în administrarea autorităților locale, în funcție de rezultatele unei evaluări mai detaliate cu privire la potențialul turistic al acestora.

Căile ferate cu importanță turistică sunt localizate în spațiul montan sau deluros al României și reprezintă o cale de acces a fluxurilor de turiști ce vizitează Transilvania. Reabilitarea sau repunerea în circulației a unor sectoare de cale ferată, adevărate valori de patrimoniu de tip ‘mocăniță’ sau tren cu ‘cremalieră’ se va face exclusiv din alte surse bugetare decât alocările cuprinse în acest Plan Investițional (probabil tip PPP sau alte tipuri).

■ **ACHIZIȚIA DE MATERIAL RULANT**

Obiectivul de investiții vizează creșterea coeziunii sociale și teritoriale prin îmbunătățirea transportului feroviar de pasageri în România. Pentru a realiza acest obiectiv a fost considerată necesară crearea unui parc de material rulant nou achiziționat de către Autoritatea pentru

Reformă Feroviară (ARF) și introdus în serviciu prin Contracte de Serviciu Public atribuite în mod competitiv.

Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul de pasageri va avea un impact semnificativ asupra nivelului serviciilor și asupra costurilor și beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători. Caracteristicile tehnice și confortul pasagerilor în cadrul materialului rulant existent nu satisfac așteptările pasagerilor. Cele mai multe dintre vagoane sunt vechi, iar unele sunt aproape de sfârșitul vieții lor economice.

Parcul învechit al vagoanelor și locomotivelor, defecțiunile frecvente apărute atât la calea ferată, cât și la parcul de material rulant și întârzierile reduc nivelul de întreținere și fiabilitatea căilor ferate. Menținerea disponibilității și fiabilității materialului rulant existent la un nivel acceptabil va necesita un nivel de cost ridicat asociat întreținerii și operațiunilor de mentenanță.

Conform studiului de fezabilitate realizat de consultant pentru ARF, reiese un necesar de 110 unități, din care:

- rame cu tracțiune electrice de lung parcurs – EMU (rang InterRegio / Intercity) – 37 unități;
- rame cu tracțiune diesel de lung parcurs – DMU (rang InterRegio / Intercity) – 11 unități;
- rame cu tracțiune electrice de scurt parcurs – EMU (rang Regio / tren metropolitan) – 62 unități.

Tabelul 2.2.35. Necesarul de unități conform studiului de fezabilitate

Nr. Crt.	Codul de serviciu	RE/DMU	RE necesare	Unități de rezervă	Total general
1	IR / IC	RE	33	4	37
2	IR / IC	DMU	10	1	11
3	R	RE	56	6	62

Necesarul de finanțare pentru achiziția de material rulant este de aproximativ 1 mld. EUR, din care pentru scenariul de referință este alocată o sumă de aproximativ 250 mil. EUR. Pentru proiectul nou de înnoire a parcului de material rulant este estimată o alocare de aproximativ 750 mil. EUR.

Tabelul 2.2.36. Costuri achiziție material rulant – scenariul de referință și proiect nou

Nr.Crt.	Proiect Autoritate pentru Reformă Feroviară	Cost estimat (mil.EUR)
Scenariu de referință		
1	Achiziție material rulant	250
Proiect nou		
1	Achiziție material rulant	750

Pentru a maximiza eficiența investiției, tot materialul rulant nou achiziționat va fi utilizat pe rețeaua TEN-T, cu prioritate pe liniile modernizate. În cadrul planului investitional, tot materialul rulant achiziționat (37 IR + 62 R) sau modernizat include zero emisii și va respecta prevederile legale în domeniul ajutorului de stat și al achizițiilor publice.

În ce privește investițiile în material rulant, creșterea capacității feroviare vizează:

- reînnoirea vagoanelor de dormit, cușetă, restaurant, bistro și clasă (pentru trenuri de tip Intercity, InterRegio și Regio);
- automotoare EMU și H-EMU (inclusiv stații de alimentare cu hidrogen pentru trenurile de tip H-EMU) cu capacitate între 150 și 500 locuri. Toate acestea vor fi prevăzute cu sistem ERTMS;
- modernizarea locomotivelor electrice, capabile de a dezvolta viteza de 160 km/oră și de a tracta trenuri de călători de până la 16 vagoane.

Tot materialul rulant este dedicat pasagerilor, nu transportului de marfă.

Pe lângă investițiile care privesc modernizarea și achiziția de material rulant propuse prin studiul realizat de ARF, prin PNRR România și-a asumat achiziționarea de material rulant sustenabil și modernizarea materialului rulant existent. Materialul rulant, cu zero emisii și dotat cu instalație ERTMS on-board va fi utilizat pentru transportul de pasageri pe coridoarele TEN-T modernizate sau în curs de modernizare, pentru valorificarea superioară a potențialului de transport și pentru creșterea schimbării modale dintre rutier și feroviar. Materialul rulant va fi de tip EMU, H-EMU, B-EMU, locomotive și vagoane pentru transportul pasagerilor pe distanțe lungi (IC/IR).

Prin PNRR vor fi finanțate următoarele acțiuni:

- 12 trenuri de tip H-EMU (hidrogen, 3+1 unități) achiziționate și stații de alimentare cu hidrogen aferente acestora;
- 20 trenuri electrice (EMU) - Rama electrică tip RE-IR (tren cu 6 unități cu peste 300 locuri fiecare) achiziționate;
- 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS/ETCS, capabile să atingă viteza de 160 km /h și să tracteze până la 16 vagoane de călători;
- 55 de locomotive electrice modernizate, capabile să atingă viteza de 160 km /h și să tracteze până la 16 vagoane de călători;
- 139 de vagoane modernizate (30 de vagoane de dormit, tip cușetă, vagoane de restaurant și bistro și 109 vagoane de clasă pentru trenurile InterCity, InterRegio și Regio);
- Conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră pentru trenuri călători în locomotive electrice cu acumulatori plug-in.

Măsuri privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH

În scopul punerii în practică a obiectivelor politicii europene privind neutralitatea climatică cuprinse în *Pactul Ecologic European*, respectiv în cadrul *Strategiei UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă*, precum și a acțiunilor propuse în cadrul pachetului *Fit for 55* este necesar stabilirea unor măsuri la nivel național.

Inițiativele privind neutralitatea climatică în domeniul infrastructurii feroviare vor fi reprezentate de către achiziția de material rulant sustenabil (electric/hidrogen), modernizarea materialului

rolant existent cu echipamente electrice de tracțiune cu consum redus de energie (retrofitting) precum și de electrificarea unor sectoare de pe rețeaua TEN-T.

În acest sens, fiecare proiect de infrastructură feroviară, achiziție/modernizare de material rulant va include la nivel de documentație tehnico-economică o analiză privind respectarea principiului DNSH, ca o condiție pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene.

CONFIDENTIAL

2.3. MODURI DE TRANSPORT: METROUL

Planul Investițional propune dezvoltarea a unor noi magistrale de metrou în București și Cluj-Napoca precum și extensii pentru magistralele existente.

Rețeaua de metrou din București

Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. este o societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat care desfășoară activități de interes public, strategic și se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (figura 2.3.1 și 2.3.2).

În prezent, Metrorex gestionează 5 magistrale de metrou (M1-M5) cu o lungime totală de aproximativ 78 km. În total, se identifică 63 de stații pe liniile curente (tabelul 2.3.1).

Tabelul 2.3.1. Rețeaua de metrou din București în operare

Nr.	Magistrala	Traseu	km	Stații	Punere în funcțiune
1	M1 - Pantelimon - Gara de Nord - Dristor 2	Petrache Poenaru - Timpuri Noi	8.63	6	1979
2		Timpuri Noi - Republica	10.1	6	1981
3		Petrache Poenaru - Crângași	0.97	1	1984
4		Crângași - Gara de Nord	2.83	2	1987
5		Gara de Nord - Dristor 2	7.8	6	1989
6		Republica - Pantelimon	0.68	1	1990
Subtotal			31.01	22	7 stații comune cu M3
7	M2 - Berceni - Pipera	Berceni - Piața Unirii 2	9.96	8	1986
8		Piața Unirii 2 - Pipera	8.72	6	1987
Subtotal			18.68	14	
9	M3 - Anghel Saligny - Eroilor - Preciziei	Eroilor - Precizeii	8.83	5	1983, 1996, 1999
10		N. Grigorescu 2 - Anghel Saligny	4.7	4	2008
11		N. Grigorescu - Eroilor*	8.67	7	1981, 1989
Subtotal			22.2	16	7 stații comune cu M1
12	M4 - Gara de Nord - Lac Străulești	Gara de Nord - 1 Mai	3.24	4	2000
13		1 Mai - Parc Bazilescu	2.3	2	2011
14		Parc Bazilescu - Străulești	1.9	2	2017
Subtotal			7.44	8	
15	M5 - Râul Doamnei - Eroilor	Râul Doamnei – Eroilor	6.9	9	2020
		Romancierilor – Valea Ialomiței		1	
Subtotal			6.9	10	
Total			77.6	63	

* trunchi comun între M1 și M3

Din punct de vedere al materialului rulant (ecartament 1432 mm), acesta este de trei tipuri: IVA (Astra-Arad), BM2 și BM21 (Bombardier) și BM3 (CAF). În anul 2018, erau în operare un total de 300 de rame (tabelul 2.3.2).

Tabe-lul 2.3.2. Materialul rulant Metrorrex - 2018

2018	Parc inventar	Exploatare	Circulație
Vagon IVA	186	30	24
BM2, 21	264	198	186
BM3	144	96	90
TOTAL	594	324	300

În anul 2018, au fost transportați un număr de aprox. 180 milioane de călători, dintre care aproximativ 80% pe magistralele M1 și M2 (sursă: Raport de activitate Metrorrex, 2018) (tabelul 2.3.3).

Tabelul 2.3.3. Evoluția nr. de călători în perioada 2015-2018

Călătorii (mii)	2015	2016	2017	2018	
	174 830	179 120	178 850	179 703	
Călătorii (mii)/An	M1	M2	M3	M4	TOTAL
2015	76 640	67 291	24 720	6 179	174 830
2016	77 291	69 041	26 507	6 281	179 120
2017	77 235	68 666	26 762	6 187	178 850
2018	76 811	69 501	27 423	5 968	179 703
procent 2018	42.7	38.7	15.3	3.3	100

Dezvoltarea rețelei actuale de metrou din București se realizează pe două paliere:

- dezvoltarea noilor magistrale
- extinderea magistralelor existente.

Dezvoltarea noilor magistrale de metrou (tabelul 2.3.4):

- **Magistrala 4** – tronsonul *Gara de Nord – Gara Progresu* va conecta două dintre cele mai importante stații de cale ferată din București (Gara de Nord și Gara Progresu) cu aeroporturile internaționale Otopeni și Băneasa și va avea corespondență cu toate magistralele de metrou în funcțiune și de perspectivă. Lungimea estimată este de 10.6 km și un număr de 14 stații și 1 depou;
- **Magistrala 5** – tronsoanele *Eroilor – Universitate* și *Universitate – Pantelimon* vor asigura legătura cartierului Pantelimon cu centrul orașului și zona de sud-vest, cartierul Drumul Taberei. Lungimea estimată este de 11.5 km și un număr de 12 stații;
- **Magistrala 6** – tronsonul *Gara de Nord – 1 Mai – Aeroport Otopeni* va asigura legătura Aeroportului Otopeni și a zonei de nord a ariei metropolitane la rețeaua de metrou din București și la rețeaua feroviară din România prin Gara de Nord. Prin extinderea magistralei

4 Gara de Nord – Gara Progresu, se va realiza o legătură importantă nord – sud care va lega cele două aeroporturi Otopeni și Băneasa cu Gara de Nord, Gara Progresu, Gara Băneasa și Gara Basarab. Lungimea estimată este de 14 km și un număr de 12 stații;

- **Magistrala 7 – tronsonul Voluntari – Bragadiru** va asigura interconectivitatea între două zone populate din S-V și N-E Bucureștiului. Lungimea estimată este de 26 km și un număr de 27 stații și două depouri;
- **Magistrala 8 – Semi-inelul Sud Crângași – Dristor 2** va asigura toate relațiile de transfer ale călătorilor între magistralele de metrou, fără a mai fi necesară traversarea prin centrul orașului. Lungimea estimată este de 19 km și un număr de 18 stații.

Tabelul 2.3.4. Dezvoltarea noilor magistrale de metrou

Nr. crt.	Magistrala	Traseu	Status	km	Stații	Valoare (mil.EUR fără TVA)	Perioada estimată
1	MAGISTRALA 4	Gara de Nord - Gara Progresu	P	10.6	14	1471	2021 - 2027
2	MAGISTRALA 5	Eroilor - Universitate	P	2.8	3	1530	2021 - 2030
3		Universitate - Iancului - Pantelimon	P	8.7	9		
4	MAGISTRALA 6	1 Mai - Aeroport Otopeni	P	14.2	12	1051	2021 - 2023
5	MAGISTRALA 7	Voluntari - Bragadiru	P	26	27	2470	2027 - 2037
6	MAGISTRALA 8	Semi-inel Sud (Crângași - Dristor 2)	P	19	18	1805	2027 - 2037
TOTAL				81.3	83	8327	

Extensia magistrelor de metrou - 900 mil. Euro (tabelul 2.3.5):


- **Extensie M2 – Pipera – Petricani:** tronsonul va uni magistrala M2 cu magistrala feroviară M800, în gara Petricani. Lungimea estimată este de 1.6 km și un număr de două stații;
- **Extensie M2 – Berceni – Linia de Centură Sud:** tronsonul va uni magistrala M2 de inelul feroviar al Bucureștiului, în zona sudică. Lungimea estimată este de 2.4 km și un număr de două stații;
- **Extensie M3 – Păcii – Linia de Centură Vest:** tronsonul va uni magistrala M3 de inelul feroviar al Bucureștiului, în zona vestică. Lungimea estimată este de 3.7 km și un număr de 4 stații;
- **Extensie M4 – Străulești – Mogoșoaia:** tronsonul va uni magistrala M4 cu magistrala feroviară M700, în gara Parc Mogoșoaia. Lungimea estimată este de 2 km și un număr de două stații;

Tabelul 2.3.5. Extensia magistrelor de metrou

Nr.crt.	Magistrala	Traseu	Status	km	Stații
1	MAGISTRALA 2	Pipera - Petricani	P	1.6	2
2		Berceni - Linia de Centură Sud	P	2.4	2
3	MAGISTRALA 3	Păcii - Linia de Centură Vest	P	3.7	4
4	MAGISTRALA 4	Străulești - Mogoșoaia	P	2	2
TOTAL				9.7	10



Figura 2.3.1. Rețeaua de metrou și cale ferată a Municipiului București

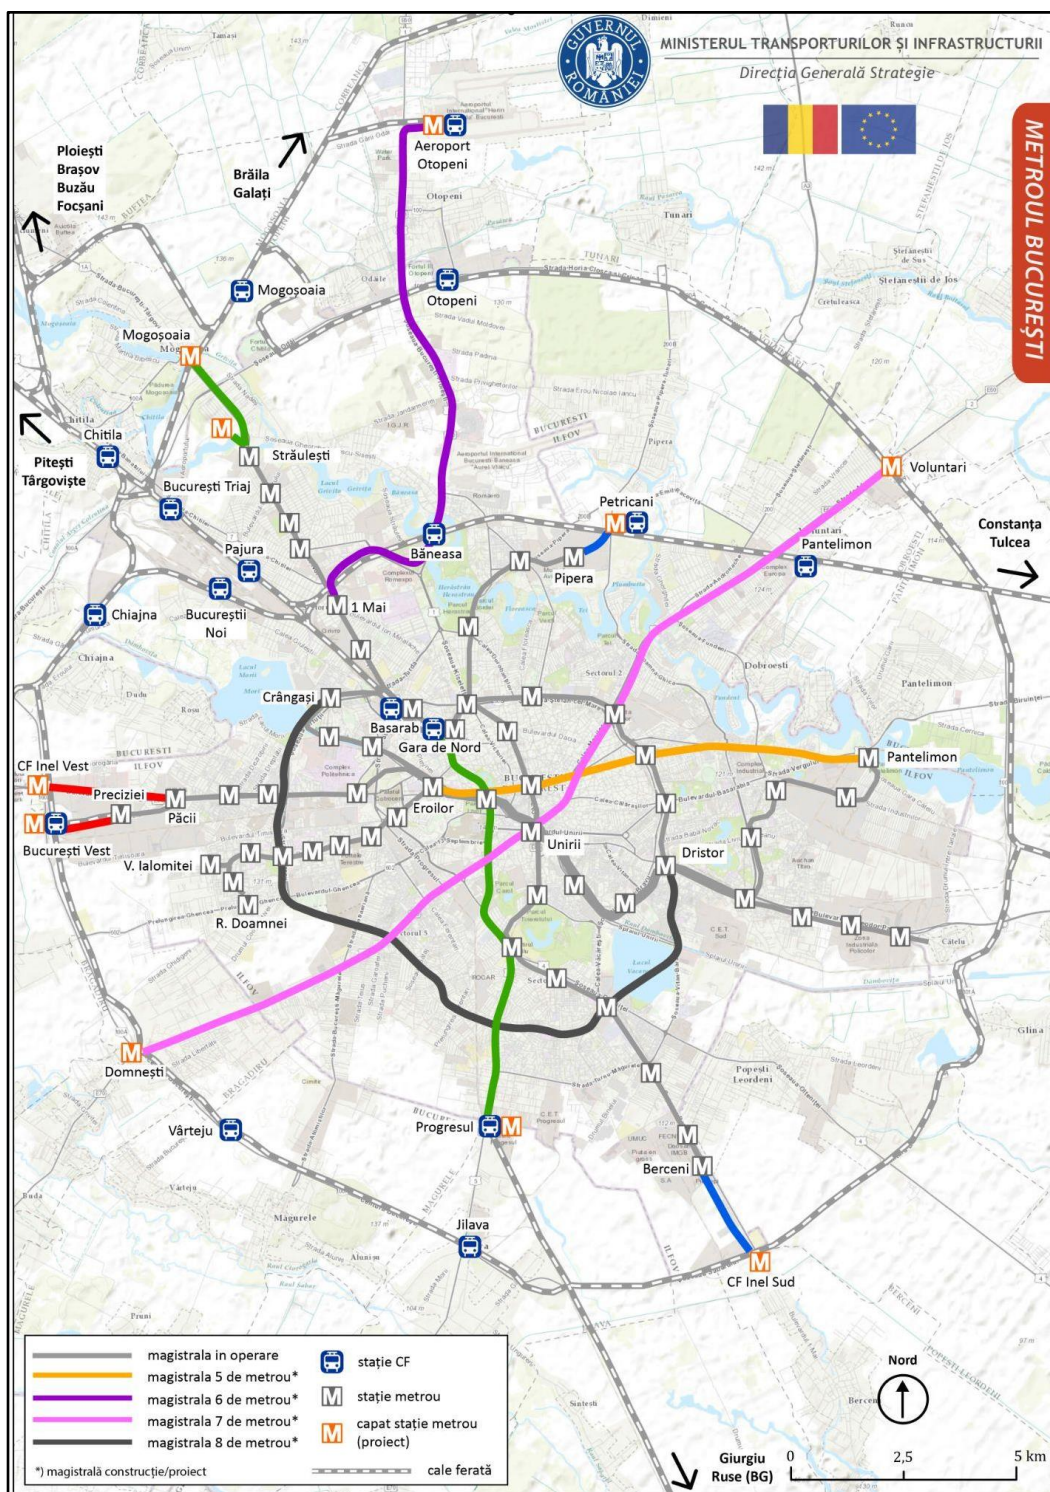

- **Extensie M3*** – Proiectul constă în extinderea la suprafață, urmând modelul prelungirii liniei de metrou Berceni – Berceni Centura (stația Tudor Arghezi), a două noi racorduri, sub forma

literei Y, care vor porni din stația Preciziei. Beneficiile proiectului propus constau în conectarea la magistrala de metrou M3 a două bazine rezidențiale importante (Zona rezidențială Militari, respectiv zona rezidențială Prelungirea Ghencea), cu impact pozitiv în ceea ce privește modificarea modală de transport urban din cea terestră, în cea subterană (figura 2.3.3).

Cele două racorduri se conectează la magistrala de metrou în zona stației Preciziei (Depoul Militari). Lungimea acestora este de aproximativ 7.66 km (3.30 km aripa Nordică și 4.36 km aripa Sudică):

- Racordul Militari-Chiajna, care va conecta actuala magistrală cu zona în continuă dezvoltare și dens populată denumită Militari Residence din cartierul Chiajna și a zonei comerciale Complex Comercial Militari. Racordul va fi construit paralel cu linia de tren ce pleacă din centură către depoul Militari; va avea stație comună cu inelul feroviar / trenul metropolitan în zona București Vest, apoi se va desprinde către est în direcția cartierului Militari Residence. Lungimea estimată este de 3.3 km și un număr de două stații supraterane (Stația Autostrada A1, Stația Strada Osiei). În zona subtraversării autostrăzii A1, va putea fi folosit spațiul existent paralel cu linia de centură feroviară, nefiind necesare construirea de lucrări de artă costisitoare.
- Racordul Militari – Cartierul Latin (Bragadiru) va conecta actuala magistrală cu o altă zonă dens populată, zona Cartierului Latin din sudul actualei magistrale. Racordul va fi construit paralel cu linia de tren ce pleacă din depoul Militari către ramura de sud a centurii feroviare, va merge paralel cu centura feroviară către Domnești unde avea stație comună cu inelul feroviar / trenul metropolitan. De aici, linia se va desprinde apoi către est în direcția Cartierului Latin (Bragadiru) pe aliniamentul nordic al străzii Prelungirea Ghencea, aliniament ce prezintă un număr redus de construcții până la stația terminus. Lungimea estimată este de 4.36 km și un număr de două stații supraterane (Domnești și Cartierul Latin).

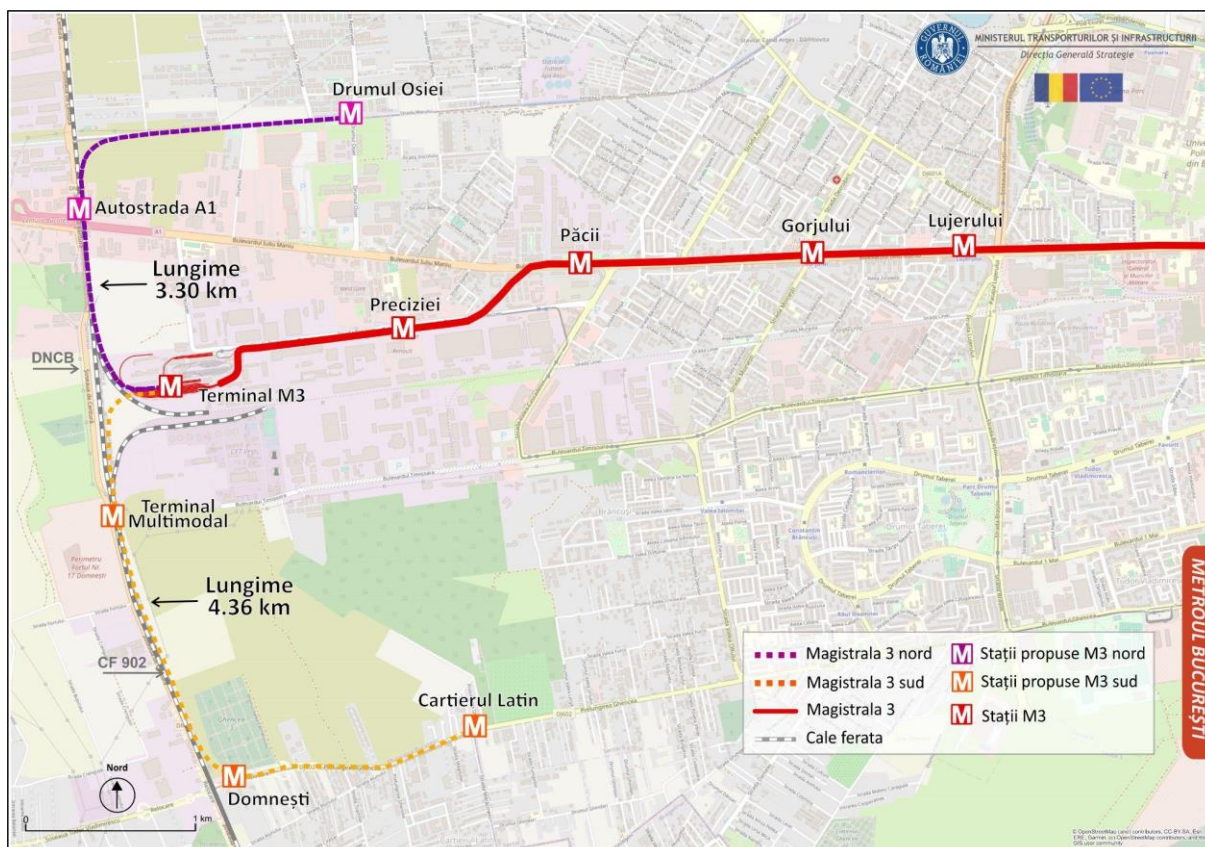


Figura 2.3.3. Rețeaua de metrou a Municipiului București - Magistrala 3 și propunere extindere rețea

Rețeaua de metrou din Cluj-Napoca

Construcția magistralei M1CJ – Gilău – Florești – Cluj-Napoca (20 km – 19 stații/depouri). Magistrala I de Metrou Cluj-Napoca este preconizată a avea o lungime de circa 20 km, cu o interstație medie de aprox. 1000 m și o capacitate de transport de 15 mii pasageri pe oră și sens. Linia va fi deservită de un depou care va oferi facilități de parcare și întreținere a materialului rulant. Traseul se va desfășura în subteran cu excepția porțiunii din localitatea Florești, unde pe cât posibil se va realiza la suprafață (figura 2.3.4).

Costul de investiție aferent Proiectului este estimat la 1481 mil. EUR, care va acoperi lucrările de construcție și montaj, precum și dotarea cu material rulant.

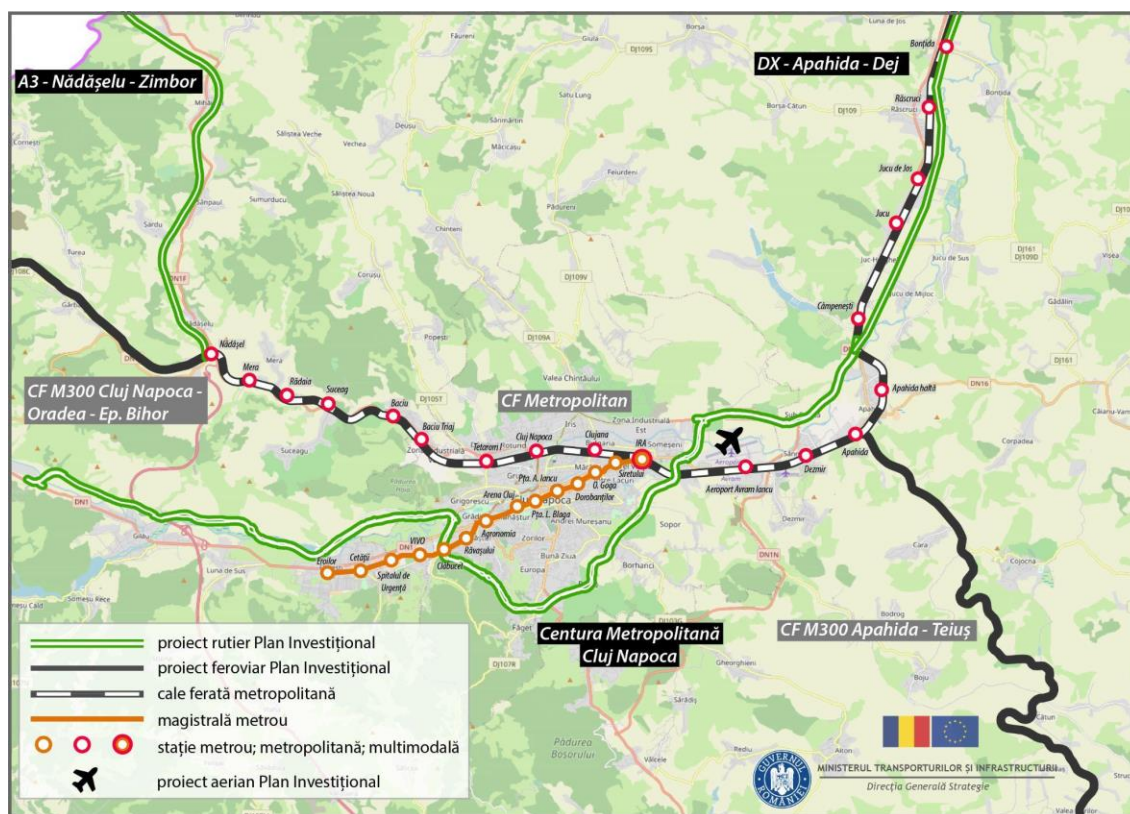


Figura 2.3.4. Model de dezvoltare a magistralei de metrou în relație cu dezvoltarea liniilor de tren metropolitan S - Cluj-Napoca

Proiecte solicitate pentru finanțare din PNRR

Modul de transport cu metroul prezintă proiecte finanțate din PNRR prin *Investiția 4 - Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca*, iar investiția constă în construirea de noi magistrale de metrou în Municipiul București și în Municipiul Cluj-Napoca:

- **M4: București - Secțiunea 1:** Gara de Nord - Filaret (6 stații) — 5.2 km;
- **M1: Cluj-Napoca – Secțiunea 1:** Sf. Maria - Europa Unit (9 stații) — 7.5 km

Având în vedere complexitatea tehnică a lucrărilor și termenele impuse de Regulamentul PNRR, propunem spre finanțare o secvențiere funcțională a lucrărilor astfel:

- **Faza 1** (prin PNRR): Lucrări de structură de rezistență – stații, interstații – tuneluri, galerii, alte construcții – cu finalizare în Q2 2026 - indicatorul fiind 12.7 km de tuneluri metrou cu stațiile aferente:
 - M4 București: Gara de Nord - Filaret (6 stații) - 5.2 km;
 - M1 Cluj-Napoca: Sf. Maria - Europa Unită (9 stații) - 7.5 km
- **Faza 2:**
 - Lucrări de cale, finisaje, instalații, achiziție material rulant și semnalizare pentru stațiile din faza 1 - cu finalizare în Q4 2028

- Integral (lucrări de structură de rezistență – stații, interstații – tuneluri, galerii, alte construcții, lucrări de cale, finisaje, instalații, achiziție material rulant și semnalizare), următoarele stații:
 - M4 București: Filaret - Progresu (7 stații, un depou) - 6.74 km;
 - M1 Cluj-Napoca: Florești - Sf. Maria și Mărăști - Muncii (10 stații, un depou) - 12.6 km

Măsuri privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH

Transportul cu metroul prin excelență reprezintă o conectivitate urbană/periurbană de mare capacitate care este în armonie cu mediu și cu tendințele actuale privind lupta împotriva schimbărilor climatice. Conectarea la rețeaua de metrou a marilor bazine rezidențiale din București și Cluj-Napoca are un impact pozitiv în ceea ce privește schimbarea modală de transport pentru pasageri în cele două municipii, de la transport individual de suprafață spre cel subteran de masă.

Cu toate acestea, o serie de măsuri care sunt necesare a fi implementate se au în vedere, astfel încât principiul DNSH să fie îndeplinit cu cât mai mare acuratețe în special în ceea ce privește eficiența energetică.

Astfel, se are în vedere achiziția trenurilor de metrou care au consum redus de energie, dotat cu echipamente de regenerare de energie la frânare, dar și modernizarea stațiilor de metrou cu instalații electrice ecologice (cu durată de viață lungă și consum redus de energie), precum construcția de noi stații de metrou, parte dintre ele cu aport de lumină naturală.

În acest sens, fiecare proiect va include la nivel de documentație tehnico-economică, o analiză privind respectarea principiului DNSH, ca o condiție pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene.

2.4. MODURI DE TRANSPORT: NAVAL

Situația curentă

În ceea ce privește transportul naval, România dispune de o poziție strategică favorabilă dezvoltării acestui sector, fiind riverană la Marea Neagră și străbătută de fluviul Dunărea pe o lungime de 1075 km, o importantă cale navigabilă din Europa. Prin construirea Canalului Dunăre – Marea Neagră și a Canalului Poarta Albă – Midia Năvodari s-a realizat o legătură directă între Marea Neagră și Marea Nordului prin coridorul Rin – Main – Dunăre.

Lungimea căilor navigabile interioare în România însumează 2763 km din care Fluviul Dunărea 1075 km, brațele secundare ale Dunării 524 km, Canalul Dunăre – Marea Neagră 64 km, Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari 28 km, Canalul Bega 40 km. Sistemul de căi navigabile interioare al României este concentrat pe fluviul Dunărea, brațele secundare navigabile ale Dunării și cele două canale.

De asemenea, România deține o rețea hidrografică importantă în cadrul căreia unele cursuri de apă se pretează la dezvoltarea unor canale navigabile. Spre exemplificare, în anul 1982 au fost întocmite documentațiile tehnico – economice pentru amenajarea cursurilor inferioare ale râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație, irigații, producere de energie electrică, protecție împotriva inundațiilor a localităților și terenurilor agricole riverane, stimulare turism, ecologizare, pentru un sector navigabil în lungime de 73 km cuprins între Dunăre și București. În ianuarie 1990 execuția lucrărilor pentru amenajările complexe de pe Argeș și de pe Dâmbovița au fost sistate și abandonate la un progres fizic de 80% (în prezent starea lucrărilor este incertă, cu multe dintre lucrările realizate în stare avansată de degradare).

Canalul Dunăre - Marea Neagră (CDMN) realizează legătură între fluviul Dunărea și Marea Neagră pe o lungime de 64.41 km între Cernavodă și Agigea, având lățimea de 70 m și cuprinde trei tronsoane caracteristice:

Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari (CPAMN) realizează legătura între CDMN cu Marea Neagră și portul Luminița de pe lacul Tașaul. Lungimea canalului este de 27.757 km, la care se adaugă legătura cu portul Luminița de 5.0 km și are trei zone funcționale.

În conformitate cu standardele CEE-ONU, Canalul Dunăre – Marea Neagră se înscrie în clasa a VI-a de canale interioare, cea mai înaltă clasă internațională pentru astfel de construcții.

Canalul Dunăre - Marea Neagră unește portul Cernavodă cu portul maritim Constanța, scurtând cu aproximativ 400 km ruta navelor dinspre Marea Neagră spre porturile dunărene din Europa Centrală. Construcția canalului a durat aproximativ 8 ani, canalul fiind inaugurat oficial în 1984.

Canalul este accesibil navelor fluvio-maritime autopropulsate de până la 5000 tone, având o lungime de până la 138 metri, o lățime de 16.8 metri și un pescaj de 5.5 metri. Pe canal pot circula simultan, în ambele sensuri convoaie cu 6 barje având în total până la 18 mii tone, cu o lungime maximă a convoiului de 296 metri, o lățime de 22.8 metri și un pescaj de 3.8 metri.

La capetele canalului, respectiv la Cernavodă și Agigea există două ecluze duble, care asigură accesul navelor pe canal. Pe parcursul Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari există alte două ecluze: Năvodari și Ovidiu.

La deschiderea navigației pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, în anul 1984, respectiv 1986, erau executate numai lucrările minime necesare desfășurării traficului naval. Nefinalizarea lucrărilor, natura rocilor, influența factorilor hidrometeorologici (vânt, ploi, zăpezi) și a ciclurilor repetate de îngheț-dezgheț, pot produce alunecări, prăbușiri, cu implicații majore asupra stabilității generale a malurilor, care pot conduce la obturarea șenalului navigabil cu materiale desprinse din taluz și transportate în canal, precum și la deteriorarea lucrărilor deja executate.

Accesul la Marea Neagră pune România în poziția de a fi furnizor de servicii portuare maritime, în mod deosebit prin Portul Constanța, port care are avantajul de a fi cel mai adânc port la Marea Neagră - cu adâncimi de până la 19 metri. Serviciile portuare maritime pot fi furnizate agenților economici naționali dar și internaționali în special în țările care nu au acces la o mare, în particular vecinii României (Serbia, Ungaria) dar și Austria, Slovacia. Legătura Dunării cu Marea Neagră extinde potențialul „hinterland-ul” Portului Constanța până în Austria și Germania.

În România, din domeniul public al statului fac parte două porturi maritime (destinate predominant mărfurilor), administrate de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța:

- **Portul Constanța** (inclusiv zona Midia și zona Basarabi), cu o suprafață totală de cca. 46.991 mii ha, fiind principalul port de operare a mărfurilor;
- **Portul Mangalia** (inclusiv peninsula V6), cu o suprafață totală de cca 187 ha.

Navele maritime de capacitate mare pot fi operate în România în porturile maritime Constanța (ex. tancuri cu capacitatea de 165 mii tone și vrachiere cu capacitatea de 220 mii tone), Mangalia și zona Midia, iar navele maritime cu o capacitate de maxim 12.5 mii tone pot fi operate și în porturile fluvio-maritime Brăila, Galați, Tulcea și Sulina, porturi situate la Dunăre.

Volumele de marfă operate prin porturile maritime în anul 2019 sunt prezentate în tabelul 2.4.1.

Tabelul 2.4.1. Volumele de marfă din porturile maritime (2019). Sursa: INS

Nr. crt.	Denumire port	Mărfuri maritime operate (mii tone)	Mărfuri fluviale operate (mii tone)	TOTAL (mii tone)
1.	Constanța	42 195	14 555	56 750
2.	Midia	7 631	584	8 215
3.	Mangalia	267	0	267

De remarcat faptul că în anul 2020, din cauza situației mondiale provocate de Pandemia Covid-19, se remarcă o reducere a volumului de mărfuri încărcate/descărcate față de 2019 (11.1% la mărfuri încărcate și 11.0% la mărfuri descărcate).

Conform Regulamentului TEN-T Nr. 1315/2013, dintre porturile maritime românești, doar Constanța este considerat aparținând rețelei TEN-T port Core.

România are peste 35 de porturi fluviale (interioare): Baziaș, Moldova Veche (include Moldova Nouă), Drencova, Șvinița, Tișovița, Dubova, Gura Văii, Orșova, Drobeta Turnu Severin (include Bazin șantier naval, Mărfuri generale, Pasageri), Porțile de fier II (Gogoșu), Gruia, Calafat, Cetate, Rast, Bechet, Corabia, Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu (include Ramadan, Veriga, Plantelor), Oltenița, Călărași (include Siderca, Chiciu), Fetești, Cernavodă, Hârșova, Turcoaia (include Gura Arman), Măcin, Brăila (include Docuri), Galați (include Docuri, Bazinul nou), Isaccea, Tulcea (include Industrial, Faleză), Mahmudia, Chilia Veche, Sulina (include Pasageri, Perimetru I, Perimetru II), Medgidia, Basarabi (Murfatlar), Ovidiu, Luminița.

Dintre acestea, România consideră următoarele porturi ca fiind de tip fluvio-maritim: Sulina, Isaccea, Tulcea, Galați, Brăila. Din punct de vedere al aspectelor strategice tratate de prezentul Plan, aceste porturi sunt considerate porturi fluviale (interioare) care au atuul că pot opera și nave maritime de un anumit tonaj.

Conform Regulamentului TEN-T Nr. 1315/2013, următoarele porturi fluviale sunt situate pe rețeaua TEN-T: Sulina, Mahmudia, Tulcea, Galați, Brăila, Cernavodă, Medgidia, Basarabi (Murfatlar), Ovidiu, Călărași, Oltenița, Giurgiu, Calafat, Drobeta Turnu Severin, Moldova Veche, la care se adaugă proiectele porturilor București (1 Decembrie, Glina). Dintre acestea, porturile Galați, Cernavodă, Giurgiu, Calafat și Drobeta Turnu Severin se află pe rețeaua TEN-T Core.

În tabelul de mai jos (tabelul 2.4.2) se prezintă volumele de marfă transportate prin porturile fluviale în anul 2019.

Tabelul 2.4.2. Volumele de marfă din porturile fluviale (2019). Sursa: INS

Nr. crt.	Denumire port	Mărfuri maritime operate (mii tone)	Mărfuri fluviale operate (mii tone)	TOTAL (mii tone)
1	Galați	2.061	5.919	7.980
2	Tulcea	15	1.660	1.675
3	Brăila	835	397	1.232
4	Cernavodă	n/a	1.219	1.219
5	Drobeta T. Severin	n/a	1.152	1.152
6	Călărași	n/a	1.106	1.106
7	Măcin-Turcoaia	n/a	981	981
8	Giurgiu	n/a	830	830
9	Basarabi	n/a	654	654
10	Ovidiu	n/a	579	579
11	Oltenița	n/a	497	497
12	Medgidia	97	299	396
13	Mahmudia	n/a	305	305
14	Turnu Măgurele	n/a	279	279
15	Corabia	n/a	222	222
16	Calafat	n/a	214	214
17	Orșova	n/a	185	185
18	Bechet	n/a	157	157
19	Hârșova	n/a	121	121
20	Isaccea	n/a	88	88
21	Moldova Veche	n/a	83	83
22	Zimnicea	n/a	65	65

23	Zona Delta (incl. Sulina)	n/a	34	34
24	Luminița	n/a	6	6

De remarcat faptul că operarea de containere rămâne relevantă doar la nivelul porturilor maritime (Portul Constanța) în anul 2019 înregistrându-se aproximativ 665 mii TEU nivel sensibil egal cu cel din 2018, pe când la nivelul porturilor fluviale nivelul de operare a containerelor este neglijabil (aproximativ 1800 TEU în anul 2019).

Există mai multe porturi turistice la Marea Neagră sau la Dunăre, dar impactul economic al acestora este predominant local și nu fac subiectul prezentului Plan. De altfel, se recomandă ca dezvoltarea acestor porturi de tip „marina” să se realizeze sub autoritate locală însă coordonat din punct de vedere al siguranței cu MTI. Porturile turistice nu se vor dezvolta pentru activități cargo/industriale.

Dunărea reprezintă artera principală a căilor navigabile interioare ale României. În anul 2019, pe căile navigabile interioare ale României s-au transportat 33.26 milioane tone marfă echivalentul a aproximativ 14 miliarde tone-km. Principalul beneficiar extern al transportului pe Dunăre fiind Serbia așa cum reiese din graficul de mai jos (figura 2.4.1).

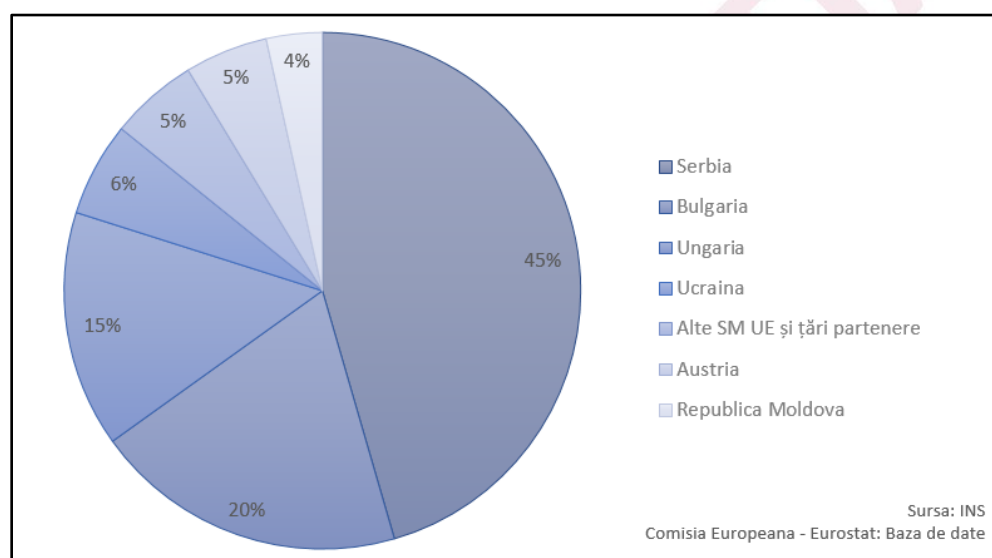


Figura 2.4.1. Structura transportului pe căi navigabile interioare, % din mii tone-kilometri (2019)

Este interesant de observat faptul că în anul 2019 România s-a situat pe locul 3 între statele membre UE în ceea ce privește volumul total al transportului pe căi navigabile interioare, în primele poziții fiind în mod dominant Olanda și Germania, așa cum reiese din graficul de mai jos (figura 2.4.2.)

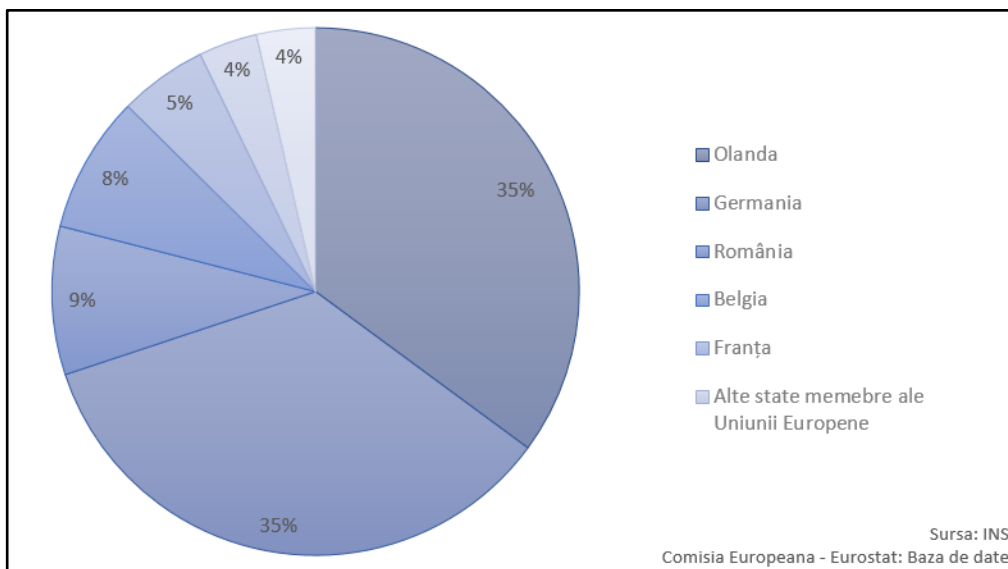


Figura 2.4.2. Structura volumului total al transporturilor pe căi navigabile interioare, % din mii tone - kilometri (2019)

În anul 2019 s-a înregistrat o creștere cu 11.9%, față de 2018, a volumului total (rezultat al trendului transportului internațional, care a crescut cu 32.1% și al transportul național cu 6.5%, în timp ce transportul de tranzit a înregistrat o scădere cu 4.9%) iar în anul 2020 valorile totale au înregistrat o scădere cu 8.2%, față de anul 2019 (rezultat al scăderii transportului național cu 18.7% și a transportul de tranzit cu 32.9%, în timp ce transportul internațional a înregistrat creștere cu 18.1%) (figura 2.4.3.).

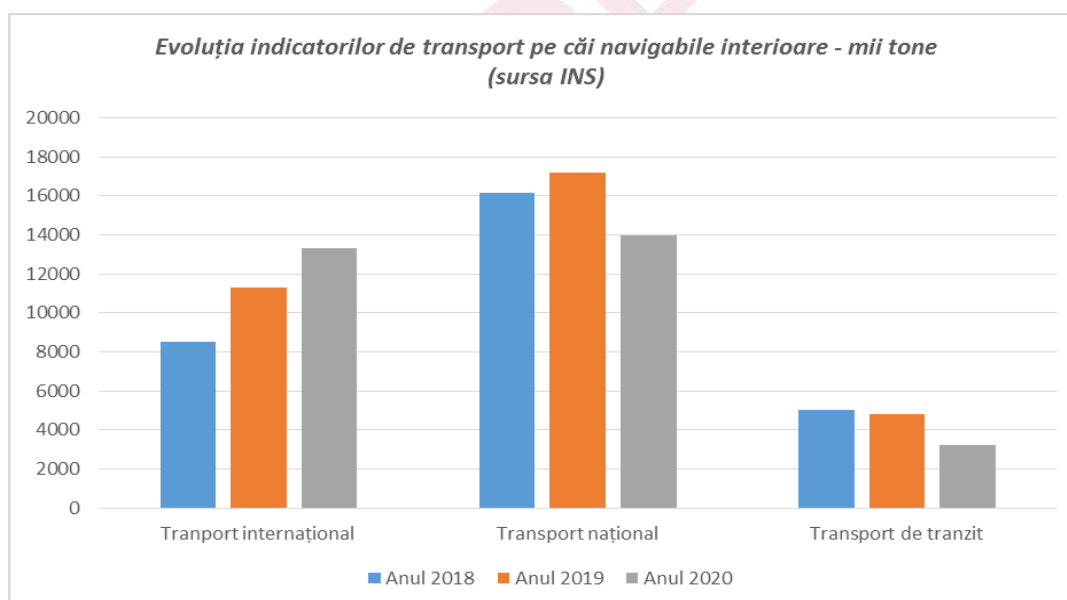


Figura 2.4.3. Prognoză indicatori transport naval

Principala problemă a transportului pe Dunăre o reprezintă lipsa de predictibilitate cauzată de adâncimile mici (sub 2.5 m) în anumite perioade ale anului. Din acest motiv, în special în logistica

internațională, transportul pe Dunărea de jos este evitat. O barjă are pescajul de 0.5 m, fără încărcătură și de până la 3 m când este încărcată la maxim. Operatorii pot să estimeze ce volum de marfă pot transporta cu barjele, în funcție de prognozele privind nivelul apei. Împingătoarele sau remorcherile sunt nave care necesită o adâncime a apei de 1.8 – 2 m. Apele puțin adânci, dar mai ales lățimea șenalului împiedică navigarea convoaielor formate din două sau mai multe barje astfel încât unii operatori sunt nevoiți să treacă cu câte o barjă și să execute mai multe operațiuni cu împingătoarele sau remorcherile, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru transport.

Regimul navigației pe Dunăre este reglementat de *Convenția despre regimul navigației pe Dunăre*¹, Conform prevederilor art. 3 statele riverane își iau angajamentul de a menține sectoarele lor de Dunăre în stare de navigabilitate, de a executa lucrările necesare asigurării și îmbunătățirii condițiilor de navigație și de a nu împiedica navigația pe calea navigabilă.

Totodată, Convenția reglementează înființarea Comisiei Dunării care emite recomandări în ceea ce privește gabaritele de navigație. Pentru sectorul comun româno – bulgar, conform recomandărilor Comisiei Dunării, trebuie asigurate adâncimile minime pentru navigație pe *Dunărea Fluvială* (km 175 – km 1075) de 2.5 m față de ENR² și lățimi ale șenalului navigabil între 150 m și 180 m iar pe *Dunărea Maritimă* (km 100 – km 175), inclusiv pe Canalul Sulina, o adâncime de 7.32 m.

Sectorul românesc al Dunării, cuprins între km 1075 – Baziaș și până la vărsarea în Marea Neagră, km 100 – Bara Sulina, este caracterizat prin multiple schimbări morfologice ale albiei fluviului și fenomene de eroziune a malurilor, ceea ce conduce la apariția unor sectoare/puncte critice, prin deplasarea și depunerea pe fundul albiei a unor cantități semnificative de sedimente.

Conform Acordului între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Populare Bulgaria cu privire la întreținerea și îmbunătățirea șenalului navigabil pe sectorul româno-bulgar al Dunării, semnat la Sofia la 28 noiembrie 1955, întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de navigație în sectorul Dunării care constituie frontiera de stat dintre Republica Bulgaria și România se efectuează astfel:

- sectorul dintre km 845-500 (Gura râului Timoc) și km 610 (amonte port Somovit) este întreținut de către România, pe acest sector partea bulgară execută semnalizarea costieră de pe malul drept al Dunării;
- sectorul dintre km 610 (amonte port Somovit) și km 375 (aval port Silistra) este întreținut de către Bulgaria, pe acest sector. Partea română, prin AFDJ RA Galați, execută doar semnalizarea costieră de pe malul stâng al Dunării.

¹ Semnată la Belgrad la 18 august 1948 și ratificată prin Decretul nr. 298/1948

² Etiajul Navigabil și de Regularizare (ENR) - nivelul cu o durată de 94%, stabilit pentru tot parcursul navigabil al Dunării, pe baza debitelor observate în cursul unei perioade de 40 ani, exceptând perioada cu ghețuri

Există 12 puncte critice pe sectorul comun româno-bulgar, din care 6 pe sectorul gestionat de România și alte 6 pe sectorul gestionat de Bulgaria, după cum urmează:

<i>Puncte critice pe sectorul administrat de partea română:</i> - punctul critic 01 – Gârla Mare (km 839-837) - punctul critic 02 – Salcia (km 824-820) - punctul critic 03 – Bogdan-Secian (km 786-782) - punctul critic 04 – Dobrina (km 762-756) - punctul critic 05 – Bechet (km 678-673) - punctul critic 06 – Corabia (km 632-626)	<i>Puncte critice pe sectorul administrat de partea bulgară:</i> - punctul critic 07 – Belene (km 577-560) - punctul critic 08 – Vardim (km 542-539) - punctul critic 09 – Iantra (km 537-534) - punctul critic 10 – Batin (km 530-520) - punctul critic 11 – Kosui (km 428-423) - punctul critic 12 – Popina (km 408-401)
--	--

Dezvoltarea transportului pe apă

Obiectivele operaționale pentru transportul naval așa cum au fost prevăzute în Master Planul General de Transport sunt:

- OW1 – Îmbunătățirea navigabilității Dunării
- OW2 – Îmbunătățirea legăturilor rutiere și feroviare cu Dunărea pentru a reduce costurile și timpul
- OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională
- OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională
- OW5 – Îmbunătățirea coordonării la nivel guvernamental și înlesnirea investițiilor
- OW6 – Revizuirea activelor existente pentru concentrarea pe creșterea capacității
- OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval
- OW8 – Reducerea numărului de accidente pe Dunăre și a costurilor generate de acestea
- OW9 – Reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a dioxidului de sulf
- OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile
- OW11 – Utilizarea eficientă a porturilor și a facilităților acestora
- OW12 – Creșterea gradului de utilizare a transportului multimodal

Obiectivul general este reprezentat de poziționarea României pe ruta principală de schimburi de mărfuri între Europa și Asia, prin valorificarea superioară a potențialului Portului Constanța – port cu adâncimile cele mai mari la Marea Neagră și a legăturii acestuia cu restul Europei prin intermediul coridorului multimodal TEN-T Rin – Dunăre (format din căi navigabile, căi ferate și rețea de autostrăzi)

Cele mai importante obiective strategice sunt:

- Asigurarea adâncimilor minime de navigație pe Dunăre
- Dezvoltarea și modernizarea canalelor navigabile
- Dezvoltarea și modernizarea Portului Constanța pentru atingerea de noi fluxuri de marfă și creșterea competitivității acestuia
- Crearea unei rețele primare a porturilor fluviale ale României și focalizarea investițiilor pentru dezvoltarea acesteia
- Promovarea transportului pe căile navigabile interioare.

Viziunea strategică pentru domeniul transportului naval în România în următorii 10 ani se dezvoltă pornind de la elementele identificate în analiza situației curente prezentate și obiectivele MPGT prezentate mai sus:

1. Asigurarea fiabilității căilor navigabile, în particular a Dunării și a canalelor navigabile ale acesteia, prin asigurarea adâncimilor de navigație de 2.5 m pe Dunăre pentru tot parcursul anului, precum și consolidarea/apărarea malurilor și modernizarea echipamentelor de ecluzare. Concomitent, în baza sinergiilor cu celelalte sectoare economice, finalizarea lucrărilor la Canalul Dunăre-București și realizarea studiilor de (pre)fezabilitate pentru noi secțiuni de căi navigabile, în particular pe râurile Prut și Siret.
2. În cazul porturilor maritime, în următorii 10 ani, Portul Constanța va rămâne portul principal și va trebui să își crească de 4 ori volumul mărfurilor procesate (incluzând transportul RO-RO și containerizat) ajungând la 200 milioane tone marfă operate în 2030. Pentru aceasta, cu respectarea regulilor de ajutor de stat, se vor dezvolta investițiile necesare dezvoltării capacității de operare, precum și măsuri de capacitate administrativă pentru atragerea a noi fluxuri de marfă. Porturile Midia și Mangalia rămân secundare și se vor dezvolta în corelare cu Portul Constanța (nu vor concura, ci se vor completa). Toate aceste porturi rămân porturi de interes național.

Portul Constanța împreună cu legăturile pe Dunăre, pe căi ferate și rutiere trebuie să devină punctul central al strategiei de transport a României conform Master Planului General de Transport în scopul poziționării României ca un hub de transport între Europa și Asia:



Figura 2.4.4. Poziționare României ca hub de transport între Europa și Asia

3. Porturile fluviale vor fi sistematizate astfel încât să fie realizată o rețea primară de porturi ale căror suprafață de deservire (hinterland) corespunde unui potențial economic, precum și o rețea secundară de porturi care asigură accesibilitatea unor mărfuri specializate. Porturile de pe rețeaua primară și secundară își păstrează importanța națională. Celelalte porturi/puncte de lucru vor fi transferate către autorități/activități locale (inclusiv turism și agrement) sau desființate. Porturile din rețeaua primară și secundară vor fi susținute, în conformitate cu regulile ajutorului de stat, pentru dezvoltarea infrastructurii și capacității de oferire a serviciilor portuare.

Definirea rețelei primare și a celei secundare

Porturile de pe rețeaua primară sunt: Constanța, Sulina, Tulcea, Galați, Brăila, Cernavodă, Călărași, Oltenița, Giurgiu, Corabia, Calafat, Dr. Tr. Severin, Orșova, Moldova Nouă (figura 2.4.5).

Cu toate acestea, în funcție de volumele de trafic înregistrate în anul 2019, porturile fluviale cele mai utilizate (volume de marfă de aproximativ 500 mii tone sau peste) sunt Galați, Tulcea, Brăila, Cernavodă, Drobeta Tr. Severin, Călărași, Măcin-Turcoaia, Giurgiu, Basarabi (Murfatlar), Ovidiu și Oltenița. Având în vedere faptul că prezentul Plan prevede actualizarea MPGT, se propune rețeaua primară a porturilor fluviale conform MPGT și prezentată în figura 2.4.5, cu mențiunea că Portul Constanța este un port maritim.

De precizat că în cadrul procesului de negociere a modificării TEN-T, vor conta foarte mult volumele de trafic înregistrate în aceste porturi.

În ceea ce privește **rețeaua secundară**, aceasta se propune a se constitui în baza volumelor de trafic înregistrate, precum și a analizei tipului de marfă operat și a potențialului economic al zonei.

Porturile din rețeaua secundară sunt: Bechet, Turnu Măgurele, Zimnicea, Fetești, Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița, Măcin, Hârșova, Isaccea, Mahmudia, Chilia Veche (Figura 2.4.5).

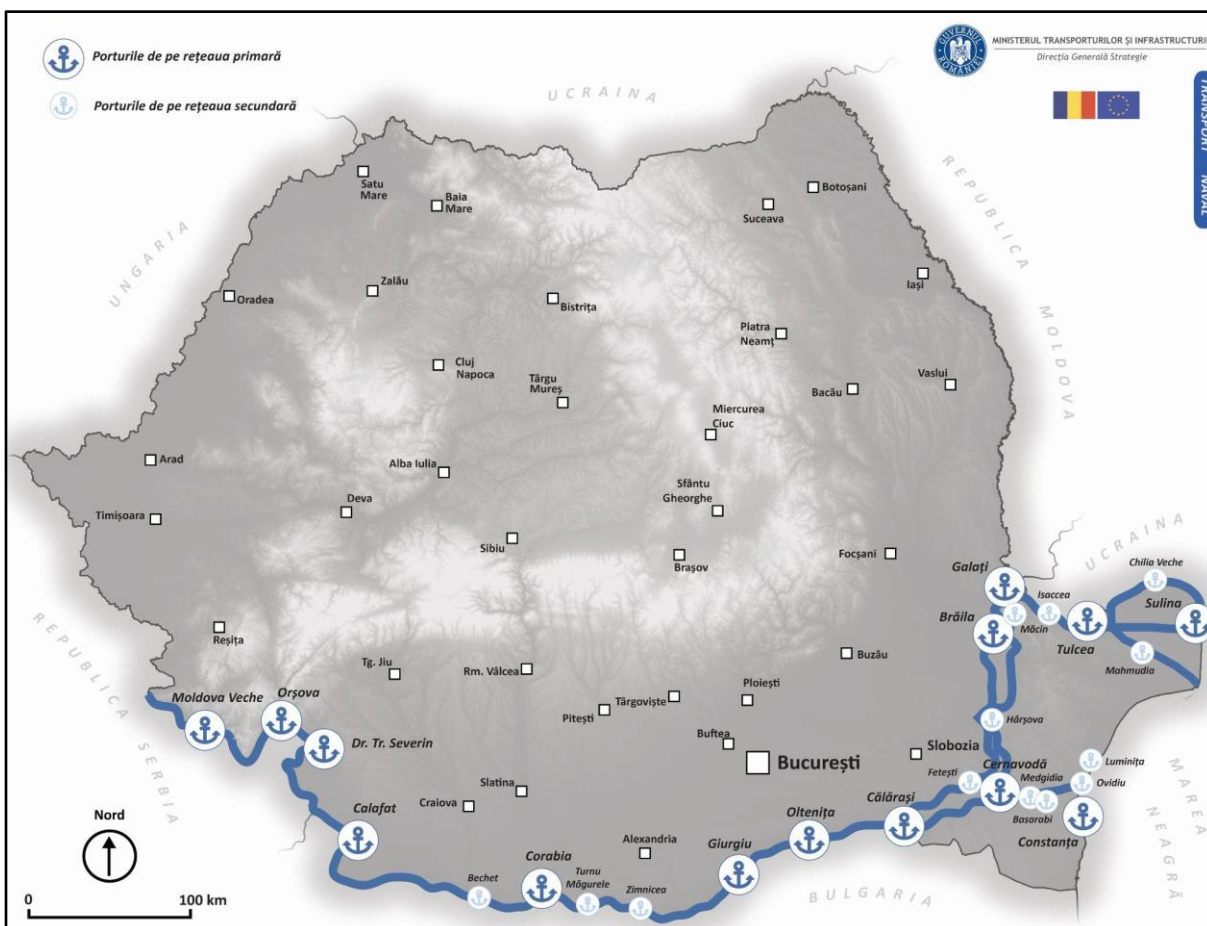


Figura 2.4.5. Harta proiectelor de investiții aferente rețelei primare și secundare – porturile fluviale și maritime

Având în vedere multitudinea de aspecte ale transportului naval, care vizează atât șenalul navigabil cât și infrastructurile hidrotehnice, precum și serviciile de transport de marfă și pasageri, împreună cu aspecte de siguranță a traficului și digitalizare, este necesară o cercetare mult mai amănunțită a stării sectorului și a potențialului de dezvoltare sub forma unei **Strategii de Dezvoltare a Transporturilor Navale**, care odată realizată, va completa prevederile prezentului Plan Investițional.

Strategia va fi elaborată de o echipă multidisciplinară de experți din toate domeniile relevante, cu sprijinul echipei desemnate din cadrul MTI. În procesul de elaborare a Strategiei, vor fi implicați toți factorii interesați, autorități publice centrale și locale, sectorul privat și alte părți interesate, care prin activitatea lor să valorifice potențialul pe care România îl are în ceea ce

privește domeniul transportului naval, pentru a susține dezvoltarea economică a României și a regiunii Dunării.

Strategia de Dezvoltare a Transporturilor Navale va prezenta problemele și nevoile cu care se confruntă sectorul naval, metode de abordare și soluționare, priorități de dezvoltare, acțiunile pentru îndeplinirea lor și resursele alocate.

Strategia va include:

- analiza situației actuale a căilor navigabile românești (atât pe căile navigabile interioare, cât și pe cele maritime) și a situației porturilor românești în ceea ce privește infrastructura;
- analiza proiectelor din sectorul naval românesc;
- analiza bazei de date pentru anul de bază a Modelului Național de Transport pentru transportul fluvial și pentru porturile din România;
- analiza economică și planurile de dezvoltare teritorială a UAT din zona de influență a porturilor;
- analiza tendințelor și scenariilor viitoare pentru 2027, 2030, 2035 și 2050 și elaborarea scenariilor de perspectivă pe termen scurt (2027), mediu (2035) și lung (2050);
- realizarea prognozelor aferente privind cererea de transport și trafic pentru transportul fluvial și pentru porturile din România;
- evaluarea modului de organizare și funcționare al administrațiilor portuare și de căi navigabile, concretizate prin propuneri de îmbunătățire privind cadrul legal și instituțional. Exemple relevante de bună practică din cadrul UE;
- analizarea modului de utilizare a fondurilor UE. Propuneri privind îmbunătățirea/eficientizarea utilizării acestor fonduri și impactul reglementărilor în materie de ajutor de stat pentru facilitarea dezvoltării porturilor;
- analizarea impactului economic și financiar ca urmare a implementării măsurilor propuse în cadrul „Strategiei de Dezvoltare a Transporturilor Navale” din România.

Analiza se va concentra asupra modului în care România poate îmbunătăți performanța de mediu a navelor și porturilor, ținând seama de cerințele la nivelul UE, în timp ce ar trebui acordată importanță furnizării de combustibili ecologici navelor (în special prin alimentarea cu energie terestră), strategia ar trebui să ia în considerare măsuri pentru ecologizarea tuturor operațiunilor portuare (emisii, zgomot, poluare etc.).

Pentru a încuraja navigabilitatea Dunării într-un mod durabil, este necesară o abordare care să combine infrastructura durabilă, combustibilii alternativi și digitalizarea, ținând cont de sensibilitatea ecologică a Dunării.

Propuneri de modificare a cadrului legal și instituțional privind modul de gestionare a infrastructurii de transport maritim cu obiectivele de integrare a transportului pe apă cu alte moduri de transport, pregătirea planurilor de dezvoltare a porturilor intermodale și creșterea transportului de marfă pe Dunăre cu 15% până în 2026 într-un manieră durabilă.

Strategia va stabili:

- direcțiile de dezvoltare, programele de investiții, proiectele specifice căilor navigabile interioare și specifice fiecărui port în parte;
- măsuri de politică a transporturilor, inclusiv politici comerciale, pe termen scurt, mediu și lung;
- o analiză privind modul de organizare și funcționare a sistemului de transport naval din punct de vedere al reglementărilor, al procesului decizional și al responsabilităților instituțiilor cu atribuții în domeniul naval.

Pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare a transportului naval se vor aborda aspecte privind:

- ecologizarea flotei;
- adaptarea la schimbările climatice și surse alternative de energie;
- conexiunile intermodale;
- digitalizarea porturilor și a flotei.

Strategia de Dezvoltare a Transporturilor Navale va fi însoțită de un **Plan de Acțiuni** și de un **Ghid de prioritizare a investițiilor**, care vor constitui fundamentul deciziilor de finanțare a acestui sector în viitor, cu identificarea clară a responsabililor, a proiectelor și a surselor de finanțare utilizate în atingerea obiectivelor stabilite. **Aprobarea de către Guvern a Strategiei privind Transportul Naval are milestone în cadrul PNRR, cu termen Q2 2023.**

Până la realizarea Strategiei menționate mai sus, în scopul determinării listei de proiecte pentru următorii 10 ani, aferente viziunii strategice prezentate mai sus, se va pleca de la obiectivele specifice, rețelele primare și secundare, precum și de la proiectele deja în derulare la începutul anului 2020.

Pentru perioada 2020-2030, proiectele pentru asigurarea viziunii și obiectivelor strategice ale Planului Investițional și ale MPGT este prezentată în tabelul 2.4.3, lista de proiecte aferentă căilor navigabile interioare, luând în considerare în primul rând proiectele aflate în pregătire în perioada 2014-2020. Astfel, pentru sectorul căilor navigabile interioare, următoarele proiecte compun scenariul de referință (tabelul 2.4.3).

Tabelul 2.4.3. Proiecte din scenariul de referință - sectorul căilor navigabile interioare

Nr. Crt.	Denumire proiect (scenariul de referință)	Rețea TEN-T	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
1.	Modernizarea ecluzelor pe Canalul Dunăre – Marea Neagră – faza a II-a	Core	102.9	122.5
2.	Apărări de maluri pe Canalul Sulina – etapa finală	Core	68.1	81.0
3.	Studiu de fezabilitate: Apărări de maluri Canalul Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari	Core	2.2	2.6
4.	Studiu de fezabilitate: Modernizarea ecluzei Năvodari	Core	3.4	4.1
5.	Echipamente pentru asigurarea navigației pe Dunăre în timpul iernii	Core	27.6	32.8
6.	Reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice pe sectorul românesc de Dunăre	Core	4.4	5.2
7.	Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea și digitalizarea sistemului de semnalizare pe Dunărea maritimă și fluvială	Core	0.4	0.5
8.	Reactualizare SF Amenajare râul Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe	Core	1.3	1.5
TOTAL			210.3	250.2

Pentru sectorul naval, lista proiectelor se regăsește în tabelul 2.4.4.

Tabelul 2.4.4. Lista proiectelor - sectorul căi navigabile

Nr. Crt.	Denumire proiect (proiecte noi)	Rețea TEN-T	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
1.	Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și protecție a mediului pe Dunăre din cadrul proiectului "Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175"	Core	92.4	110
2.	Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre pe sectorul comun RO-BG (FAST DANUBE 2)	Core	142.9	170
3.	Apărări de maluri pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari	Core	42.0	50
4.	Finalizarea Canalului Dunăre - București – Brațul Argeș	Core	588.2	700
5.	Studiu de prefizabilitate: Dezvoltarea pentru navigație interioară a râurilor Prut și Siret	Alte	8.4	10
7.	Lucrări și achiziții de echipamente pentru sisteme de asigurare a siguranței navigației și intervențiilor în caz de poluare	Core	33.6	40
TOTAL			907.6	1080

Pentru sectorul porturilor maritime, proiectele care sunt luate în considerare în scenariul de referință sunt prezentate în tabelul 2.4.5.

Tabelul 2.4.5. Proiecte din scenariul de referință - sectorul porturilor maritime

Nr. Crt.	Denumire proiect (scenariul de referință)	Port	Rețea TEN-T	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
1.	Extinderea la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10bis și Poarta 10	Constanța	Core	10.4	12.4
2.	Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța	Constanța	Core	19.4	23.1
3	Modernizarea și dezvoltarea capacității portului Constanța - dezvoltarea infrastructurii portuare în zona de dezvoltare A, MOL II-S Port Constanța Sud prin extinderea platformei portuare facilitand transportul multimodal	Constanța	Core	37.8	45.0
TOTAL				67.6	80.5

Pentru sectorul porturilor fluviale, proiectele care sunt luate în considerare în scenariul de referință sunt prezentate în tabelul 2.4.6.

Tabelul 2.4.6. Proiecte din scenariul de referință - sectorul porturilor fluviale

Nr. Crt.	Denumire proiect (scenariul de referință)	Port	Rețea TEN-T	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
----------	---	------	-------------	-------------------------------	-----------------------------

1.	Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800	Tulcea (Faleză)	Comprehensive	37.8	45.0
2.	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	Tulcea (Industrial)	Comprehensive	11.3	13.5
3.	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară	Isaccea	Alte	3.3	3.9
4.	Platformă multimodală Galați - Etapa II - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	Galați	Core	16.3	19.4
5.	Platforma multimodala Galați - Etapa III - Platforma multimodala	Galați	Core	58.0	69.0
6.	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	Galați	Core	4.5	5.35
7.	Modernizarea Portului Sulina Perimetrul I - Zona Liberă	Sulina	Comprehensive	16.0	19.0
8.	Modernizarea Portului Sulina Cap Mol - Bazin Maritim - Perimetrul II	Sulina	Comprehensive	16.4	19.5
9.	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina	Sulina	Comprehensive	27.5	32.7
10.	Extinderea infrastructurii Portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului - Etapa I	Calafat	Core	11.7	13.95
11.	D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu	Giurgiu	Core	19.4	23.11
12.	Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia	Medgidia	Alte	17.4	20.65
13.	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri	Brăila	Comprehensive	21.5	25.6
14.	Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu	Ovidiu	Comprehensive	12.2	14.54
15.	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia	Corabia	Alte	24.1	28.65
16.	Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița	Luminița	Alte	16.6	19.75
17.	Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele	Turnu Măgurele	Alte	10.5	12.50
18.	Strategia de Dezvoltare a Transporturilor Navale	MTI - DTN	Toate	3.6	4.30
TOTAL				328.1	390.4

Pentru perioada 2020-2030, pentru asigurarea viziunii și obiectivelor strategice ale Planului Investițional și ale MPGT este prezentată în tabelul 2.4.7 lista de proiecte aferentă porturilor maritime, luând în considerare în primul rând proiectele aflate în pregătire în perioada 2014-2020.

Tabelul 2.4.7. Proiecte în pregătire în perioada 2014-2020 - porturile maritime

Nr. Crt.	Denumire proiect (proiecte noi)	Port	Rețea TEN-T	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
1.	Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța	Constanța	Core	19.3	23
2.	Extindere și modernizare infrastructură de apă și canalizare prin preluarea de ape pluviale și stabilizarea zonei adiacente	Constanța	Core	17.6	21
3.	Asistență tehnică pentru pregătire proiecte Master Plan al infrastructurii rutiere și de acces	Constanța	Core	0.4	0.5

4.	Realizarea unei infrastructuri - rețea de tip port - community - system în vederea operaționalizării sistemului de digitalizare	Constanța	Core	19.3	23
5.	Cheu de acostare adiacent canal de legătura între danele 85-89	Constanța	Core	20.2	24
6.	Dezvoltarea insulei artificiale	Constanța	Core	58.8	70
7.	Dezvoltarea molurilor 3 și 4	Constanța	Core	420.2	500
8.	Proiecte de dezvoltare în conformitate cu rezultatele Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale	Constanța	Core	420.2	500
9.	Proiecte de dezvoltare în conformitate cu rezultatele Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale	Midia	Alte	33.6	40
10.	Proiecte de dezvoltare în conformitate cu rezultatele Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale	Mangalia	Alte	33.6	40
11	Proiecte de siguranță, securitate și implementare infrastructura pentru combustibili alternativi în porturile maritime	Toate	Toate	84.0	100
	TOTAL			1127.3	1341.5
Legendă					
	Proiecte cu grad mare de certitudine strategică				
	Proiecte cu grad mediu de certitudine strategică, urmând a fi confirmate de Strategia pentru dezvoltarea transporturilor navale				
	Proiecte cu grad scăzut de certitudine strategice, urmând a fi confirmate de Strategia pentru dezvoltarea transporturilor navale				

Pentru perioada 2020-2030, pentru asigurarea viziunii și obiectivelor strategice ale Planului Investițional și ale MPGT, este prezentată în tabelul 2.4.8 lista de proiecte aferentă porturilor fluviale luând în considerare în primul rând proiectele aflate în pregătire în perioada 2014-2020. De amintit faptul că în completarea prezentului plan se va derula un studiu detaliat pe fiecare port aferent rețelei primare și secundare pentru identificarea obiectivelor individuale de investiții în interiorul fiecărui port care se va finaliza cu Strategia de Dezvoltare a Transporturilor Navale. Până la realizarea acestui studiu, pentru porturile rețelei primare unde nu s-au lansat proiecte de pregătire a investițiilor individuale, volumul investițiilor pentru următorii 10 ani se va limita la 100 mil.EUR, iar pentru porturile de pe rețeaua secundară aflate în aceeași situație, volumul investițiilor se va limita la 50 mil.EUR (figura 2.4.6).

Tabelul 2.4.8. Lista de proiecte aferentă porturilor fluviale pentru perioada 2020-2030

Nr. Crt.	Denumire proiect (proiecte noi)	Port	Rețea TEN-T	Cost total (mil. EUR fără TVA)	Cost total (mil. EUR cu TVA)
1	Modernizare și dezvoltare Port Sulina	Sulina	Compr.	84	100
2	Modernizare și dezvoltare Port Tulcea	Tulcea	Compr.	84	100
3	Modernizare și dezvoltare Port Galați	Galați	Core	84	100
4	Modernizare și dezvoltare Port Brăila	Brăila	Compr.	84	100
5	Modernizare și dezvoltare Port Cernavodă	Cernavodă	Core	84	100
6	Modernizare și dezvoltare Port Călărași	Călărași	Compr.	84	100
7	Modernizare și dezvoltare Port Oltenița	Oltenița	Compr.	84	100
8	Modernizare și dezvoltare Port Giurgiu	Giurgiu	Core	84	100
9	Modernizare și dezvoltare Port Corabia	Corabia	Compr.	84	100
10	Modernizare și dezvoltare Port Calafat	Calafat	Core	84	100
11	Modernizare și dezvoltare Port Drobeta T. Severin	Drobeta T. Severin	Core	84	100
12	Modernizare și dezvoltare Port Orșova	Orșova	Compr.	84	100
13	Modernizare și dezvoltare Port Moldova Veche	Moldova Veche	Compr.	84	100
14	Modernizare și dezvoltare Port Mahmudia	Mahmudia	Compr.	42	50
15	Modernizare și dezvoltare Port Chilia Veche	Chilia Veche	Alte	42	50

16	Modernizare și dezvoltare Port Isaccea	Isaccea	Alte	42	50
17	Modernizare și dezvoltare Port Măcin-Turcoaia	Macin, Turcoaia	Alte	42	50
18	Modernizare și dezvoltare Port Hârșova	Hârșova	Alte	42	50
19	Modernizare și dezvoltare Port Fetești	Fetești	Alte	42	50
20	Modernizare și dezvoltare Port Medgidia	Medgidia	Compr.	42	50
21	Modernizare și dezvoltare Port Basarabi(Murfatlar)	Basarabi (Murfatlar)	Compr.	42	50
22	Modernizare și dezvoltare Port Ovidiu	Ovidiu	Compr.	42	50
23	Modernizare și dezvoltare Port Luminița	Luminița	Alte	42	50
24	Modernizare și dezvoltare Port Zimnicea	Zimnicea	Alte	42	50
25	Modernizare și dezvoltare Port Turnu Măgurele	Turnu Măgurele	Alte	42	50
26	Modernizare și dezvoltare Port Bechet	Bechet	Alte	42	50
27	Proiecte de siguranță, securitate și implementare facilități pentru combustibili alternativi în porturile fluviale	Toate	Toate	84	100
Total				1723	2050

Legendă

Proiecte cu grad scăzut de certitudine strategice, urmând a fi confirmate de Strategia pentru Dezvoltarea Transporturilor Navale.

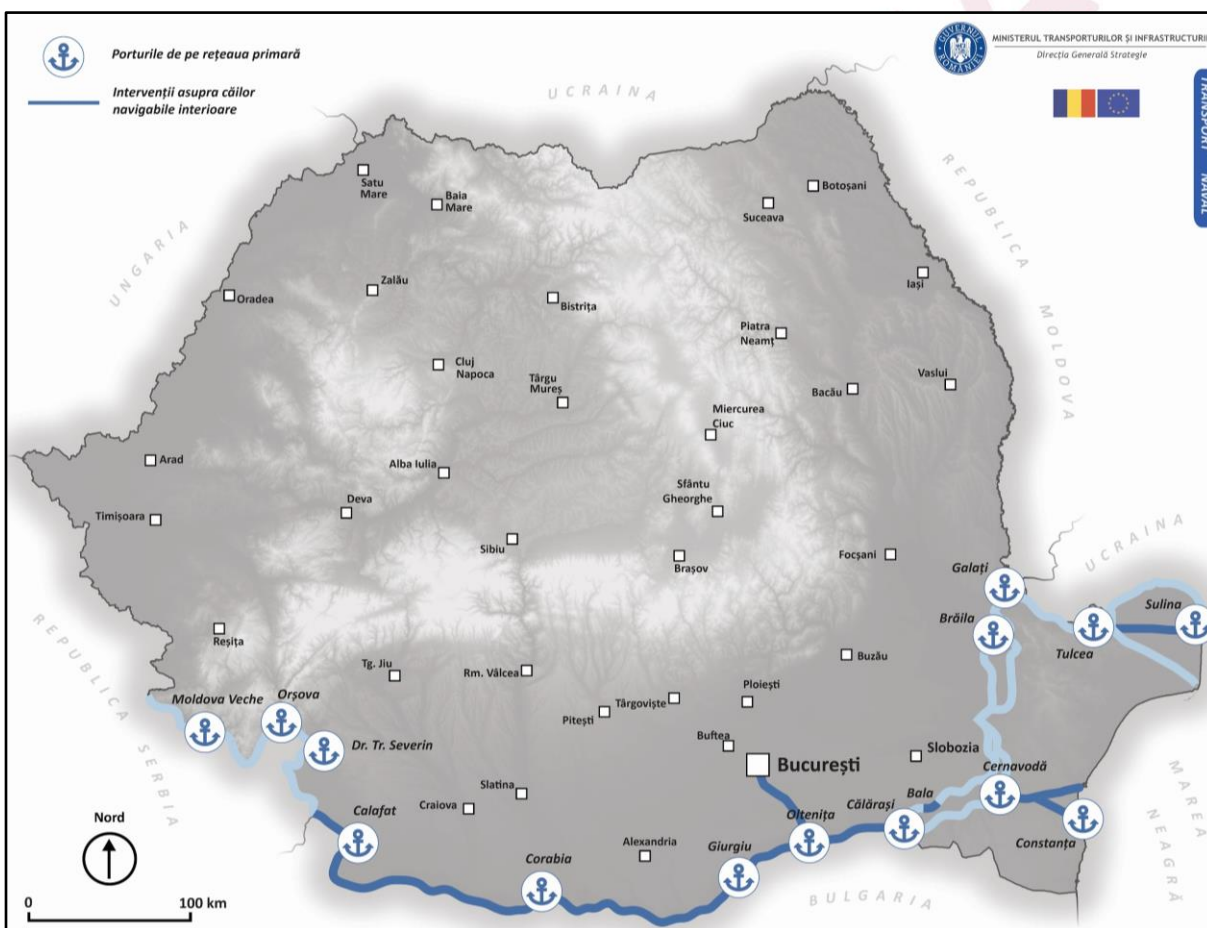


Figura 2.4.6. Harta intervențiilor propuse pentru căile navigabile interioare și porturile de rețeaua primară

Considerații de guvernare sectorială

Măsurile investiționale în asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre și canalele sale, respectiv pentru dezvoltarea porturilor maritime și interioare aflate pe rețeaua primară și secundară trebuie completate cu măsurile de asigurare a unei guvernări corespunzătoare și modificări ale legislației pentru a facilita alocarea fondurilor publice în contextul legislației europene privind ajutorul de stat. De aceea, odată cu acordarea finanțării pentru porturile interioare situate pe rețeaua primară, se solicită ca la nivelul anului 2030 să nu existe un volum de mărfuri operat mai mic de 1 milion tone marfă/an, iar pentru porturile de pe rețeaua secundară un volum de mărfuri mai mic de 500 mii tone pe an. Portul Constanța va trebui să își crească de 4 ori volumul mărfurilor procesate (comparativ cu anul 2019) ajungând la 200 milioane tone marfă operate în anul 2030.

Pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre, se va alocă anual un buget pentru dragaj de exploatare și alte măsuri pentru navigația în bune condiții de minim 1.800.000 conform MPGT (beneficiar AFDJ). De asemenea, România, prin instituțiile diplomatice, va urmări ca Bulgaria să asigure anual un buget anual de minim 1.7 mil.EUR pentru IAPPD Ruse pentru dragarea sectorului de Dunăre aflat în responsabilitatea statului bulgar.

În concordanță cu concluziile Strategiei de dezvoltare a Transporturilor Navale, porturile care nu se regăsesc în lista de investiții prezentată mai sus vor fi transferate către autoritățile locale pentru a fi reconvertite în porturi pentru alte activități (turistice/de agrement) sau desființate. Pentru stabilitate strategică, activitățile de operare de mărfuri de amploare mare se vor realiza prin porturi administrate central la nivelul celor două companii coordonate de MTI (CN APDF Giurgiu și CN APDM Galați). Transportul de pasageri se va derula prin terminale operate de sau în parteneriat cu autoritățile locale.

Autoritățile portuare sunt încurajate să dezvolte scheme de ajutor de stat pentru susținerea serviciilor de tip RO-RO în special pe relațiile la Marea Neagră.

Măsuri privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH

În scopul punerii în practică a obiectivelor politicii europene privind neutralitatea climatică cuprinse în *Pactul Ecologic European*, respectiv în cadrul *Strategiei UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă*, precum și a acțiunilor propuse în cadrul pachetului *Fit for 55* este necesar stabilirea unor măsuri la nivel național. Strategia pentru Dezvoltarea Transporturilor Navale va urmări dezvoltarea acestor măsuri.

Cu toate acestea, până la finalizarea Strategiei menționate mai sus este necesar să fie setate anumite ținte pentru promovarea utilizării combustibililor alternativi, în particular în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii combustibililor alternativi.

Astfel, fiecare port de pe rețeaua primară și secundară va implementa până la data de 1 ianuarie 2030 facilități pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a navelor la cheu.

Portul Constanța se va asigura că până la data de 1 Ianuarie 2030 are implementate facilitățile de asigurare a energiei electrice la cheu pentru minim 90% din traficul de nave de containere RO-RO și de pasageri cu tonaj brut mai mare de 5 mii.

Porturile dunărene din rețeaua primară situate pe rețeaua TEN-T Core vor implementa până la data de 1 Ianuarie 2025 cel puțin o instalație pentru alimentarea cu energie electrică la cheu.

Porturile dunărene din rețeaua primară situate pe rețeaua TEN-T Comprehensive vor implementa până la data de 1 Ianuarie 2030 cel puțin o instalație pentru alimentarea cu energie electrică la cheu.

Portul Constanța va asigura până la data de 1 Ianuarie 2025 implementarea unor puncte de alimentare cu LNG dimensionate conform nevoilor și prognozelor operatorilor navelor maritime.

Sumele prevăzute în prezentul capitol pentru modernizarea și dezvoltarea porturilor de pe rețeaua primară și secundară includ și finanțarea facilităților pentru combustibili alternativi. Având în vedere importanța modernizării sistemelor de propulsie a navelor maritime și fluviale pentru utilizarea combustibililor alternativi, MTI va urmări promovarea în cadrul aplicațiilor de finanțare din cadrul Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) proiectele aferente acestui tip de activitate.

În funcție de concluziile *Strategiei de Dezvoltare a Transporturilor Navale* autoritățile române vor elabora, scheme de finanțare pentru susținerea efortului de ecologizare a flotei de nave utilizate în special în transportul pe apele interioare de către operatorii naționali.

2.5. MODURI DE TRANSPORT: AERIAN

Descrierea situației curente

În România, conform Publicației de Informare Aeronautică (AIP) există 27 de aerodromuri și 6 heliporturi operaționale. Dintre acestea, 9 sunt aerodromuri (aeroporturi) internaționale principale, 7 sunt aerodromuri (aeroporturi) internaționale secundare și 11 aerodromuri naționale și 6 heliporturi naționale.

Aeroporturile operaționale sunt (de la Est la Vest): Constanța, Tulcea, Iași, Bacău, Suceava, București - Băneasa, București - Henri Coandă, Tg. Mureș, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara. Aerodromurile naționale sunt (de la Est la Vest): Tuzla, Grădiștea, Ploiești, Clinceni, Brașov, Pitești, Bistrița, Cisnădie, Deva, Caransebeș, Arad CBS (figura 2.5.1).

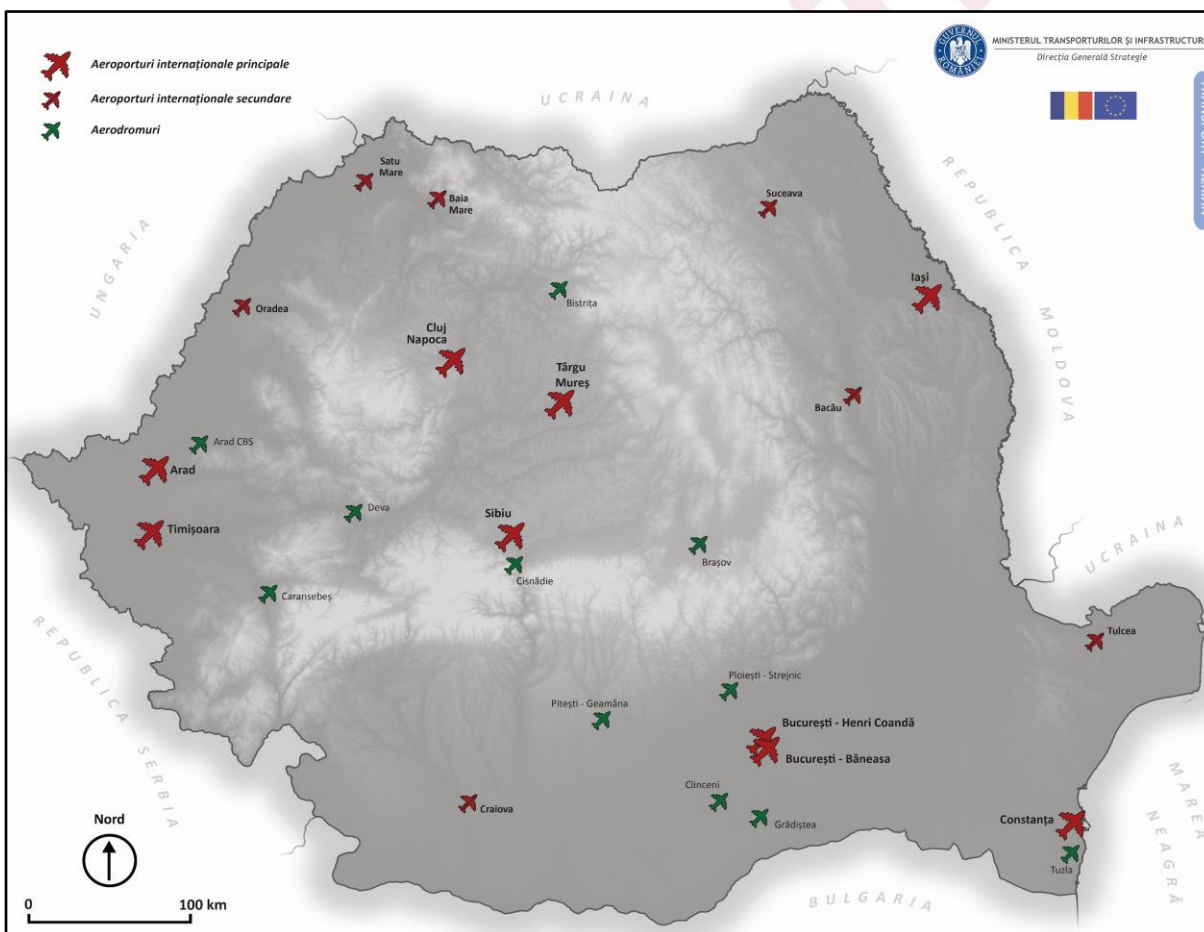


Figura 2.5.1. Aeroporturile și aerodromurile operaționale ale României conform AIP

Luând în considerare situația existentă și prognozele la nivelul anului 2015, Master Planul General de Transport a structurat rețeaua de aeroporturi a României în aeroporturi hub internațional, aeroporturi internaționale, aeroporturi regionale, aeroporturi mici regionale și aerodromuri (figura 2.5.2).

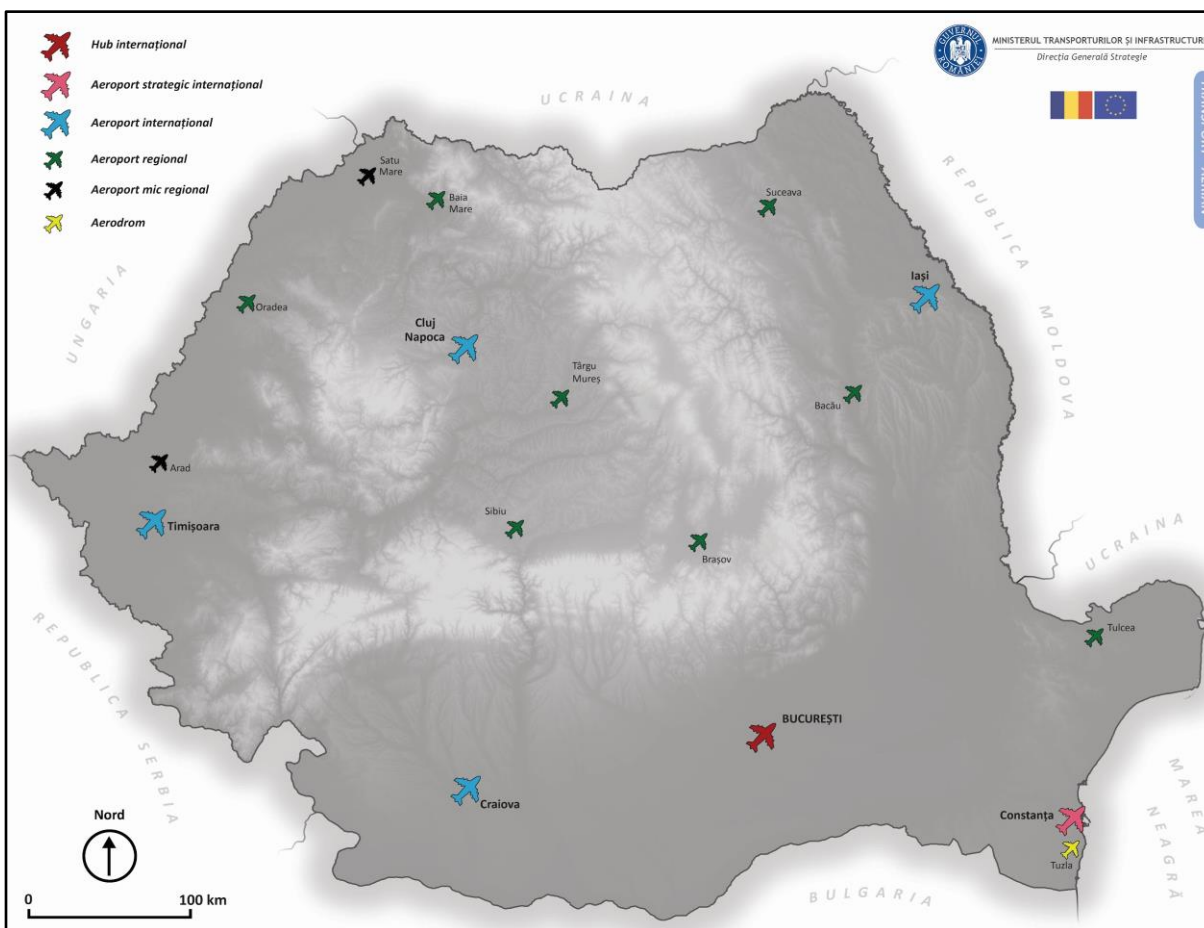


Figura 2.5.2. Harta rețelei de aeroporturi a României conform MPGT

În tabelul 2.5.1 este prezentată prognoza de trafic pentru anul 2019 estimată în MPGT comparativ cu cifrele de trafic efectiv realizate în anul 2019.

Tabelul 2.5.1. Prognoza de trafic din MPGT pentru anul 2019 comparată cu cifrele de trafic din 2019

Nr.crt.	Aeroport	Prognoză 2019	Realizat 2019	Diferențe
1	București	10 549 429	14 729 890	+4 180 461
2	Timișoara	931 056	1 597 657	+666 601
3	Constanța	37 425	130 244	+92 819
4	Cluj-Napoca	1 492 449	2 924 460	+1 432 011
5	Sibiu	273 088	731 817	+458 729
6	Oradea	45 859	95 985	+50 126
7	Târgu Mureș	434 213	178 953	-255 260
8	Arad	35 254	18 888	-16 366
9	Iași	345 951	1 313 921	+967 970
10	Baia Mare	25 761	40 925	+15 164

11	Satu Mare	15 940	84 172	+68 232
12	Suceava	25 162	430 123	+404 961
13	Bacău	395 831	468 455	+72 624
14	Craiova	176 401	514 544	+338 143
15	Tulcea	1 415	99	-1 316
16	Tuzla	26 462	11 281	-15 181
	TOTAL	14.811.696	23.271.414	+8.459.718

După cum se poate observa, prognozele de trafic nu au fost confirmate de realitate, evoluția traficului fiind mult mai dinamică. Per total, prognoza a fost depășită cu peste 50%. Se poate observa evoluția foarte bună a aeroporturilor: București, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași, Suceava și Craiova. De asemenea, evoluții bune față de prognoză au înregistrat și aeroporturile Satu Mare, Bacău, Oradea și Constanța.

De altfel, MPGT a identificat volatilitatea volumului de pasageri procesat de aeroporturi, acesta fiind foarte dependent de alegerile făcute de operatorii de transport aerian. MPGT a presupus că operatorii de transport aerian își vor menține stabile preferințele aeroporturilor de pe care vor opera. În practică însă, decizia de a muta o bază de operațiuni sau de a deschide sau închide rute de transport este mai puțin predictibilă, de aceea este necesar ca, în cazul transportului aerian, prognoza de trafic să fie refăcută la intervale dese (2-3 ani).

De altfel, la momentul elaborării acestui Plan, sectorul transportului aerian de pasageri a fost foarte afectat de criza COVID-19, volumul total de trafic scăzând cu peste 60% la nivelul anului 2020 față de anul 2019.

Cu toate acestea, MPGT a prevăzut, pentru toate aeroporturile din România, investiții în dezvoltarea capacității de operare, independent de prognozele de trafic, pornind de la argumentul că aeroporturile din România nu au plecat de la un nivel egal în momentul schimbării paradigmei economice în anii 90, iar în funcție de situația specifică a fiecărui aeroport și împrejurările existente, anumite aeroporturi au beneficiat de investiții și recondiționări într-o proporție mai mare. MPGT a propus corectarea acestei situații prin oferirea oportunității de a aduce infrastructura de bază la parametri optimi pentru toate aeroporturile din rețeaua de aeroporturi a României. Prin urmare, în contextul crizei provocate de Pandemia COVID-19, în prezentul Plan Investițional propunem abordarea *"Build Back Better"* pentru aeroporturile și aerodromurile din România.

De precizat că aeroporturile din România sunt în concurență unele cu celelalte, dar și cu aeroporturile statelor vecine. Din analiza ariei de captare a aeroporturilor din România și a țărilor vecine (figura 2.5.3) se observă faptul că, aproape în integralitate, teritoriul României este acoperit de arii de captare și în unele situații mai mult de trei aeroporturi au arii de captare suprapuse. Această situație va deveni și mai evidentă la momentul realizării rețelelor primare de infrastructură rutieră și feroviară ale României. În figura 2.5.3 sunt reprezentate aeroporturile României și aeroporturile vecine României împreună cu ariile de captare calculate pe o rază de 100 km – zbor direct.

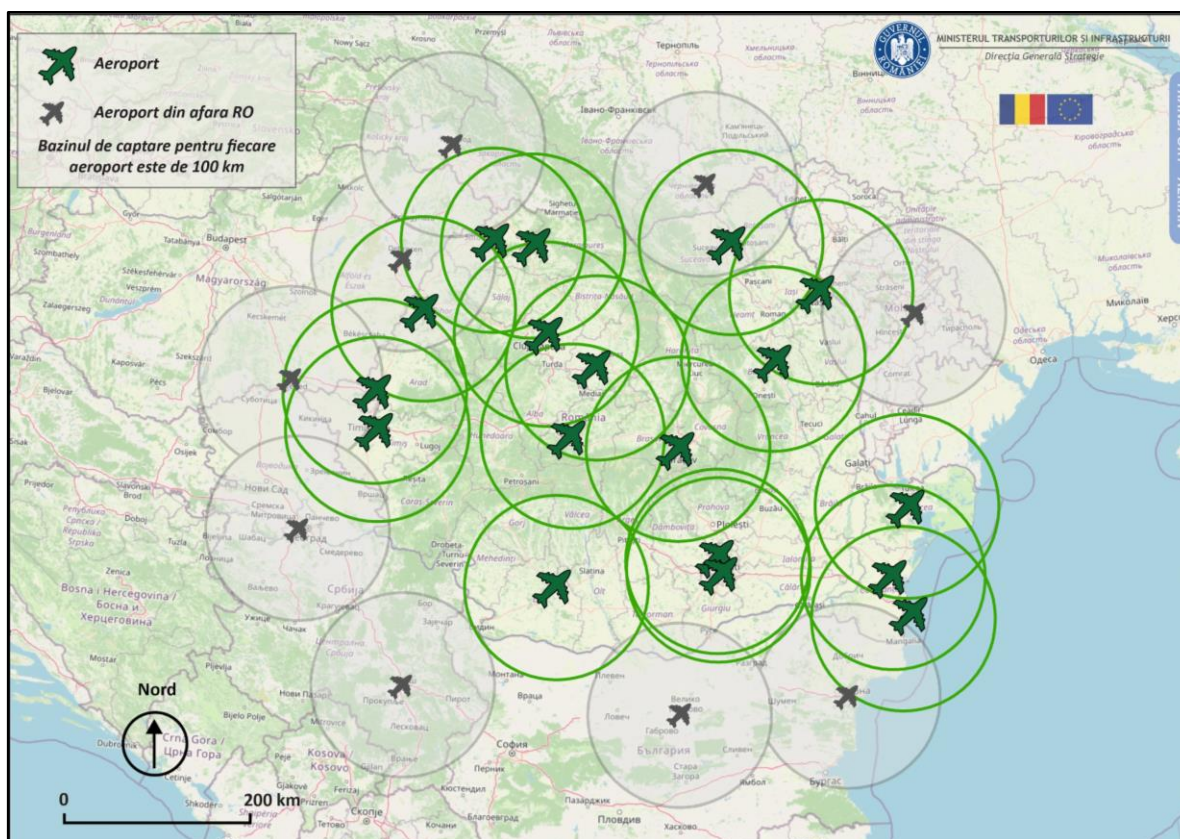


Figura 2.5.3. Harta rețelei de aeroporturi a României

Dezvoltarea transportului aerian

Având în vedere analiza de mai sus, prezentul Plan investițional va avea în vedere următoarea viziune strategică pentru intervalul 2020-2030, în corelare cu MPGT:

1. Structurarea aeroporturilor și aerodromurilor din România într-o rețea primară, o rețea secundară și o rețea terțiară, în scopul acoperirii transportului cargo și de pasageri derulat de operatorii comerciali de transport aerian, a transportului aerian de tip aviație generală, precum și a zborurilor școală și de agrement.

Rețeaua primară se constituie din aeroporturile hub internațional, aeroporturile internaționale și strategic internaționale, conform MPGT (figura 2.5.4).

Rețeaua primară va cuprinde (de la Est la Vest) aeroporturile: *Constanța, Iași, București, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara*.

Aeroporturile rețelei primare au obligația dezvoltării de terminale cargo și de pasageri pentru trafic național și internațional. Aeroporturile rețelei primare vor trebui să aibă legături intermodale la nivel de infrastructură feroviară și rutieră.

Rețeaua secundară se constituie din aeroporturile regionale și mici regionale, conform MPGT. Astfel, de la Est la Vest aeroporturile rețelei secundare sunt: *Tuzla, Tulcea, Bacău, Suceava, Brașov, Tg. Mureș, Baia Mare, Satu Mare, Oradea și Arad* (figura 2.5.4).

Aeroporturile rețelei secundare au obligația dezvoltării de terminale de pasageri pentru trafic național și internațional și pot dezvolta terminale cargo dacă analizele socio-economice susțin viabilitatea economică a acestora. Aeroporturile rețelei secundare trebuie să aibă asigurată o legătură intermodală.

Rețeaua terțiară se compune din aerodromuri naționale dedicate traficului național, îndeosebi în cadrul activităților de aviație generală, școală, sport și de agrement, care nu sunt situate în localitățile deservite de un aeroport operațional. Aceasta va fi compusă (de la Est la Vest) din aerodromurile: *Ploiești - Strejnic, Pitești, Bistrița, Deva și Caransebeș*.

Aerodromurile certificate și neincluse în clasificarea menționată mai sus vor fi luate în considerare în cadrul acțiunilor strategice ce vizează creșterea siguranței/securității aeriene, precum și în acțiunile strategice privind creșterea sustenabilității transportului aerian.

2. Realizarea investițiilor în dezvoltarea capacității de oferire a serviciilor aeroportuare

Proiectele prevăzute a se realiza în perioada 2020 – 2030 pleacă de la scenariul de referință care cuprinde proiectele deja angajate spre finanțare în perioada 2014-2020 și pe care le prezentăm în tabelul 2.5.2.

Tabelul 2.5.2. Scenariul de referință - Proiecte din perioada 2014 - 2020

Nr. crt	Denumire proiect (scenariul de referință)	Aeroport	Rețea TEN-T	Rețea națională	Cost total (mil. EUR fără TVA)	Cost total (mil. EUR cu TVA)
1.	Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea - asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea	Tulcea	Comprehensive	Secundară	12.4	14.7
2.	Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare - aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul internațional George Enescu	Bacău	Comprehensive	Secundară	33.9	40.4
3.	Echipamente de detecție explozibil standard 3 de tip CTX	Cluj-Napoca	Comprehensive	Primară	4.1	4.9
4.	Construire terminal sosiri curse externe pasageri	Timișoara	Core	Primară	5.3	6.3
5.	Cale de rulare paralelă cu pista	Cluj-Napoca	Comprehensive	Primară	11.2	13.3
6.	Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău	Bacău	Comprehensive	Secundară	14.7	17.5
7.	Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași	Iași	Comprehensive	Primară	10.5	12.5
8.	Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea - siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea	Tulcea	Comprehensive	Secundară	2.1	2.5
9.	Echipamente scanare bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor	Cluj-Napoca	Comprehensive	Primară	3.4	4.0
10.	Achiziție Autospeciale PSI și Sistem Integrat Pentru Controlul de Securitate	Timișoara	Core	Primară	8.4	10.0
11.	Creșterea siguranței, și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca	Cluj-Napoca	Comprehensive	Primară	9.7	11.5
12.	Dotare cu echipamente și facilități PSI și urgențe medicale	Cluj-Napoca	Comprehensive	Primară	1.3	1.6
13.	Upgrade balizaj luminos PDA Dir. 36	Constanța	Comprehensive	Primară	5.9	7.0

14.	Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare La Aeroport Tuzla	Tuzla	Alte	Secundară	14.5	17.3
15.	Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe aeroportul Internațional Sibiu - activități non-economice	Sibiu	Comprehensive	Primară	6.6	7.8
16.	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova	Craiova	Comprehensive	Primară	13.3	15.8
17.	Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău	Bacău	Comprehensive	Secundară	12.1	14.4
18.	Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța	Constanța	Comprehensive	Primară	2.5	3.0
19.	Terminal plecări curse externe	Timișoara	Core	Principală	32.3	38.4
20.	Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu	Constanța	Comprehensive	Primară	13.1	15.6
21.	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară	Satu Mare	Comprehensive	Secundară	6.6	7.9
22.	Achiziționare sistem echipamente securitate aeroportuară și realizare remiză PSI	Tg. Mureș	Comprehensive	Secundară	3.5	4.2
23.	Sistem de supraveghere video, control acces la SN Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța SA	Constanța	Comprehensive	Primară	4.1	4.9
24.	Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea	Oradea	Core	Secundară	13.6	16.2
25.	Conformare Aeroport Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare”, activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții	Arad	Comprehensive	Secundară	4.1	4.9
26.	Modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport	Tg Mures	Comprehensive	Secundară	22.5	26.8
27.	Modernizare și extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de îmbarcare - debarcare și a căii de rulare alfa (construite în 1973). Construire platformă dedicată activităților de degivrare/antigivrare aeronave	Tulcea	Comprehensive	Secundară	25.2	30.0
28.	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova	Craiova	Comprehensive	Primară	83.9	99.9
	TOTAL				380.9	453.3

Pentru perioada 2020-2030, proiectele prevăzute pentru aeroporturile situate pe rețeaua primară, secundară și terțiară, precum și acțiuni strategice generale în domeniul siguranței, securității și creșterii sustenabilității aerodromurilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

De subliniat faptul că, în completarea prezentului Plan, se va derula un studiu detaliat pe fiecare aeroport/aerodrom pentru identificarea obiectivelor individuale de investiții în interiorul fiecărui aeroport/aerodrom. Până la realizarea acestui studiu, la aeroporturile rețelei primare unde nu s-au lansat proiecte de pregătire a investițiilor individuale, volumul investițiilor pentru următorii 10 ani se va limita la 200 mil.EUR cu TVA, cu excepția aeroporturilor din București pentru care nu există limită. Pentru aeroporturile de pe rețeaua secundară aflate în aceeași situație, volumul investițiilor se va limita la 100 mil.EUR cu TVA. Pentru aerodromurile din rețeaua terțiară, volumul investițiilor este limitat la 25 mil.EUR cu TVA.

Tabelul 2.5.3. Listă de proiecte – sector aerian

Nr. crt.	Denumire proiect (proiecte noi)	Beneficiar	Rețea TEN-T	Rețea națională	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
1	Studiu pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a transporturilor aeriene în România	MTI - DTA	Toate	Toate	4.2	5.0

Nr. crt.	Denumire proiect (proiecte noi)	Aeroport	Rețea TEN-T	Rețea națională	Cost total (mil.EUR fără TVA)	Cost total (mil.EUR cu TVA)
1	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Constanța	Comprehensiv	Primară	168.1	200.0
2	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Timișoara	Core	Primară	168.1	200.0
3	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Craiova	Comprehensiv	Primară	168.1	200.0
4.	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Cluj Napoca	Comprehensiv	Primară	168.1	200.0
5	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Sibiu	Comprehensiv	Primară	168.1	200.0
6	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Iași	Compr.	Primară	168.1	200.0
7	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	București	Core	Primară	840.3	1000.0
TOTAL REȚEA PRIMARĂ					1848.7	2200.0
1	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Arad	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
2	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Bacău	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
3	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Baia Mare	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
4	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Brașov	Alte	Secundară	84.0	100.0
5	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Oradea	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
6	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Satu Mare	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
7	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Suceava	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
8	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Tg.Mureș	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
9	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Tulcea	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
10	Proiecte de dezvoltare, siguranță, securitate aeroportuară și neutralitate climatică	Tuzla	Comprehensiv	Secundară	84.0	100.0
TOTAL REȚEA SECUNDARĂ					840.3	1000.0
1	Investiții în dezvoltarea, creșterea siguranței, securității și neutralității climatice a aerodromului național	Ploiești - Strejnic	Alte	Alte	21.0	25.0
2	Investiții în dezvoltarea, creșterea siguranței, securității și neutralității climatice a aerodromului național	Pitești - Geamăna	Alte	Alte	21.0	25.0
3	Investiții în dezvoltarea, creșterea siguranței, securității și neutralității climatice a aerodromului național	Bistrița	Alte	Alte	21.0	25.0
4	Investiții în dezvoltarea, creșterea siguranței, securității și neutralității climatice a aerodromului național	Deva	Alte	Alte	21.0	25.0
5.	Investiții în dezvoltarea, creșterea siguranței, securității și neutralității climatice a aerodromului național	Caransebeș	Alte	Alte	21.0	25.0
TOTAL REȚEA TERȚIARĂ					105.0	125.0
1	Creșterea siguranței, securității și neutralității climatice la aerodromurile din afara rețelelor primare, secundare și terțiare	Multi - beneficiar	Alte	Alte	8.4	10.0
TOTAL GENERAL 2020-2030					2794.1	3325

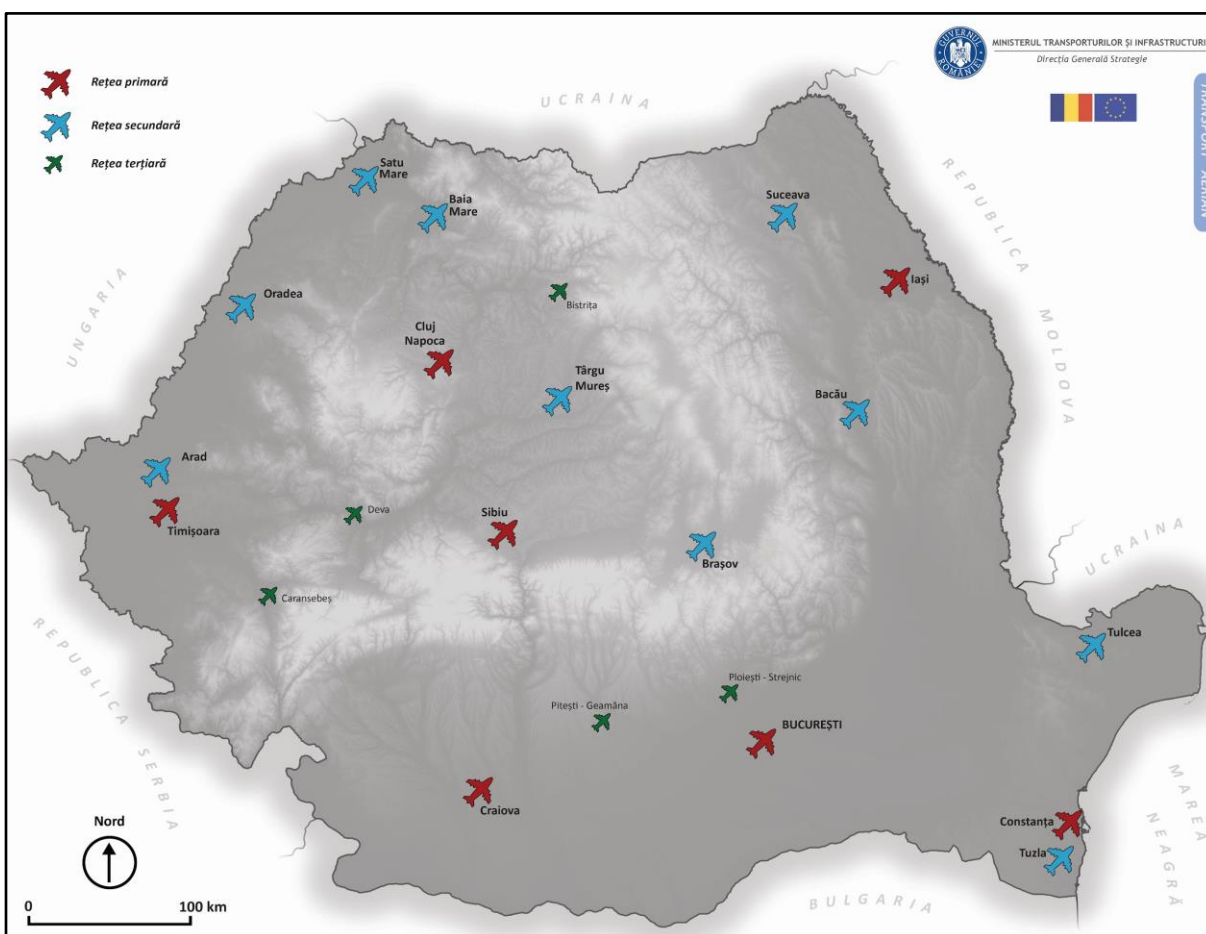


Figura 2.5.4. Harta integrată a aeroporturilor și aerodromurilor vizate de prezentul Plan investițional

3. Elaborarea schemelor de ajutor de stat pentru dezvoltarea transportului aerian de pasageri derulat de operatorii aerieni români, precum și pentru revenirea sectorului aerian după criza provocată de pandemia COVID-19.

Analiza evoluției traficului aerian de pasageri a arătat faptul că o cooperare strânsă între operatorii și managerii infrastructurii aeroportuare este în măsură să schimbe radical evoluția traficului în anumite locații. Prezentul Plan prevede realizarea unei scheme de finanțare a operatorilor aerieni români pentru deschiderea rutelor de transport pe rețeaua primară a aeroporturilor, precum și pe rețeaua secundară, în locațiile unde fezabilitatea unei astfel de linii operaționale este justificată.

Bugetul exact al schemei de finanțare va fi determinat printr-o analiză de piață în conformitate cu reglementările de ajutor de stat însă, pentru scopul determinării efortului național necesar pentru susținerea acestor investiții, în cadrul acestui plan a fost estimată o valoare a schemei de finanțare de 500 mil.EUR.

4. Continuarea susținerii, prin fondurile europene, a modernizării sistemului de gestiune a traficului aerian prin implementarea politicii europene construită în jurul conceptului „Single European Sky”

5. Asigurarea măsurilor de creștere a neutralității climatice a aeroporturilor și aerodromurilor din România prin implementarea măsurilor de „înverzire” a echipamentelor, vehiculelor și infrastructurii aeroportuare.

6. Depunerea eforturilor de către toate instituțiile statului pentru transformarea Aeroportului București într-un hub internațional care să permită zboruri de lung parcurs către zona centrală și de vest a Americii de Nord și Americii Centrale, Africa și Asia (inclusiv către Orientul Îndepărtat). Aceasta presupune creșterea capacității operatorului național de a realiza operarea acestor destinații și întărirea substanțială a guvernantei companiei aeriene pentru a fi competitivă în mediu internațional. Totodată, pentru atingerea acestui deziderat, în zona București nu se va dezvolta nici un alt aeroport internațional și majoritatea eforturilor investiționale se vor orienta către Aeroportul București – Henri Coandă. Aeroportul București Băneasa va fi dezvoltat în armonie cu presiunea antropică a orașului București, pe conceptul de „City Airport”, asigurând complementaritatea cu Aeroportul București - Henri Coandă.

Măsuri privind promovarea combustibililor alternativi și aplicarea principiului DNSH

Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor *Pactului Ecologic European*, referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea unei piețe comune a UE, este necesară asigurarea unei conectivități complete și a unui parcurs neîntrerupt al utilizatorilor de-a lungul rețelelor trans-europene de transport pentru vehiculele, navele și aeronavele cu emisii zero sau emisii scăzute.

Pentru acest scop, este important să se asigure disponibilitatea unei rețele dense și uniform distribuite de combustibili alternativi în UE și în România. Utilizatorii aeronavelor care funcționează pe bază de combustibili alternativi trebuie să se deplaseze pe teritoriul UE și al României cu ușurință și în acest sens, aerodromurile din România trebuie să asigure facilități aferente combustibililor alternativi care să fie interoperabile și ușor de folosit.

Cadrul legislativ comunitar care va promova implementarea și utilizarea combustibililor alternativi este în faza de aprobare prin Inițiativa ReFuelEU.

Prin urmare, aerodromurile din România, situate pe rețeaua primară și secundară, vor fi obligate să furnizeze energie electrică către aeronavele staționare astfel:

- (a) Până la 1 Ianuarie 2025, la toate porțile utilizate pentru operațiuni aeriene comerciale
- (b) Până la 1 Ianuarie 2030, la toate pozițiile de staționare utilizate pentru operațiuni aeriene comerciale.

De asemenea, aerodromurile din România situate pe rețeaua primară și secundară se vor asigura că, până cel mai târziu la data de 1 Ianuarie 2030, energia electrică furnizată conform celor două puncte de mai sus va proveni dintr-o sursă regenerabilă.

Aerodromurile din România vor lua, de asemenea, toate măsurile necesare pentru ca flotele de vehicule utilizate în activitățile aferente serviciilor aeroportuare să fie compuse din vehicule nepoluante.

2.6. MOD DE TRANSPORT: INTERMODAL

Intermodalitatea este, prin definiție, un concept multi-dimensional, reprezentând conexiunea între infrastructurile de transport, procesele logistice și relaționările instituționale caracteristice mai multor moduri de transport. Pe scurt, intermodalitatea presupune interacțiunea mai multor moduri de transport pentru a asigura optimizarea lanțului logistic de mărfuri și de pasageri.

La nivelul transporturilor de mărfuri în România, mișcarea preponderentă a bunurilor este concentrată, într-o manieră considerabilă, de-a lungul coridorului TEN-T Rin-Dunăre (Coridorul Pan-European IV), conectând Constanța de București și de punctul de intrare nord-vestic al țării, Arad. În anii anteriori, traficul intermodal domestic a reprezentat 60% din totalul volumelor de transport intermodal, având ca principal nod de intrare/ieșire, portul Constanța. Restul de 40%, aferent traficului internațional, condensează legăturile principale din nodurile de trafic Arad și Ploiești.

Din punctul de vedere al infrastructurii, România are o rețea feroviară cuprinzătoare, cu o densitate considerabilă a rețelei feroviare raportată la milionul de locuitori (peste media europeană de circa 430 km/mil de locuitori), care ar putea deservi și conecta cu succes o serie de terminale/noduri majore intermodale. Deși extinsă, rețeaua feroviară se află într-un proces continuu de modernizare și eficientizare, inițiate susținute și prin Planul Investițional actual, care țintește realizarea unor investiții pe coridoarele relevante, atât la nivel internațional, cât și la nivel național/regional.

Din perspectiva terminalelor intermodale, numărul acestora este relativ limitat, cele cu administrare publică având în general funcțiuni limitate, configurații ineficiente și localizare necorelată cu nevoile pieței. Pe de altă parte, în ultimii 20 de ani, inițiativa exclusiv privată a condus la apariția terminalelor private, aliniate cu nevoile comerciale ale pieței și cu îmbunătățirile de la nivelul infrastructurii Coridorului Rin-Dunăre. La o primă analiză a acestor terminale intermodale private, s-a putut constata că s-au dezvoltat inițial ca inițiative la scară investițională mică, reținând totuși, încă de la început, o rezervă de capacitate pentru a satisface o cerere potențială crescătoare.

Transportul intermodal din România rămâne, totuși, la un nivel incipient de dezvoltare, plasat între o intrare majoră pentru containere la Constanța și un nod intermodal funcțional la Arad, ca principale puncte strategice ale acestui mod de transport mărfuri.

Pentru a-și arăta eficiența, aceste terminale intermodale trebuie să faciliteze transferul rapid între modurile de transport (predominant feroviar - rutier) a unităților standardizate de expediere. Mai mult, la nivel local, acestea vor trebui să îndeplinească un rol strategic cheie de catalizator al dezvoltării economice, generând creșterea atractivității regiunii pentru industrie (prin cost redus de transport), precum și creșterea accesului către piețele de transport domestice și internaționale.

În mod evident, rezultă o nevoie de extindere a investițiilor pentru dezvoltarea terminalelor intermodale, relevată de Master Planul General de Transport și susținută prin prezentul Plan Investițional.

Pentru a asigura succesul transportului intermodal, promotorii din sectorul public vor trebui să încurajeze implicarea sectorului privat și să atragă priceperea acestui sector în promovarea, dezvoltarea și administrarea acestor tipuri de investiții intermodale. În mod evident, promotorii investițiilor intermodale vor trebui să definească nivelul de implicare și risc asumat în comparație cu partenerul privat.

Planul investițional își propune să schițeze principalele caracteristici, care să asigure investiții coerente, robuste din perspectiva finanțării și relevante atât pentru piața comercială națională, cât și pentru cea regională. Prioritizarea acestor investiții se bazează pe:

- Aspecte privind poziționarea terminalului intermodal, în raport cu principalii reprezentanți ai pieței economice de la nivel național și regional, dar și în raport cu principalele coridoare și rute de transport de mărfuri internaționale, naționale și regionale, care permit determinarea valorii adăugate a investiției;
- Aspecte privind accesul direct al terminalului la rețeaua adiacentă de coridoare strategice rutiere și feroviare;
- Aspecte privind dimensiunea acestuia corelată cu nevoia pieței, la care să se mențină o rezervă de capacitate pentru a acomoda evoluția potențial crescătoare a cererii pentru serviciile terminalului;
- Aspecte privind maturitatea relațiilor și acordurilor instituționale/de colaborare între părțile interesate ale investiției: promoterul privat, promoterul public - autoritatea locală, reprezentanții sectorului feroviar și ai celui rutier.

Caracteristicile principale menționate mai sus se adresează predominant terminalelor „interioare”, întrucât dezvoltarea terminalelor multimodale în cadrul porturilor maritime și fluviale sunt cuprinse în cadrul subcapitolului adresat transportului naval. Cu toate acestea, dezvoltarea platformelor multimodale sub inițiativă privată este încurajată și în cadrul investițiilor din porturile românești.

CAPITOL 3 – STRATEGIA FINANȚĂRII

Având în vedere importanța infrastructurii de transport pentru dezvoltarea României, este necesară coagularea unui efort național pe perioada 2020-2030 pentru asigurarea resurselor financiare, pentru demararea obiectivelor de investiții necesare implementării atât a proiectelor

de importanță europeană la nivelul rețelei TEN-T Core ce tranzitează teritoriul național, cât și a priorităților naționale referitoare la rutele de interconectare regională.

Cele trei surse de finanțare disponibile pentru realizarea proiectelor de infrastructură sunt:

- Bugetul de stat – reprezentând atât contribuția statului membru la proiectele finanțate cu fonduri externe nerambursabile, cât și contribuția integrală în cazul proiectelor finanțate exclusiv din fonduri naționale;
- Fonduri externe nerambursabile din bugetul Uniunii Europene (POIM/POT, CEF, PNRR);
- Fonduri rambursabile sub forma împrumuturilor de la instituții financiare internaționale sau fonduri private sub forma PPP.

De remarcat faptul că în prezent fondurile externe nerambursabile reprezintă principala sursă de finanțare pentru proiectele majore de infrastructură din România. Acest dezechilibru este cauzat în principal de lipsa unei alocări suficiente pentru investiții în infrastructură de la bugetul de stat precum și din cauza unei rate favorabile de co-finanțare în cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Pentru a evidenția necesarul de finanțare la nivel național, ne raportăm la proiectele deja angajate din fonduri externe nerambursabile la care se adaugă proiectele necesare pentru închiderea rețelei TEN-T Core. La nivelul anului 2021, sunt contractate un număr de 148 de proiecte însumând 7.8 mld.EUR din fonduri externe nerambursabile la care se adaugă o contribuție națională de 4.3 mld.EUR. Alocarea financiară europeană pentru exercițiul 2014-2020 constă în 4.5 mld.EUR la care se adaugă 0.79 mld.EUR contribuție națională.

După cum se poate observa, alocarea UE a fost depășită prin proiectele aprobate, însă, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 *privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*, conform căreia Autoritățile de Management sunt autorizate să încheie/emită contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro, la nivel de program, alocarea poate fi depășită cu 200%. Măsura supracontractării cu 200% a alocării pentru sectorul de transport din cadrul POIM 2014-2020 a reprezentat un ajutor semnificativ întrucât a introdus în sistemul de management următoarele avantaje:

- a permis lansarea licitațiilor pentru majoritatea priorităților europene și naționale;
- a permis realizarea plăților și rambursarea de la Comisia Europeană a cheltuielilor pentru toate proiectele eligibile și mature;
- a asigurat un grad de absorbție satisfăcător în marja mediei europene;
- a permis ca blocajele din cadrul procesului de achiziție publică să nu afecteze într-o măsură foarte mare procesul de absorbție a fondurilor europene;
- a permis decidenților guvernamentali să includă la finanțare priorități politice de interes național;
- a permis pregătirea din timp a proiectelor de infrastructură de transport pentru următoarea perioadă de programare.

Ținând cont de impactul pozitiv al mecanismului de supracontractare în perioada precedentă de programare se impune ca această abordare să fie continuată și în perioada acoperită de prezentul Plan investițional.

Necesarul de finanțare și alocările orientative

Necesarul total de finanțare pentru toate modurile de transport – rutier, feroviar, metrou, aerian, naval pentru finalizarea atât a rețelei primare cât și a celei secundare precum și a investițiilor conexe, sintetizate pe baza celor prezentate în cadrul Capitolului 2, sunt prezentate în tabelul 3.1. (excluzând scenariul de referință)

Tabelul 3.1. Necesarul total de finanțare pentru toate modurile de transport

Nr. Crt.	Mod de transport	Valoare proiecte noi 2020-2030	Defalcare investiții (mld.EUR)
1	Rutier	34.19	28.25 – rețeaua primară 5.45 – rețeaua secundară 0.49 – siguranța rutieră
2	Feroviar	20.63	16.36 – rețeaua primară 3.27 – rețeaua secundară 1 – material rulant
3	Metrou	10,7	8.3 – București, magistrale noi 0,9 - București, extensii magistrale și reabilitări stații 1,5 - Cluj-Napoca
4	Naval	4.46	1.08 – Dunăre și canale navigabile 1.33 – porturi maritime 2.05 – porturi fluviale
5	Aerian	2.79	1,84 – rețeaua primară 0,85 – rețeaua secundară 0.1 – rețeaua terțiară
Total		72.77	

Pentru noul exercițiu financiar 2021-2027 se estimează o valoare totală a fondurilor externe nerambursabile de 4.72 mld.EUR cu o rată de co-finanțare națională reprezentând o creștere semnificativă față de perioada 2014-2020 și angajând astfel bugetul de stat la o sumă dedicată investițiilor în infrastructura de transport de 4.18 mld.EUR. La această sumă se adaugă 1.29 mld.EUR prin Connecting Europe Facility (CEF).

Tabelul 3.2. Alocări financiare în funcție de perioadele de finanțare

Nr. Crt	Tip finanțare (Mld.EUR)	Alocare UE	Alocare BS	Total
---------	-------------------------	------------	------------	-------

1	POIM 2014-2020	4.50	0.79	5.29
2	CEF 2014-2020	0.86	0.15	1.01
Total 2014-2020		5.36	0.94	6.30
1	POT 2021-2027	4.35	4.87	9.22
2	CEF 2021-2027	1.09	0.20	1.29
3	PNRR 2020-2026	7.62	5.17	12.79
Total 2021-2027		13.06	10.24	23.30

La alocările de fonduri europene pentru perioada 2021-2027 de 5.44 mld.EUR POT+CEF (alocare ce include proiectele fazate) se adaugă *Facilitatea de Recuperare și Reziliență* recent aprobată la nivel European ce include 7.6 mld.EUR fonduri europene privind infrastructura de transport la nivelul României.

Astfel, la un necesar de 72.77 mld.EUR, alocările estimative maxime (inclusiv mecanismul supra-contractării) pentru finanțare europeană sunt de 41,74 mld Euro (din care 13,06 fonduri externe și 28,68 contribuția maximă a bugetului de stat), rezultând un deficit de 31.03 mld.EUR care poate fi acoperit de la bugetul de stat, respectiv prin împrumuturi externe și fonduri private. În concluzie, România va trebui să asigure în următorii 10 ani contribuția financiară aferentă proiectelor cu finanțare europeană la care se adaugă necesarul pentru finalizarea întregii infrastructuri prezentate în acest plan, rezultând un efort financiar reprezentând aproximativ 2% din PIB/an în funcție de progresul fizic și financiar al proiectelor.

Pentru identificarea de surse suplimentare de fonduri, în cadrul PNRR a fost asumată o reformă care include aprobarea unui pachet legislativ necesar pentru implementarea noului sistem de taxare/impozitare conform principiului „poluatorul plătește” și a principiului taxării ecologice include:

- taxare pe baza distanței pentru vehiculele de marfă poluante, de tonaj greu (de tipul camioanelor și alte tipuri de autoutilitare) și
- stabilirea unor programe de stimulare a reînnoirii parcului auto (în special autovehicule mici/autocare/autobuze) prin intermediul unor scheme de casare, corelate cu măsuri de taxare/impozitare la nivel local pentru deținerea în proprietate a celor mai poluante vehicule de pasageri;

În contextul discuțiilor legate de întreținerea infrastructurii, se estimează faptul că potențialul venit suplimentar generat de o astfel de taxare ar fi între 1 și 2 mld.EUR/an în acest mod (estimarea MPGT 1.1 mld.EUR în 2020 / 1.9 mld.EUR în 2030) permițând o împărțire rezonabilă între întreținere și noi investiții. Un astfel de sistem este standard la nivelul UE, fiind deja operațional în Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Portugalia și Belgia. Nivelul inițial estimat pentru România de 0.15 EUR/km) comparat cu Polonia (0.2-0.4 EUR/km) este unul ce ia în calcul specificul industriei de transport naționale. Printre beneficiile secundare se numără un transfer estimat de 10% către infrastructura feroviară ducând la descongestionare, poluare redusă și siguranță crescută. Implementarea unui astfel de sistem trebuie bineînțeles asigurată

într-un mod gradual, pe baza unui studiu de fezabilitate care să analizeze atât financiar cât și tehnic opțiunile posibile.

În tabelul 3.3 sunt prezentate sumele utilizate pentru întreținerea rețelei rutiere în perioada 2018-2021.

Tabelul 3.3. Costul pentru întreținerea rețelei rutiere (2018 - 2021)

Nr. Crt.	Sursa de finanțare	2018 (mil.EUR)	2019 (mil.EUR)	2020 (mil.EUR)	2021 (mil.EUR)
1	Transferuri de la bugetul de stat	59	183	114	155
2	Venituri proprii	118	144	165	156
3	FSUE	0	0	1	1
4	Garanții de bună execuție	0	0	0	2
TOTAL		178	327	280	315

Comparativ, la nivel feroviar situația se prezintă în tabelul 3.4.

Tabelul 3.4. Costul pentru întreținerea rețelei feroviare (2016 - 2020)

Nr. Crt.	Necesar/Alocat	Perioada				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Necesar fonduri pentru activitate întreținere (mil.EUR fără TVA)	127.9	70.1	100.6	141.0	94.7
2	Total Alocat fonduri pentru activitate întreținere (mil.EUR fără TVA)	57.8	37.9	33.5	61.6	32.6

Finanțarea prin PNRR

Proiectele solicitate pentru finanțare din PNRR au fost determinate în funcție de (1) nevoile de investiții în domeniul transporturilor, (2) gradul de maturitate al proiectelor și (3) prioritizarea investițiilor pentru domeniul feroviar și digitalizare în transporturi. Astfel, prin raportare la valoarea totală a fiecărui proiect propus pentru finanțare din PNRR, sumele solicitate din PNRR se prezintă după cum urmează (tabelul 3.5):

- **Feroviar: 3480 mil.EUR.** Pentru proiectele majore de infrastructură a fost estimată o rată de finanțare din PNRR de 77% din valoarea totală a proiectelor;
- **Material Rulant: 416 mil.EUR;**
- **Rutier: 3095 mil.EUR.** Pentru proiectele majore de infrastructură a fost estimată o rată de finanțare din PNRR de 63% din valoarea totală a proiectelor;
- **Metrou: 600 mil.EUR.** Pentru proiectele majore de infrastructură a fost estimată o rată de finanțare din PNRR de 20% din valoarea totală a proiectelor.

Tabelul 3.5. Costul proiectelor finanțate din PNRR

Componenta	Categorie	Sumă solicitată din PNRR (mil.EUR fără TVA)	Cost total investiție (mil.EUR fără TVA)* *diferența va fi asigurată din alte surse de finanțare (buget de stat / împrumuturi externe)
Investiții 1 - Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare;	<i>Modernizări</i>	2303	2993
	<i>Electrificări + Reînnoiri</i>	236	236
	<i>Reînnoiri</i>	276	276
	<i>Quick Wins</i>	452	452
	<i>Centralizări electronice și electrodinamice</i>	213	213
Total infrastructură feroviară		3480	4170
Investiții 2 - Material rulant feroviar	<i>Material rulant ecologic</i>	416	555
Total material rulant		416	555
Investiții 3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră;	<i>Proiecte situate pe rețeaua TEN-T Core (A1, A7, A8) și TEN-T Comprehensive (A3)</i>	2727	4319

	<i>Infrastructura aferentă operaționalizării sistemelor de trafic inteligent</i>	47.9	47.9
	<i>Infrastructura de taxare și control</i>	101.15	101.15
	<i>Investiții în infrastructura existentă pentru siguranța rutieră</i>	219	617.6
Total rutier		3095	5086
Investiția 4- Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca	<i>Construirea de noi magistrale de metrou în Municipiul București și în Municipiul Cluj-Napoca</i>	600	2921
Total metrou		600	2921
TOTAL INVESTIȚII PNRR		7591	12732

Finanțarea prin POT

Structura de finanțare aferentă noului Program Operațional Transport 2021-2027 este prezentată în tabelul 3.6.

Tabelul 3.6. Costul proiectelor finanțate din POT

Programul Operațional Transport					
Nr. Crt.	Prioritate	Alocarea pe prioritate (mil.EUR fără TVA)			Alocare + Supracontractare (+200%) (mil.EUR fără TVA)
		FEN	BS	Total	
1	Îmbunătățirea conectivității primare rutiere (40%-FEN, 60%-BS)	1875	2812	4687	14061
2	Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere (40%-FEN, 60%-BS)	400	600	1000	3000
3	Creșterea siguranței rutiere (40%-FEN, 60%-BS)	100	150	250	750
4	Creșterea eficienței căilor ferate române (50%-FEN, 50%-BS)	1030	1030	2060	6180
5	Creșterea atractivității transportului feroviar de călători (85%-FEN, 15%-BS)	250	44	294	882
6	Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane (85%-FEN, 15%-BS)	550	97	647	1941
7	Dezvoltarea transportului naval și multimodal (50%-FEN, 50%-BS)	145	145	290	870
8	Dezvoltarea transportului aerian (85%-FEN, 15%-BS)				
	Total	4350	4878	9228	27684

AXA 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII PRIMARE RUTIERE

Alocarea estimată din POT include Proiectele fazate din cadrul POIM și proiectele noi analizate și prioritizate. În cadrul rețelei primare, proiectele majore fazate sunt prezentate în tabelul 3.7.

Tabelul 3.7. Proiectele majore fazate - rețea primară

Nr. Crt.	Proiect	Cost (mil.EUR)
1	Autostrada Sibiu-Pitești (1,4,5)	495
2	Centură București Sud și proiectele conexe	551
3	Drum de mare viteză Pitești - Craiova	257
4	Autostrada Transilvania	139
5	Total	1442

Având în vedere prioritizarea proiectelor realizată în cadrul capitolului 2 și alocările prezentate mai sus, strategia de finanțare în cadrul POT 2021-2027 include proiectele prezentate în tabelul 3.8.

Tabelul 3.8. Proiecte POT 2021 - 2027

Nr. Crt.	Proiect	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Sursa de finanțare
1	<i>Pitești - Sibiu (L2, L3)</i>	1847.0	POT
2	<i>Ploiești - Comarnic - Brașov</i>	1571.7	POT
3	<i>Poarta Sălajului - Biharia</i>	1057	POT
4	<i>Sibiu - Brașov</i>	1479.9	POT
5	<i>Arad - Oradea</i>	522.6	POT
6	<i>București - Alexandria (faza 1 din București - Craiova)</i>	367.5	POT
7	<i>Inel București (Nord) + drumuri radiale</i>	1112.3	POT
8	<i>Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Moșca - Ungheni)</i>	875.5	POT
9	<i>Brașov - Bacău (inclusiv Bypass Brașov Nord)</i>	2482,2	POT
10	<i>Pașcani - Suceava - Siret</i>	638.8	POT
11	<i>Tg.Mureș - Tg. Neamț (faza 1 din Miercurea Nirajului - Leghin)</i>	1000.0	POT
12	<i>Craiova - Filiași - Dr.Tr.Severin (faza 1)</i>	300.0	POT
13	<i>Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj (faza 1)</i>	800.0	POT
Total POT		14054.5	
1	<i>Timișoara - Moravița</i>	343.6	rezerva POT
2	<i>Macin - Tulcea (+drum de accesibilitate Delta Dunării) - Constanta (faza 1)</i>	200.0	rezerva POT
3	<i>Dej - Baia Mare - Halmeu</i>	608.9	rezerva POT
4	<i>Baia Mare - Satu Mare</i>	259.0	rezerva POT
5	<i>Cluj-Napoca (Apahida) - Dej</i>	450	rezerva POT
6	<i>Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila</i>	464.0	rezerva POT
Total rezervă POT		2325.5	

Complementaritatea între toate sursele de finanțare este prezentată în tabelul 3.9.

Tabelul 3.9. Proiecte POT - POIM - PNRR

Nr. Crt.	Proiect	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Sursa
1	<i>Pitești - Sibiu (L2, L3)</i>	1847.0	POT
	<i>Pitești - Sibiu (L1, L4, L5)</i>	926.4	POIM
	<i>Holdea - Margina</i>	297.0	PNRR
2	<i>Ploiești - Comarnic</i>	306.8	POT
3	<i>Comarnic - Brașov</i>	1264.9	POT
	<i>Chețani - Cp. Turzii</i>	58.3	POIM
	<i>Nădășelu - Poarta Sălajului</i>	409.0	PNRR

4	Poarta Sălajului - Biharia	1057.0	POT
5	Giurgiu - București	289.8	după 2027
	Ploiești - Buzău	635.2	PNRR
	Buzău - Focșani	797.3	PNRR
	Focșani - Bacău	998.3	PNRR
	Bacău - Pașcani	654.7	PNRR
6	Sibiu - Brașov	1479.9	POT
7	Arad - Oradea	522.6	POT
8	București - Alexandria (faza 1 din București - Craiova)	367.5	POT
9	Alexandria - Craiova (faza 2 din București - Craiova)	656.3	după 2027
10	Inel București (Nord) + drumuri radiale	1112.3	POT
	Inel București (Sud)	507.3	POIM
11	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Moțca - Ungheni)	875.5	POT
	Tg. Neamț - Iași - Ungheni (Leghin - Moțca)	304.0	PNRR
12	Brașov - Bacău	2364.0	POT
13	ByPass Brașov Nord	118.2	POT
14	Pașcani - Suceava	423.8	POT
15	Suceava - Siret	215.0	POT
16	Tg.Mureș - Tg. Neamț (faza 1 din Miercurea Nirajului - Leghin)	1000.0	POT
	Tg.Mureș - Tg. Neamț (faza 2 din Miercurea Nirajului - Leghin)	4180.4	după 2027
	Tg.Mureș - Tg. Neamț (Tg.Mureș - Miercurea Nirajului)	223.5	PNRR
	Pitești - Craiova	775.2	POIM
17	Craiova - Filiasi - Dr.Tr.Severin (faza 1)	300.0	POT
	Craiova - Filiasi - Dr.Tr.Severin (faza 2)	400.5	după 2027
18	Craiova - Calafat	306.9	după 2027
19	Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj (faza 1)	800.0	POT
	Dr.Tr.Severin - Caransebeș - Lugoj (faza 2)	733.0	după 2027
20	Dr.Tr.Severin - Calafat	283.9	după 2027
21	Autostrada A7 (ramura Buzău și ramura Focșani) - Brăila	464.0	rezervă POT
	Brăila - Galați	75.5	POIM
22	Timișoara - Moravița	343.6	rezerva POT
	Pod peste Dunăre la Brăila	415.8	POIM
23	Macin - Tulcea (+drum de accesibilitate Delta Dunării) - Constanta (faza 1)	200.0	rezervă POT
	Macin - Tulcea - Constanta (faza 2)	704.0	după 2027
24	Cluj-Napoca (Apahida) - Dej	450.0	rezerva POT
25	Dej - Baia Mare - Halmeu	608.9	rezerva POT
26	Baia Mare - Satu Mare	259.0	rezerva POT
	A3 - Tureni	65.5	POIM
	Satu Mare - Oar	63.4	POIM
TOTAL		31141.1	

AXA 2. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII SECUNDARE RUTIERE

Axa 2 include patru categorii de proiecte:

- Drumuri expres de pe rețeaua secundară - 2686.9 mil.EUR fără TVA din care 1504.8 reprezintă valoarea proiectelor propuse spre finanțare în POT
- Drumuri TransRegio - 2761.3 mil.EUR fără TVA din care 1183.8 reprezintă valoarea proiectelor propuse spre finanțare în POT
- Variante de ocolire - 1319.4 mil.EUR fără TVA
- Proiecte de reabilitare poduri și construcție noduri rutiere - 615 mil. Euro

Astfel proiectele propuse spre finanțare în cadrul Axei 2 POT au o valoare totală de 4623 mil. Euro cu un disponibil de finanțare (inclusiv supracontractare) de 3390 mil. EUR.

Finanțarea efectivă se va face în ordinea prioritizării prezentate prin raportare la gradul de maturitate al proiectelor și pe baza principiului "primul venit, primul servit"

Tabel 3.10. Proiecte finanțabile POT localizate pe rețeaua secundară (drumuri expres)

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (Drumuri Expres)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu fără TVA (mil.EUR/km)
1	A3 - Aeroport Henri Coandă - DN1	Drum Expres nou (2+2)	9.0	43.1	51.3	4.8
2	DX4 - Dej - Bistrița	Drum Expres nou (2+2)	55.6	266.4	317.0	4.8
3	A7 - Suceava - Botoșani	Drum Expres nou (2+2)	26.0	124.5	148.2	4.8
4	A7 - Bacău - Piatra Neamț	Drum Expres nou (2+2)	61.0	239.1	284.5	3.9
5	A1 - Pitești - Mioveni	Drum Expres nou (2+2)	9.2	42.0	50.0	4.6
6	A1 - Găești - Târgoviște - Ploiești - A3	Drum Expres nou (2+2)	74.2	348.2	414.4	4.7
7	A0 - București - Târgoviște	Drum Expres nou (2+2)	59.5	312.4	371.8	5.3
8	Alternativa Techirghiol (A2/A4 - Olimp)	Drum Expres nou (2+2)	27.5	129.1	153.6	4.7
	Total	8 proiecte	322.0	1504.8	1790.8	

Tabel 3.11. Proiecte finanțabile POT localizate pe rețeaua secundară (drumuri de conectivitate și transregio)

Nr. Crt.	Proiect rețea secundară (drumuri transregio)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)
1	Hunedoara - Sântuhalim - A1(profil 2+2)	Drum nou de legătură la rețeaua primară și modernizare drum existent	13.0	32.8	39.0
2	A8 - Lețcani Vest - Centura Iași (profil 2+2)	Drum nou de legătură la rețeaua primară	8.8	43.7	52.0
3	Blaj - Teiuș - A10 (profil 1+1)	Modernizare DN14B + poduri (peste CF M200 - Teiuș și CF M300 - Crăciunel)	23.7	25.8	30.7

4	DX - Centura Craiova Est (profil 2+2)	Drum nou de legătură la rețeaua primară	4.3	18.8	22.4
5	A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)	Drum nou de legătură la rețeaua primară	7.7	22.3	26.5
6	DX4 - Jibou - Românași - A3 (profil 2+2)	Drum nou de legătură între A3 și DX4	20.5	61.5	73.2
7	Slobozia - Drajna - A2 (profil 2+2)	Modernizare, extindere la 4 benzi + pod peste CF M800 Drajna și creșterea siguranței	16.9	16.9	20.1
8	Călărași - Drajna Nouă - A2 (profil 1+1)	Modernizare și creșterea siguranței	22.0	11.0	13.1
9	Reșița - Caransebeș - DX2 (profil 1+1)	Modernizare și creșterea siguranței	41.8	28.9	34.3
10	Vaslui - Iași - A8 (profil 1+1)	Modernizare și creșterea siguranței	85.9	85.9	102.3
11	Miercurea Ciuc - Sf. Gheorghe - Chichiș - A13 (profil 1+1)	Modernizare și creșterea siguranței	73.8	39.9	47.4
12	Rm. Vâlcea - Tigveni - A1 (profil 2+2, 2+1, 1+1)	Modernizare, extindere parțială și creșterea siguranței	20.4	30.6	36.4
13	Tg. Jiu - Filiași - DX2 (profil 2+2)	Modernizare și creșterea siguranței	70.9	106.4	126.6
14	Centura Metropolitană Cluj-Napoca (Gilău - A3 - Cluj-Napoca - Apahida - DX4) (profil 2+2)	Drum nou + drumuri de legătură	63.0	580.7	691.0
15	A1 - Titu - Bâldana - DX9	Modernizare	30.3	30.3	36.1
16	DX 9 - Târgoviște - Sinaia - A3	Modernizare	51.7	43.4	51.6
17	A4 Cumpăna - DN39 Constanța	Modernizare drum existent, extindere la 4 benzi și conexiune la noul nod rutier de pe A4	3.4	5.1	6.0
Total		17 proiecte	558.1	1183.8	1408.8

Tabel 3.12. Proiecte finanțabile POT localizate pe rețeaua secundară (variante de ocolire)

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (variante de ocolire)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mil.EUR fără TVA)	Cost estimat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu estimat fără TVA (mil.EUR/km)
1	VO Sibiu Sud	drum nou la profil 2+2	22.5	54.0	64.3	2.4
2	VO Rm. Vâlcea	drum nou la profil 2+2	15.9	70.1	83.4	4.4
3	VO Giurgiu	drum nou la profil 2+2	12.1	29.0	34.6	2.4
4	VO Bistrița	drum nou la profil 2+2	15.0	36.0	42.8	2.4
5	VO Vaslui	drum nou la profil 1+1	14.9	26.8	31.9	1.8
6	VO Mediaș	drum nou la profil 1+1	8.5	20.4	24.3	2.4
7	VO Botoșani	drum nou la profil 1+1	8.9	21.4	25.5	2.4
8	VO Piatra Neamț	drum nou la profil 1+1	8.1	19.4	23.1	2.4
9	VO Zalău	drum nou la profil 1+1	8.3	19.8	23.6	2.4
10	VO Slobozia	drum nou la profil 1+1	7.7	13.9	16.5	1.8
11	VO Câmpulung	drum nou la profil 2+2	7.8	18.8	22.3	2.4
12	VO Gura Humorului	drum nou la profil 2+2	4.7	11.3	13.4	2.4
13	VO Sfântu Gheorghe	drum nou la profil 1+1	7.7	13.9	16.5	1.8
14	VO Frasin	drum nou la profil 2+2	4.9	11.8	14.0	2.4
15	VO Miercurea Ciuc	drum nou la profil 1+1	7.4	13.3	15.9	1.8

16	VO Băbeni	drum nou la profil 1+1	4.5	8.0	9.5	1.8
17	VO Câmpulung Moldovenesc	drum nou la profil 2+2	11.9	28.5	34.0	2.4
18	VO Sighișoara	drum nou la profil 1+1	9.0	21.5	25.6	2.4
19	VO Pucioasa	drum nou la profil 1+1	5.4	13.0	15.5	2.4
20	VO Vatra Dornei	drum nou la profil 2+2	3.8	31.2	37.1	8.2
21	VO Mangalia	drum nou la profil 1+1	6.2	11.2	13.3	1.8
22	VO Tg. Mureș	drum nou la profil 1+1	11.6	62.0	73.8	1.8
23	VO Sebeș	drum nou la profil 1+1	3.4	6.1	7.3	1.8
24	VO Valea lui Mihai	drum nou la profil 1+1	7.0	12.6	15.0	1.8
	Total variante de ocolire	24 proiecte	217.1	574.0	683.1	2.6

Tabel 3.13. Proiecte finanțabile POT localizate pe rețeaua secundară (variante de ocolire regionale)

Nr. Crt	Proiect rețea secundară (Variante de ocolire regionale)	Tip intervenție	Lungime (km)	Cost estimat (mi.EUR fără TVA)	Cost est.mat (mil.EUR cu TVA)	Cost mediu (mil.EUR/ km)
1	VO Arad (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	11.0	29.5	35.1	2.7
2	VO Baia Mare (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	10.3	29.9	35.6	2.9
3	VO Curtea de Argeș (Reg. Dezvoltare S)	drum nou la profil 1+1	7.8	25.7	30.6	3.3
4	VO Reșița (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	7.2	22.6	26.9	3.1
5	VO Călărași (Reg. Dezvoltare S)	drum nou la profil 1+1	5.1	9.8	11.7	1.9
6	VO Petroșani (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 2+2	10.5	64.3	76.5	6.1
7	VO Buftea (Reg. Dezvoltare BI)	drum nou la profil 1+1	10.3	17.8	21.2	1.7
8	VO Cosmești (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	3.7	5.8	6.9	1.6
9	VO Reghin (Reg. Dezvoltare C)	drum nou la profil 1+1	4.7	10.2	12.1	2.2
10	VO Sînmartin/Băile Felix (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 2+2	7.2	34.8	41.4	4.8
11	VO Liești/Ivesti (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	14.4	23.8	28.3	1.7
12	VO Drăgășani (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	10.0	16.0	19.0	1.6
13	VO Păltinoasa (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 1+1	0.3	3.0	3.6	10.0
14	VO Brad (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	6.4	23.4	27.8	3.7
15	VO Sighetu Marmăției (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	16.4	41.1	48.9	2.5
16	VO Hîrlău (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 1+1	5.2	17.8	21.2	3.4
17	VO Huși (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 2+2	12.3	77.3	92.0	6.3
18	VO Flămânzi (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 1+1	7.0	12.4	14.8	1.8
19	VO Gheorgheni (Reg. Dezvoltare C)	drum nou la profil 1+1	6.8	15.8	18.8	2.3
20	VO Motru (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	1.7	5.5	6.5	3.2
21	VO Văleni (Reg. Dezvoltare NE)	drum nou la profil 2+2	5.3	15.6	18.6	2.9
22	VO Bălești (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	5.5	10.9	13.0	2.0
23	VO Bumbăști-Jiu (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	3.8	7.0	8.3	1.8
24	VO Viziru (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	4.2	6.1	7.3	1.5
25	VO Bocșa (Reg. Dezvoltare V)	drum nou la profil 1+1	12.9	40.4	48.1	3.1
26	VO Horezu (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	4.6	11.7	13.9	2.5
27	VO Negrești-Oaș (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	9.6	19.3	23.0	2.0

28	VO Năsăud (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	4.7	9.8	11.7	2.1
29	VO Tăuții-Măgherauș (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 2+2	9.3	34.3	40.8	3.7
30	VO Corabia (Reg. Dezvoltare SV)	drum nou la profil 1+1	10.8	18.5	22.0	1.7
31	VO Feldioara (Reg. Dezvoltare C)	drum nou la profil 2+2	2.5	8.3	9.9	3.3
32	VO Arduș (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	4.9	10.1	12.0	2.1
33	VO Fieni (Reg. Dezvoltare S)	drum nou la profil 1+1	5.1	17.6	20.9	3.5
34	VO Sîngeorz-Băi (Reg. Dezvoltare NV)	drum nou la profil 1+1	3.9	18.5	22.0	4.7
35	VO Vidra (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	5.7	12.2	14.5	2.1
36	VO Tudor Vladimirescu (Reg. Dezvoltare SE)	drum nou la profil 1+1	6.7	9.6	11.4	1.4
37	VO Odobești (Reg. Dezvoltare S)	drum nou la profil 1+1	5.6	9.0	10.7	1.6
	Total variante de ocolire regionale	37 proiecte	263.4	745.4	887.0	2.8

Pachet de noduri rutiere prioritizate în funcție de valorile de trafic și demografia zonei - 300 mil.EUR.

Pachet de reabilitare poduri prioritizate în funcție de valorile de trafic și gradul de degradare - 315 mil.EUR.

Tabel 3.14. Total pachet poduri

TOTAL PACHET PODURI		
pachet 1 (69 poduri)	650 710 450	130 142 090
pachet 2 (58 poduri)	424 436 350	84 887 270
pachet 3 (85 poduri)	503 640 259	100 728 052
TOTAL	1 578 787 059	315 757 412
	lei, fără TVA	Euro, fără TVA

AXA 3. CREȘTEREA SIGURANȚEI RUTIERE

În cadrul PNRR, pentru a răspunde integrat problemelor identificate în domeniul siguranței rutiere și pentru a pregăti cadrul strategic și legislativ necesar pentru implementarea acțiunilor de creștere a siguranței rutiere, a fost asumată o măsură de reformă care vizează:

- actualizarea și aprobarea *Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră* pentru perioada 2021-2030 prin Hotărâre de Guvern și începerea implementării acesteia;
- modificarea cadrului legislativ la nivel primar, secundar și terțiar aferent măsurilor prevăzute pentru asigurarea siguranței rutiere;

- măsuri de coordonare și clarificare a acțiunilor planificate și implementate de către fiecare actor cu responsabilități în domeniul siguranței rutiere;
- inițierea implementării măsurilor legislative aprobate.

Proiectele finanțate în cadrul POT sunt complementare cu cele finanțate din PNRR, respectiv cu cele cu finanțare BEI având ca scop primar eliminarea tuturor punctelor negre identificate pe rețeaua rutieră națională și acoperind următoarele investiții principale:

- Siguranță pasivă: parapete rutiere cu rulouri, montarea de parapete rutiere cu cabluri la marginea părții carosabile, amplasarea atenuatoarelor de impact echipați cu sistem de detecție a accidentelor și monitorizare trafic, achiziționarea de sisteme pentru protejarea lucrătorilor, campanii de conștientizare, etc.;
- Iluminat pe timp de noapte și dispozitive luminoase și reflectorizante;
- Separarea căilor de trafic auto și pietonal prin denivelarea acestora pentru evitarea congestiilor;
- Semnalizare, marcaje și amenajări rutiere;
- Digitalizarea elementelor de siguranță a circulației

Alocarea totală cu supracontractare în cadrul POT este de 750 mil.EUR iar finanțarea efectivă se va face prioritizând numărul de puncte negre eliminate la nivel de proiect.

Tabelul 3.15. Proiectele destinate creșterii siguranței rutiere și finanțarea acestora

Nr. crt.	Proiecte	Rezultat preconizat	Valoare estimată
1	Eliminarea a 92 puncte periculoase – SF+PT	- realizarea de studii de fezabilitate pentru implementarea de măsuri tehnice care vor conduce la eliminarea unui număr de 92 puncte negre	6.348 mil.EUR (92 puncte - 69 000 EUR / bucată)
2	Implementare măsuri de eliminare a 92 puncte periculoase - Lucrări	- implementarea de măsuri tehnice care vor conduce la eliminarea unui număr de 92 puncte negre	89.516 mil.EUR (92 puncte – 973 000 EUR / bucată)
3	Îmbunătățirea condițiilor de siguranță pentru parcarile existente pe drumurile naționale și autostrăzi	- Implementare de măsuri de îmbunătățire a părții carosabile - Implementare de măsuri de amenajare peisagistică - Implementare măsuri de îmbunătățire a calității grupurilor sociale - Dotare cu stații de încărcare pentru autovehicule electrice - Implementarea de soluții de iluminat digitale în vederea aderării la programul Green Deal - Dotarea cu coșuri de gunoi inteligente în vederea colectării selective a deșeurilor - Realizarea activității de salubritate în spațiile de parcare - Implementare măsuri de semnalizare și siguranță trafic - Instalarea de sisteme de supraveghere video	40 mil.EUR din care: 10 mil.EUR (10 parcuri x 1 mil.EUR/ bucată) – pentru parcarile cu dimensiuni mari care permit toate îmbunătățirile propuse 30 mil.EUR (100 parcuri x 300 000 EUR/bucată) – pentru parcarile cu dimensiuni mici care permit doar o parte din îmbunătățirile propuse
4	Îmbunătățirea condițiilor de siguranță prin realizarea de parcuri noi pe drumurile naționale și autostrăzi	- Concesionare spațiu în scopul utilizării/dotării, operării spațiilor pentru servicii	15 mil.EUR (10 parcuri noi x 1.5 mil.EUR/bucată)

5	Creșterea siguranței rutiere pe drumurile naționale prin eliminarea obstacolelor fizice și dotarea cu elemente pasive de siguranță pe sectoarele din afara localităților	- Eliminarea capetelor de podet aflate în lungul drumurilor naționale - Protejarea cu elemente pasive de siguranță rutieră a capetelor de podet aflate în lungul drumurilor naționale	200 mil.EUR (10 000 sectoare x 200 000 EUR/sector)
6	Creșterea siguranței rutiere în zona trecerilor de pietoni prin îmbunătățirea rugozității și vizibilității prin covoare antiderapante și semnalizare verticală	- Creșterea siguranței rutiere în zona trecerilor de pietoni prin îmbunătățirea rugozității; - Suplimentarea și refacerea semnalizării verticale în zona trecerilor de pietoni	50 mil.EUR (1000 treceri x 50 000 euro/trecere)
7	Campanie de siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic	- Scăderea numărului de accidente rutiere prin realizarea de activități și servicii de informare și educare a elevilor (gimnaziu și liceu) asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au ca participanți la traficul rutier pentru cunoașterea, aplicarea și conștientizarea corectă a regulilor de circulație	1.168 mil.EUR
8	Proiecte pilot de siguranță rutieră	- Creșterea siguranței rutiere prin implementarea de proiecte pilot	10 mil.EUR
TOTAL			442.03 mil.EUR

De asemenea, în contextul modificărilor structurale privind managementul rețelei naționale de drumuri, rezultate ca urmare a operaționalizării Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), va avea loc un proces de descentralizare între CNAIR și direcțiile teritoriale ale acesteia - DRDP. În acest sens, cele 7 DRDP vor prelua o parte a activității dedicate siguranței rutiere în ce privește lucrările conexe. Implicit va fi nevoie de o creștere a capacității funcționale și administrative a acestora atât la nivel de personal cât și la nivel de dotări și echipamente. În acest sens, a fost realizată o analiză de nevoi privind fiecare DRPD în ce privește echipamentele necesare, iar rezultatele analizei sunt prezentate sub formă tabelară în tabelul 3.16.

Tabelul 3.16. Echipamentele necesare DRPD-urilor și valoarea acestora

Nr. Crt.	Tip utilaj	Nr. buc	Valoare (mii EUR fără TVA) / DRDP	Total General DRDP 1-7 (mii EUR fără TVA)
1	Încărcător frontal – cupa >2mc	2	400	2800
2	Trailer 40 to	1	200	1400
3	Excavator pneuri > 12 tone	2	260	1820
4	Repartizator mixt asfalt	1	220	1540
5	Autobasculantă 8x4	5	700	4900
6	Compactor > 20 to (picior de oaie)	1	160	1120
7	Buldoexcavator	5	600	4200
8	Vehicul de teren (de tip Unimog)	1	200	1400
9	Automaturatoare stradala	2	300	2100
10	Autogudronator 10 tone	1	200	1400
11	Buldozer 30 – 40 tone	1	380	2660
12	Buldozer 20 tone	1	250	1750
13	Freza asfalt 2000	1	600	4200
14	Excavator pe senile 20 tone	1	170	1190
15	Excavator pe șenile 7 tone	1	80	560
16	Minieexcavator (de tip Bobcat)	1	40	280

17	Vehicul de teren (de tip MAN - Unimog)	8	1200	8400
18	Vehicul tehnologic (de tip MANITOU)	1	140	980
19	Autospecială de teren (cu benă)	4	200	1400
20	Autoutilitară 6+1 > 3,5 to (cu benă)	3	200	1400
21	Tractor + remorca + echipamente	7	1700	11900
TOTAL			8200	57400

Astfel, nevoile totale privind investițiile în siguranță rutieră și feroviară în cadrul POT luând în calcul complementaritatea cu PNRR sunt de 499 mil.EUR (proiecte CNAIR + dotări și echipamente DRDP).

AXA 4. CREȘTEREA EFICIENȚEI CĂILOR FERATE DIN ROMÂNIA

Deciziile de finanțare în domeniul feroviar depind de modul de abordare al proiectelor de modernizare, în vederea atingerii standardelor impuse la nivel de regulament european. Astfel cele două abordări sunt:

1. Implementarea fazată care prevede două etape:

a) etapa I – lucrări de tip reînnoiri pe liniile directe, implementate într-o manieră accelerată, care vizează eliminarea tuturor restricțiilor de viteză prin înlocuirea cadrului piatră spartă (track beds) – traverse și prinderi (rail sleepers and rail fasteners) – șină (steel rail) și a aparatelor de cale (rail switches);

b) etapa a II-a – lucrări de modernizare complete, pe liniile directe și abătute în special pentru poduri, podețe, tuneluri, care prevăd reutilizarea în procente ridicate a elementelor schimbate în prima etapă, la care se adaugă și introducerea sistemului ERTMS.

În această abordare fazată, etapa 1 este complementară cu etapa a II-a, lucrările la infrastructura feroviară fiind stabilite integrat încă de la început.

2. Modernizare completă în cadrul unui proiect integrat

Alocările financiare aferente proiectelor depind de abordările menționate, studiile de fezabilitate definind sectoarele de cale ferată care necesită modernizare completă și cele care asigură standardele europene printr-un proces fazat.

Având în vedere corelarea cu investițiile aferente PNRR (modernizare completă, renewal, quick wins, centralizări), în cadrul POT sunt propuse la finanțare o serie de proiecte desfășurate în tabelul 3.17.

Tabelul 3.17. Proiectele finanțate din POT

Nr. Crt.	Proiect	Tip Intervenție	Lungime (km)	Cost estimat total – modernizare completă (mil. EUR fără TVA)	Valoare propusă la finanțare din POT (mil. EUR fără TVA)	Observații
1	Predeal - Brașov	<i>M</i>	27.0	1400	1400	"Missing link" pe principala conexiune feroviară Constanța – Curtici – finanțare integrală din POT. Soluția tehnică va urmări maximizarea vitezei de tranzit și minimizarea declivității.
2	Craiova - Dr. Tr. Severin - Caransebeș	<i>M+D parțial</i>	234.0	2110	2110	Faza 1 - Modernizare completă cu finanțare integrală din POT în vederea finalizării până în 2030 a sectorului de coridor cu accent pe secțiunile-cheie ale sectorului critic Gârnița - Balota - Dr.Tr.Severin (declivitatea ridicată, raze de curbă mici, rocă nefavorabilă construcțiilor)
3	Teiuș - Cp. Turzii - Cluj-Napoca	<i>M</i>	102	790	790	Missing Link între principalul coridor feroviar (Constanța - București - Brașov - Curtici) și proiectul Cluj-Napoca - Episcopie Bihor din PNRR – finanțare integrală din POT
4	Port Constanța - Palas	<i>M+D</i>	180.0	727.4	246	Faza 1 - Modernizare completă pe secțiunile-cheie ale sectorului de acces în port (Palas - Port Constanța) între Agigea Ecluză și Terminal FerryBoat precum și grupa B din port. Faza 2 - Finalizare modernizare post 2027
5	Complex feroviar București	<i>M+E+D</i>	600.0	1000.0	250	Faza 1 - Modernizare completă pe secțiunile-cheie ale sectorului de acces în Gara de Nord grupele A și B, reactivarea unor racorduri, construcția unor puncte de oprire (stații CF) pentru aria metropolitană în noi de bazine de captare a pasagerilor Faza 2 - Finalizare modernizare post 2027
6	Pașcani - Iași - Ungheni	<i>M+E parțial</i>	97.0	388.0	388	Conexiune a municipiului Iași la Magistrala 500 – finanțare integrală din POT și principala legătură a Republicii Moldova la rețeaua TEN-T
7	Ploiești Triaj – Focșani – Roman - Pașcani	<i>M</i>	331	1324	566	Faza 1 - Modernizare completă pe secțiunile-cheie ale sectoarelor feroviare pe care viteza de circulație este redusă (ex. Ploiești - Buzău viteza actuală pe toată distanța este 80 km/h) Faza 2 - Finalizare modernizare post 2027
8	Proiect reabilitare stații	<i>M</i>	-	90	90	Faza 1 - Reabilitare stații prioritizate Faza 2 - Finalizare reabilitare post 2027
9	Proiect reabilitare poduri, podețe, tuneluri	<i>M</i>	-	450	110	Faza 1 - Reabilitare poduri, podețe, tuneluri prioritizate Faza 2 - Finalizare reabilitare post 2027
10	Proiect de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată	<i>M</i>	-	162	80	Faza 1 - Modernizare treceri la nivel cu calea ferată prioritizate Faza 2 - Finalizare modernizare post 2027

11	Proiect de creștere a vitezei peste 160 km/h pe sectoarele modernizate	<i>M</i>	-	70	30	Identificare și realizare lucrări de valorificare superioară a sectoarelor modernizate pretabile pentru creșterea vitezei peste 160 km/h
12	Studiu pentru trenul de mare viteză (HSR)	<i>S</i>	n/a	120	120	Realizare studiu
	Total		1571	7862	6180	
Proiecte de rezervă						
	Suceava - Ilva Mică	<i>M</i>	191	1807.5	1807.5	
	Ilva Mică - Apahida	<i>M</i>	119	714	714	
	Timișoara - Stamora Moravița frontieră	<i>M</i>	56	120.0	120.0	
	Total		366	2641,5	2641,5	
	Total general		1937	10463,56		

De asemenea, o altă categorie de intervenții aferente siguranței privesc modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată. Infrastructura feroviară din România are un număr de aproape 5000 de treceri la nivel, echipate în patru configurații sunt detaliate în tabelul 3.18.

Tabelul 3.18. Echipamentele trecerilor la nivel cu calea ferată

Nr. Crt	Tip trece la nivel	Număr
1	Cu bariere automate	217
2	Cu sisteme de semnalizare a apropierii trenului	901
3	Cu bariere mecanice	469
4	Cu indicatoare rutiere	3.493

Necesitatea reabilitării trecerilor la nivel este impusă de starea tehnică actuală, care necesită intervenții repetate prin înlocuirea dalelor de beton armat, acestea având o durată mică de viață, din cauza măcinării betonului, afectat de fenomenul de îngheț – dezgheț, precum și din cauza greutateii autovehiculelor de mare tonaj.

Deficiențe ale situației actuale – trecerile la nivel nu sunt prevăzute cu instalație de semnalizare a apropierii trenurilor, putându-se produce incidente feroviare, cu afectarea integrității materialului rulant, a autovehiculelor rutiere sau a persoanelor.

În cadrul proiectului „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” obiectivul specific este modernizarea a minimum 150 de treceri la nivel cu calea ferată (TN) la nivelul întregii rețele feroviare din România.

Principalele beneficii la care contribuie realizarea serviciilor sunt:

- îmbunătățirea siguranței traficului feroviar pe rețeaua de cale ferată;
- diminuarea efectelor adverse asupra mediului;
- deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor;
- eliminarea și reducerea costurilor generate de accidente și de incidentele feroviare;
- creșterea eficienței activității de operare și întreținere a rețelei de cale ferată din România;
- creșterea siguranței circulației feroviare, dar și a siguranței circulației rutiere;
- creșterea confortului pentru vehiculele rutiere;

Variantele constructive de realizare a investițiilor:

A. Amenajarea trecerilor la nivel

1. **Varianta 1.** Amenajarea cu dale elastice. Dalele noi vor fi corespunzătoare unui trafic foarte greu.
2. **Varianta 2.** Amenajarea cu dale prefabricate din beton.
3. **Varianta 3.** Amenajarea cu dale monolit din beton, acolo unde nu se pot folosi dale prefabricate.

B. Instalații SCB + TTR

1. **Varianta 1.** Instalații BAT M-77 cu numărătoare de osii / cu circuite de cale
2. **Varianta 2.** Instalații BAT U-75 cu numărătoare de osii / cu circuite de cale
3. **Varianta 3.** Bariera cu dulap electronic și numărătoare de osii

Prin realizarea investiției se urmărește sporirea siguranței circulației, atât rutiere cât și feroviare, prin preîntâmpinarea accidentelor de la intersecția cale ferată – drum și dezvoltare economico-socială a zonei. La nivel național, se are în vedere reabilitarea a 160 de treceri la nivel cu calea ferată, valoarea estimată fiind de 800 mil. RON fără TVA (162 mil. EUR).

AXA 5. CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI FEROVIAȘ DE CĂLĂTORI

În definirea nevoilor de finanțare aferente materialului rulant pornim de la *Studiul de fezabilitate pentru achiziționarea materialului rulant pentru călători, distribuit pe baza contractelor de servicii*

publice atribuite în mod competitiv și operate pe liniile prevăzute în obligația pentru serviciul public din rețeaua feroviară din România, elaborat de BEI în 2020.

Conform acestui studiu, pe lângă investiția propriu-zisă, la nivel național sunt necesare:

- realizarea unui mers de tren îmbunătățit cu asigurarea mai multor trenuri pe tronsoanele cu cerere mare;
- bază legală de contractare a contractelor de servicii publice, inclusiv atribuirea primelor contracte prin procedură competitivă și indicatori de performanță;
- introducerea unui cadru performant de mentenanță a materialului rulant prin atribuirea de contracte atașate celor de furnizare.

Studiul precizează faptul că achiziționarea de material rulant nou pentru pasageri va avea un impact semnificativ asupra nivelului serviciilor și asupra costurilor și beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători. Caracteristicile tehnice și starea tehnică a materialului rulant existent nu satisfac așteptările pasagerilor. Cele mai multe dintre vehicule sunt aproape de sfârșitul vieții lor economice. Parcul învechit de material rulant, defecțiunile frecvente și întârzierile reduc nivelul de serviciu și fiabilitatea căilor ferate. Menținerea disponibilității și fiabilității materialului rulant existent la un nivel acceptabil va necesita un nivel ridicat de întreținere cu costurile ridicate asociate operării și întreținerii (O&M).

A fost efectuată analiza opțiunilor strategice și au fost identificate rute prioritare. Ulterior, au fost planificate servicii pe aceste rute și posibile opțiuni de contractare pentru servicii prioritare definite, inclusiv considerații privind ambalarea acestor servicii. Liniile electrificate au fost mai întâi definite și investigate, având în vedere că, în general, rețeaua electrificată include aproape toate marile coridoare de transport feroviar și având în vedere că se preconizează că va avea mai multe rame electrice (RE) decât rame non-electrice pentru traficul pe distanțe mari, începerea procedurii de licitație pentru acestea a fost considerată o prioritate, pentru a se asigura că perioada de livrare lungă nu va depăși decembrie 2023 (sfârșitul perioadei de implementare a Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020). Numărul de RE a fost estimat pe baza orelor de călătorie ale rutei, luând în considerare frecvențele maxime optimiste, în general 30 de minute sau chiar 20 de minute pe rutele cu cel mai mare potențial.

Acest lucru a condus la:

— 10 Servicii regionale care necesită 56 RE-R, + 6 unități de rezervă (11 %) = total 62 RE-R necesare;

și

— 13 servicii inter-regionale care necesită 33 RE-IR, + 4 unități de rezervă (12 %) = total general de 37 RE-IR.

Alocarea totală cu supracontractare de 882 mil.EUR din POT va fi dedicată atingerii țintei de 99 trenuri noi, atât RE-R, cât și RE-IR, prezentate mai sus.

AXA 6. DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII SUSTENABILE ÎN NODURILE URBANE

Axa dedicată mobilității urbane include proiecte de trenuri metropolitane și metrou. Având în vedere alocarea disponibilă cu supracontractare de 1941 mil.EUR și prioritizarea prezentată în capitolul 2, proiectele finanțate din POT includ:

Pentru metrou:

- Proiectele fazate din POIM: M2 și M6
- Proiect nou M5 - secțiunea Eroilor-lancului
- Proiectele minore de extensii de magistrale în funcție de maturizarea acestora și corelarea cu implementarea proiectelor Orbital București și centură feroviară București, modernizări de stații în funcție de vechimea și necesitățile fiecărei stații, respectiv material rulant nou pentru metrou.

Pentru trenuri metropolitane, în funcție de prioritizarea prezentată și gradul de maturitate pe baza principiului *"primul venit, primul servit"*. Pe lângă proiectul centurii feroviare București, finanțabil din Axa 4, proiectele cu grad mare de certitudine sunt cele aferente municipiilor Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Timișoara.

AXA 7. DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI NAVAL ȘI MULTIMODAL

Conform prioritizării prezentate în capitolul 2, în funcție de gradul de certitudine strategică, precum și în funcție de alocarea disponibilă prezentată, necesarul de finanțare pentru sectorul naval se ridică la o sumă de 4460 mil. EUR, cu un disponibil de finanțare în cadrul POT (inclusiv supracontractare) de 870 mil. EUR:

- căi navigabile: 1080 mil.EUR
- porturi maritime: 1330 mil.EUR
- porturi fluviale: 2050 mil.EUR

Referitor la investițiile în transportul multimodal, schimbările propuse în cadrul POT și anume lărgirea bazei de beneficiari eligibili prin includerea mediului privat, respectiv flexibilitatea în ce privește localizarea acestora, nu permite o identificare precisă a proiectelor care vor fi finanțate.

Atât pentru proiectele navale, cât și pentru proiectele multimodale, finanțarea efectivă va fi acordată pornind de la prioritizarea prezentată și luând în calcul gradul de maturitate al proiectelor și conectivitatea strategică cu proiectele de infrastructură conexe din cadrul altor moduri de transport. Ca principiu de finanțare, propunem un procent de 70% din alocarea disponibilă să fie aferentă proiectelor din cadrul portului Constanța, datorită importanței deosebite a acestuia în cadrul sectorului naval în special și în cadrul sectorului de transport din România în general.

AXA 8. DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI AERIAN

În contextului efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului aerian, au fost redimensionate și prioritizate proiectele de infrastructură aeriană aflate în pregătire și evaluare la nivel național. Conform prioritizării prezentate în capitolul 2, în funcție de gradul de certitudine strategică, precum și în funcție de alocarea disponibilă prezentată, necesarul total de finanțare pentru sectorul aerian se ridică la suma de 2794.1 milioane EUR.

Având în vedere considerațiile de mediu și adaptare climatică, finanțarea dezvoltării infrastructurii aeroportuare în următoarea perioadă de finanțare este lăsată în sarcina surselor de finanțare naționale. Cu toate acestea, autoritățile române vor negocia cu Comisia Europeană posibilitatea susținerii în continuare, în condiții limitate, a dezvoltării sustenabile a infrastructurii aeroportuare.

Finanțarea prin CEF

Finanțarea din partea UE acordată *prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)* vizează finalizarea rețelei TEN-T și, în special, a coridoarelor rețelei TEN-T Core, România fiind traversată de două coridoare, respectiv Orient East-Med și Rin-Dunăre.

Mecanismul a fost creat pentru a răspunde obiectivelor politicii de coeziune referitoare la reducerea decalajelor economice, sociale și teritoriale existente la nivelul UE, prin finanțarea de investiții în domenii precum: transport, energie și digitalizare. Acțiunile sprijinite prin CEF sunt complementare celor finanțate în cadrul politicii regionale a Uniunii Europene, prin intermediul programelor operaționale.

Pentru perioada 2021 – 2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1153/2021. Spre deosebire de celelalte programe operaționale, CEF este gestionat direct la nivelul Comisiei Europene, de către CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), aceasta având responsabilitatea evaluării și selectării proiectelor finanțabile.

Sprijinul CEF este structurat, ca și până acum, pe doua componente:

- Sprijin din anvelopa de coeziune ce se adresează doar a celor 15 state membre eligibile la finanțare din Fondul de Coeziune (Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia), România având o alocare de 1.090.496.950 EUR.
- Sprijin din anvelopa generală la care au acces toate statele membre UE. Finanțarea UE este, în acest caz, între 30% și 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

La elaborarea Strategiei de accesare a CEF 2 am ținut cont de următoarele elemente:

- Angajarea în proporție de 100% a sumei alocate României pentru sectorul de transport, prin anvelopa de coeziune, prin proiecte depuse de beneficiari în apelurile lansate până în 2023, inclusiv;
- Constrângerile Programului CEF impun ca, până la finalul anului 2023, România să transmită proiecte pentru cel puțin 70% din suma alocată pe anvelopa de coeziune, în caz contrar urmând a pierde din alocare în favoarea celorlalte state eligibile pe anvelopa de coeziune;
- Posibilitatea beneficiarilor români de a solicita, în cadrul apelului din 2023, sume suplimentare provenite dintr-o eventuală subcontractare din partea celorlalte state membre.

În acest sens, au fost identificate o serie de proiecte care ar putea îndeplini criteriile de eligibilitate CEF și care ar avea cel mai mare potențialul pentru absorbția fondurilor disponibile. Astfel, ținând cont gradul de maturitate al proiectelor și de necesitatea de a finaliza, cu prioritate, coridorul Rin-Dunăre:

- Proiecte de modernizare a căii ferate:
 - București – Giurgiu, valoare estimată 577 mil.EUR;
 - Brașov – Sighișoara - faza a II-a (faza I este finanțată, în prezent, prin CEF 1), valoare estimată 450 mil.EUR.

Proiecte de rezervă (în ceea ce privește complementaritatea CEF/Axa 4 POT, decizia de finanțare depinde de maturitatea proiectelor.)

- Predeal – Brașov, valoare estimată 1.400 mil.EUR;
- Faza 2 - Accesul feroviar în Portul Constanța, valoare estimată 727 mil.EUR;

* Secțiunea Craiova – Calafat, deși face parte din Coridorul Orient – East – Med, nu a fost inclusă la finanțare prin CEF deoarece datele de trafic nu justifică valoarea ridicată a investiției, ținând cont și de faptul ca sectoarele Craiova – Drobeta – Caransebeș – Vidin – Sofia și Craiova – București nu sunt modernizate.

- Proiecte pe cai navigabile:
 - Fast Danube (studiul de fezabilitate este finalizat, în prezent, din CEF 1) – valoare estimată: 200 mil.EUR.

Astfel, pentru **anvelopa de coeziune**, propunem ca promovarea proiectelor pe prioritățile de investiții specifice CEF 2 să se facă în ordinea maturizării lor, după cum urmează:

- 70% pentru investițiile feroviare în rețeaua TEN-T, mai sus menționate;
- 20% pentru investițiile pe căile navigabile interioare în rețeaua TEN-T;

- 10% pentru investițiile în dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi pe rețeaua TEN-T (proiectele propuse spre finanțare vor fi corelate cu Strategia CNAIR privind instalarea de stații de încărcare vehicule electrice pe rețeaua TEN-T din România, până în anul 2030), precum și pentru alte tipuri de investiții orizontale: parcuri securizate, terminale intermodale, sisteme de siguranța rutieră, ITS, etc.

În ceea ce privește **anvelopa generală**, considerăm oportună promovarea tuturor acelor proiecte care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în ordinea transmiterii cererilor de finanțare, fără a impune condiții suplimentare, astfel încât să asigurăm egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii interesați.

CAPITOL 4 – MĂSURI DE CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Capacitatea administrativă, în contextul prezentului Plan Investițional, se referă la capacitatea unui beneficiar de a finaliza cu succes o operațiune în cursul normal al activității sale. Cu alte cuvinte în sectorul de transport *capacitatea administrativă* reprezintă ansamblul de elemente materiale, umane, tehnice, financiare și procedurale existente la nivelul beneficiarilor de proiecte de infrastructură de transport care conduc la implementarea eficientă a proiectelor.

Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice și sociale a țării, este nerealizarea unei rețele moderne de transport. Calitatea și serviciile oferite de infrastructura de transport în România continuă să rămână sub nivelul Statelor Membre dezvoltate, cu efecte negative asupra nivelului intern de competitivitate și accesibilitate a regiunilor României la piețe internaționale.

Astfel, este necesară asumarea angajamentului ferm de adoptare punctuală și graduală a măsurilor de capacitate administrativă propuse în prezentul capitol.

Infrastructura de transport, este caracterizată de o rigiditate crescută provenită din complexitatea tehnică relativ ridicată și din procesul birocratic relativ complex de pregătire, avizare, licitare și contractare. De aceea, principala problemă identificată în implementarea eficientă a unui proiect de infrastructură de transport este schimbarea (schimbarea planului, schimbarea soluției tehnice, schimbarea strategiei de implementare etc.).

Decalajul de dezvoltare a infrastructurii de transport din România față de statele membre mai dezvoltate este considerabil și este de înțeles așteptarea ca infrastructura de transport din România să recupereze acest decalaj foarte rapid, dar, din păcate, în trecut, din dorința de a realiza infrastructura de transport mai rapid, a fost alocat timp insuficient pregătirii proiectelor sau s-a grăbit avizarea proiectelor, cu consecința paradoxală a prelungirii timpului de implementare în loc de reducere (exemplu cel mai elocvent: Construcția autostrăzii Lugoj –Deva, dar și construcția autostrăzii Sebeș – Turda) și cu realizarea unor lucrări la calitate inferioară.

În prezent, deficiențele identificate la nivelul infrastructurii și a serviciilor de transport aflate la dispoziția populației și mediului de afaceri sunt dublate de o capacitate administrativă și de management redusă, atât la nivelul instituțiilor publice responsabile, cât și la nivelul companiilor de stat.

Totodată, în perioada anterioară, la nivelul MTI s-a observat o diluare a responsabilităților de elaborare de strategii, standarde și reglementări, între mai multe departamente sau chiar prin delegare, de facto, a rolului strategic, sectorial, către companii. Acest lucru a condus la fragmentarea viziunii strategice și la lipsa de coordonare în abordarea priorităților strategice, integrate ale ministerului.

De asemenea, s-a observat o capacitate scăzută de a monitoriza obiectivele strategice, de a defini prioritățile de investiții și de a urmări implementarea proiectelor majore. Acest aspect este coroborat și cu o capacitate scăzută a ministerului de a-și îndeplini rolul de autoritate tutelară pentru companiile de stat din subordine, prin definirea unor obiective cu grad crescut de ambiguitate, prin măsuri neclare de monitorizare a performanței și incapacitatea de a stabili indicatori de performanță corelat cu viziunea de dezvoltare a ministerului și a sectorului de activitate.

De aceea, acest Plan Investițional reprezintă, în sine, o măsură de creștere a capacității administrative în sectorul de transport prin asigurarea unui cadru strategic stabil pe următorii 10 ani.

Totodată, la nivelul companiilor aflate sub tutela MTI cu responsabilități în administrarea/modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii, au fost identificate o serie de impedimente care afectează performanța generală și atingerea rezultatelor:

- Dificultăți în asigurarea stabilității financiare prezente și viitoare;
- Dificultăți în stabilirea și asumarea unor obiective clare, măsurabile și care să fie direct legate de performanță;
- Grad scăzut de stabilitate a echipei de management;
- Grad scăzut de pregătire a echipelor tehnice pentru pregătirea și implementarea proiectelor;
- Supraîncărcare a echipelor de implementare a proiectelor specializate;
- Dificultăți în definirea priorităților și alocarea de resurse în mod corespunzător.

Ca prim răspuns pentru remedierea acestor probleme, La nivelul PNRR au fost stabilite o serie de măsuri de reformă care să crească capacitatea de management atât la nivelul ministerului cât și la nivelul companiilor de stat din subordine, astfel încât proiectele majore de investiții preconizate și obiectivele macroeconomice ale României să poată fi realizate, după cum urmează:

- a) *Îmbunătățirea capacității administrative și manageriale a ministerului, pentru realizarea obiectivelor strategice de investiții*

Măsura propusă are în vedere îmbunătățirea capacității MTI de a livra reforme și investiții și de a monitoriza performanța companiilor de stat. Astfel, MTI are în vedere reorganizarea structurii organizatorice prin care să întărească funcția de strategie și politici publice, precum și funcția de monitorizare, conform mandatului său.

Prin aceasta reorganizare promovată la nivelul PNRR se are în vedere crearea a două structuri: *Direcția Generală Strategie și Direcția Generală Monitorizare Proiecte* (de tip Delivery Unit), cu rolul de a întări capacitatea instituțională de a planifica strategic, de a prioritiza și defini o viziune integrată, reglementă unitar (în cazul primei structuri) și de a urmări implementarea proiectelor, anticipa riscuri și elimina blocaje în implementare (în cazul celei de-a doua).

În mod specific structurile suport ce gestionează Modelul Național de Transport, Strategia de implementare a proiectelor europene și realizează analizele tehnice necesare deciziilor de finanțare vor fi asimilați sistemului de management și control al fondurilor europene.

Rolul acestor structuri va fi acela de a planifica intervenții coerente, la standarde europene, capabile să combine infrastructura de transport și de comunicații și să promoveze digitalizarea în sectorul de transport.

Alături de configurarea noilor direcții menționate mai sus, măsura își propune creșterea capacității Direcției Guvernanță Corporativă de a monitoriza performanța companiilor de stat aflate sub autoritatea tutelară a MTI.

Totodată, intervențiile instituționale și structurale vor fi acompaniate de atragerea de specialiști prin derularea unor campanii active de recrutare și implementarea unui plan de formare pentru structurile din MTI, în special cele cu responsabilități în domeniul planificării strategice, a elaborării strategiilor și actelor normative (inclusiv contracte de servicii publice), a monitorizării reformelor și proiectelor, a guvernanței corporative, astfel încât să fie crescută capacitatea ministerului de a:

- defini și monitoriza contractele de servicii publice;
- defini obiective, mandate și indicatori de performanță pentru companii;
- monitoriza performanța companiilor;
- realiza analize cantitative și calitative referitoare la activitatea companiilor.

În același timp, se are în vedere atragerea de parteneriate cu mediul academic/privat/profesional pentru creșterea capacității structurilor de specialitate din MTI.

Pe lângă aspectele menționate, reforma instituțională prevede și reorganizarea și eficientizarea activității Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în special în ceea ce privește implementarea unui nou mers al trenurilor, eficient din punct de vedere socio-economic, centrat pe călător și pe nevoile de conectivitate ale populației și ale mediului de afaceri, precum și atribuirea materialului rulant nou achiziționat conform prevederilor contractelor de servicii publice, dar și introducerea unui sistem integrat de ticketing care să permită centralizarea informațiilor cu privire la numărul de călători.

Totodată, reforma instituțională vizează și Autoritatea Feroviară Română (AFER), în special în ceea ce privește transpunerea directivelor europene și armonizarea cu legislația europeană în domeniu. De asemenea, în ce privește relația MTI și a companiilor feroviare din subordine cu Consiliul Național de Supraveghere a Căilor Ferate, aceasta se realizează prin intermediul Direcției Transport Feroviar și urmărește implementarea măsurilor privind accesul în condiții transparente și nediscriminatorii la infrastructura feroviară și tratarea echitabilă și nepărtinitoare a tuturor operatorilor de transport feroviar. Dezvoltarea relației între MTI și Consiliu este relevantă din punctul de vedere al mecanismului de alocare nediscriminatorie a traseelor din viitoarele contracte de servicii publice, precum și distribuirea către operatori a materialului rulant nou achiziționat.

b) *Îmbunătățirea managementului companiilor de stat, prin implementarea măsurilor de eficientizare a activității și îmbunătățirea performanței.*

Măsura propusă urmărește:

- selectarea unui management profesionist, conform legislației în domeniul companiilor de stat și guvernantei corporative;
- stabilirea de indicatori de performanță (KPIs) financiari și nefinanțari pentru management și companie, inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare;
- definirea unui mecanism de monitorizare a performanței companiilor de stat din subordinea MTI (C.N.A.I.R. S.A., CNCF CFR S.A., SNTFC CFR Călători S.A și Metrorrex S.A.);
- Asigurarea implementării contractelor de servicii publice cu respectarea dispozițiilor Regulamentului 1370/2007.

Pentru creșterea capacității operaționale, pentru toate companiile propuse se are în vedere:

- optimizarea proceselor și fluxurilor de lucru;
- stabilirea unei structuri instituționale corelată cu liniile de business și cu portofoliul de proiecte aflat în pregătire/implementare/monitorizare;
- constituirea de echipe dedicate de tipul Unități de Implementare a Proiectului, cu specializări adaptate nevoilor proiectelor și surselor de finanțare, cu responsabilități clare pentru pregătirea, implementarea și monitorizarea fiecărui proiect. Principiul subsidiarității va fi luat în considerare în constituirea acestor unități de proiect. Aceste structuri se vor afla în strânsă legătură cu Direcția Generală Monitorizare din cadrul MTI.

Aceste măsuri sunt corelate cu reforma mai amplă propusă de Guvern pentru „Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor de stat” și vizează măsuri de implementare a principiilor agreeate la nivel de pachet legislativ, aferente guvernantei corporative.

În afară de stabilitatea strategică, este important ca toate etapele de implementare ale proiectelor să se realizeze la calitatea necesară. Astfel, principalele măsuri de capacitate administrativă propuse în prezentul document sunt structurate pe etapele de implementare ale proiectului.

1. Pentru etapa de pregătire a proiectului (realizarea studiilor de fezabilitate, analize tehnice, economice și de mediu):

- a. Realizarea și completarea legislației naționale cu reglementări metodologice obligatoriu să fie urmărite de beneficiarii/administratorii de infrastructură de transport în elaborarea documentațiilor tehnico-economice și de mediu. Așa numita Carte Albastră a pregătirii proiectelor (Blue book), completată și cu Ghiduri privind realizarea analizelor economice, precum și a analizelor privind impactul asupra mediului;
- b. Creșterea capacității beneficiarilor/administratorilor de infrastructură de transport pentru analiza documentațiilor tehnico-economice realizate de serviciile de consultanță externă;
- c. Eficientizarea procesului de avizare a documentațiilor de proiect prin creșterea coordonării și responsabilității instituțiilor avizatoare din domeniul protecției mediului, transport de energie electrică și gaze, alte utilități, agricultură, păduri și amenajarea teritoriului, arheologie, etc.

Astfel trebuie realizate modificări legislative care să conducă la responsabilizarea factorilor implicați în avizarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, în ceea ce privește:

- Fondul forestier,
- Terenurile agricole,
- Descărcările arheologice,
- Mutările de utilități electrice, gaze naturale, telefonie, etc.
- Studiile de mediu și arii protejate,
- Autorizările locale și de dezvoltare urbanistică, etc.

Modificările legislative trebuie să reglementeze faptul că, odată incluse în Planul Investițional pentru perioada 2020-2030, proiectele de infrastructură de transport de interes național vor deveni priorități absolute pentru care responsabilii de activitățile de mai sus se vor implica în mod activ. Astfel, odată realizate studiile tehnice de bază, toate entitățile vor avea obligația efectuării tuturor demersurilor în vederea obținerii avizelor/relocărilor/descărcărilor, prin implicare activă, într-un termen maxim agreat.

2. Pentru etapa de licitare/contractare a investițiilor:

- a. Îmbunătățirea cadrului legislativ și metodologic pentru realizarea caietelor de sarcini, în vederea selecției celor mai bune servicii externe de consultanță (atât pentru pregătirea proiectelor cât și pentru supervizare).

Se recomandă ca beneficiarii proiectelor de infrastructură de transport de interes major să realizeze contracte cadru pe perioada aferentă Planului Investițional 2020-2030, prin care să mobilizeze experți de rang internațional exclusiv pentru scopul de a audita cerințele din caietele de sarcini provenite din documentațiile tehnice. Acești experți pot lucra direct cu directorul general al companiilor și societăților responsabile de realizarea proiectelor, punctul lor de vedere fiind consultativ.

De asemenea, se recomandă contractarea supervisorului înainte de semnarea contractului de lucrări.

- a. Îmbunătățirea cadrului legislativ și metodologic pentru realizarea criteriilor de selecție a antreprenorilor de lucrări, coroborate cu implementarea sistemului de certificare a capacității de execuție a antreprenorilor de la nivelul MTI;
- b. Profesionalizarea comitetelor de evaluare și selecție a ofertelor, prin crearea unor structuri și specialiști alocați exclusiv pentru această activitate, remunerați în mod corespunzător, precum și prin cooptarea de experți externi profesioniști (IFI, alte servicii externe de calitate);
- c. Îmbunătățirea legislației privind achizițiile publice, dar nu prin modificarea radicală a acesteia, ci prin ajustarea acelor aspecte identificate ca fiind problematice, pornind de la cele mai frecvente probleme întâlnite în procesele de achiziție deja desfășurate, precum de la soluțiile dispuse de instanțele judecătorești;
- d. Eficientizarea modului de rezolvare a contestațiilor din cadrul proceselor de achiziție publică prin aplicarea măsurilor legislative și administrative necesare:
 - i. Accelerarea proceselor în instanță (complete de judecată specializate, etc.);
 - ii. Asigurarea profesională a decidenților pentru acoperirea riscului decizional privind semnarea contractelor de lucrări înainte de epuizarea căilor de judecată.

3. Pentru etapa de implementare/construire a proiectelor:

- a. Asigurarea / atragerea de personal profesionist, remunerat corespunzător în unitățile de implementare a proiectelor;
- b. Asigurarea fluxurilor financiare neîntrerupte prin eficientizarea perioadei de verificare a situațiilor de lucrări.

Față de măsurile structurate pe etapele de implementare a proiectelor este necesar ca anumite măsuri orizontale să fie aplicate. Astfel:

1. Aplicarea guvernantei corporative (profesioniste) la beneficiarii/administratorii infrastructurii naționale de transport:

Obiectivele prevăzute în Planul Investițional trebuie să stea la baza contractelor de mandat pentru managementul companiilor care administrează infrastructura de transport. Continuarea managementului provizoriu la principalii beneficiari în sectorul de transport reprezintă o amenințare la realizarea obiectivelor Planului Investițional. Prin urmare este imperios necesar ca procesele de selecție ale unui management profesionist la aceste companii să fie realizate în cel mai scurt timp cu putință. Se poate avea în vedere o supraveghere parlamentară a procesului de numire a acestor manageri.

- 2. Asigurarea unui cadru bugetar stabil prin rezervarea unui buget anual pentru investiții și pentru întreținerea infrastructurii naționale.** Din calculele realizate de către MTI, aproximativ 2% din PIB (pre-COVID) pe an, în perioada 2020-2030, ar acoperi necesarul de finanțare.
- 3. Introducerea „competiției” pe segmentul infrastructurii de transport naționale prin deschiderea managementului de proiect către autoritățile locale / direcțiile regionale ale companiilor de administrare a infrastructurii.**
- 4. Asigurarea resurselor umane necesare implementării Planului Investițional, prin corespondența cu sistemul educațional, astfel încât cererea de meserii aduse de proiectele de infrastructură de transport să fie acoperită cât se poate de mult de piața locală.**

Resursa umană reprezintă un element deosebit de important în implementarea cu succes a proiectelor de infrastructură de transport dar și pentru gestionarea și operarea eficientă a acestora. Fenomenul de îmbătrânire a specialiștilor și a muncitorilor este des întâlnit în toate sectoarele de transport, fie că ne referim la implementarea proiectelor de infrastructură rutieră, fie că ne referim la operarea pe calea ferată. Pentru ca aceste sectoare de transport să redevină atractive pentru tinerii absolvenți de facultăți tehnice sau licee/colegii tehnice, o serie de măsuri și stimulente sunt necesare:

- Dezvoltarea sistemului de învățământ dual, adaptat cerințelor pieței construcțiilor;
- Introducerea în curricula liceelor tehnice a materiilor și disciplinelor tehnice;
- Acordarea de stimulente pentru elevii care urmează cursurile claselor tehnice (sub formă de burse de studiu, cazare gratuită elevilor din afara localităților);
- Adaptarea curriculei liceelor la cerințele pieței construcțiilor sau a operatorilor de transport;
- Crearea sistemului de specializare la locul de muncă și integrarea elevilor/studentilor în piața muncii încă din perioada educațională, prin dezvoltarea sistemelor de practică și a internship-urilor.

Toate aceste acțiuni vor avea beneficii concrete și imediate în ceea ce privește dezvoltarea și specializarea forței de muncă în corelare directă cu piața construcțiilor, a agenților economici, a gestionarilor de infrastructură sau a operatorilor de transport.

Pe baza experienței acumulate în derularea proiectelor și programelor anterioare, putem concluziona că măsurile de îmbunătățire a capacității administrative depind de factori precum:

- Planificarea (și chiar realizarea) descărcării de sarcină și a pregătirii amprizei (exproprieri, descărcări arheologice, relocări rețele utilități, etc.) pentru noile proiecte, anterior implementării construcției, pentru a reduce întârzierile masive în implementare.
- Armonizarea intervențiilor între nivelurile transfrontalier – național – regional – urban / metropolitan, în special cu scopul de a preveni conflictele între obiectivele și rezultatele proiectelor de la diverse niveluri (de exemplu proiecte rutiere periurbane care subminează tranziția către o mobilitate urbană durabilă), dar și cu scopul de a maximiza sinergia funcțională între diversele subsisteme de transport.
- Implicarea activă a administrațiilor locale în calitate de (co)beneficiari ai proiectelor de interes local, având în vedere limitările de capacitate ale beneficiarilor naționali (ex. la ora actuală există multiple șantiere abandonate de centuri / variante ocolitoare în România), dar și ca factori implicați în sculptarea granițelor proiectelor și a soluțiilor / opțiunilor aferente, având în vedere buna înțelegere a acestora a particularităților de interes local sau regional.
- Întreținerea adecvată a managementului bunurilor capitale realizate prin proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană (pentru prevenirea degradării premature a acestora ca urmare a neefectuării întreținerii / reînnoirii corespunzătoare).
- Revizuirea și flexibilizarea principiilor și standardelor de proiectare, precum și a celor funcționale asociate, în vederea reducerii costurilor de investiție aferente proiecte, și a adaptării standardelor la realitățile tehnologice actuale.

Rezolvarea acestor probleme necesită asumare politică, îmbunătățirea legislației și cooperare interinstituțională, precum și un mediu în care investițiile în infrastructura de transport pot continua la un nivel ridicat. Faptul că acest Plan este construit pe experiența căpătată în ultimii 15 ani în implementarea investițiilor în sectorul de transport și ca acesta se bazează pe MPGT și pe analize tehnice obiective, agreeate cu experții BEI, asigură premisele ca acest Plan să fie politic acceptat pentru următorii 10 ani.
